



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

## **PROGRAMA DE GESTIÓN**

### **PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL PROYECCIONES ENE 2015 - JUL 2016 Y A DIC 2018**

### **INDICADORES DE DESEMPEÑO**

## RED VIAL NACIONAL

### KILÓMETROS

F20150130

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A			
	JUL 2011	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
<b>Pavimentado</b>	12,358	17,411	18,901	20,235	21,915	22,691
Asfaltado	11,951	13,763	14,013	14,445	14,780	14,955
Solución básica	407	3,648	4,888	5,790	7,135	7,736
<b>No Pavimentado</b>	10,714	8,377	6,994	5,692	4,071	3,366
<b>RVN Existente</b>	23,072	25,789	25,895	25,927	25,986	26,058
<b>RVN Total</b>	25,530	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550
<b>RVN Pavimentado</b>	53.6%	67.5%	73.0%	78.0%	84.3%	87.1%

PERIODOS	AGO 2011 - DIC 2014	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
<b>Pavimentado</b>	5,054	1,490	1,334	1,680	776
Asfaltado	1,812	250	432	335	176
Solución básica	3,241	1,240	902	1,345	601
<b>Rehabilitación</b>	592	77	633	349	242
<b>Rehabilitación y Mejoramiento</b>	2,404	327	1,065	684	417

Fuente: PVN-OPEI. Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF



Nota: La Rehabilitación y Mejoramiento es de intervenciones con solución definitiva (Asfaltado)

## LONGITUDINAL DE LA SIERRA

### KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A			
	JUL 2011	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
<b>Pavimentado</b>	1,999	2,946	3,238	3,318	3,358	3,424
Asfaltado	1,854	2,359	2,359	2,438	2,479	2,544
Solución básica	145	587	879	879	879	879
<b>No Pavimentado</b>	1,306	558	265	186	145	80
<b>LS Existente</b>	3,305	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
<b>LS Total</b>	3,463	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
<b>Pavimentado</b>	60.5%	84.1%	92.4%	94.7%	95.9%	97.7%

PERIODOS	AGO 2011 - DIC 2014	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
<b>Pavimentado</b>	-	947	292	80	41
Asfaltado	505		80	41	66
Solución básica	442	292			
<b>Rehabilitación</b>	21				
<b>Rehabilitación y Mejoramiento</b>	526				

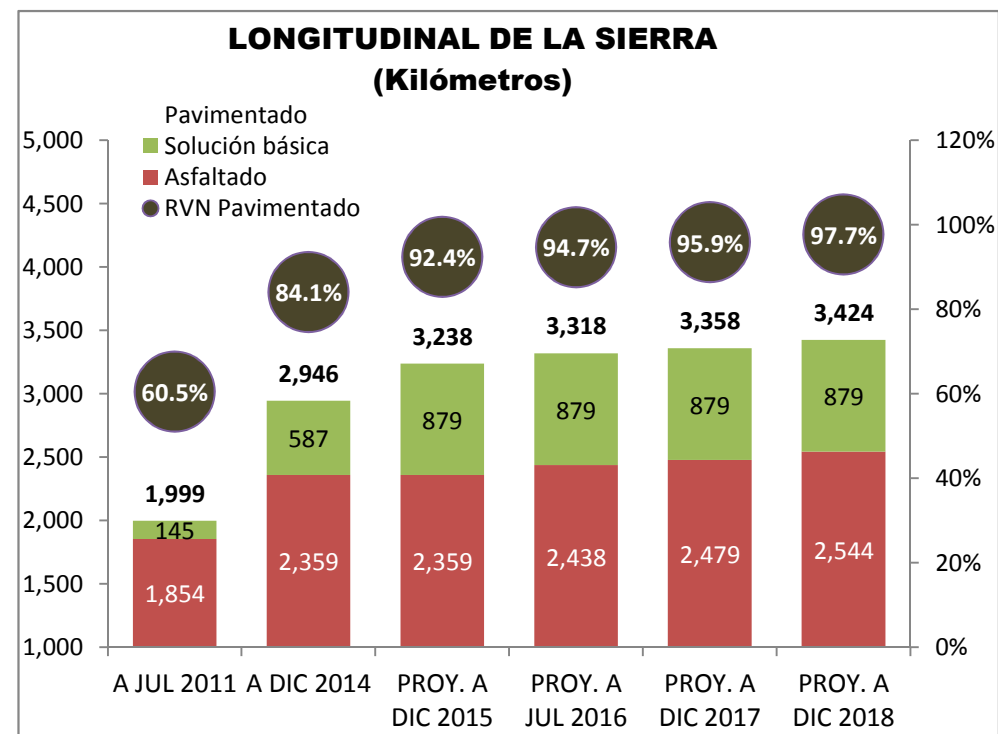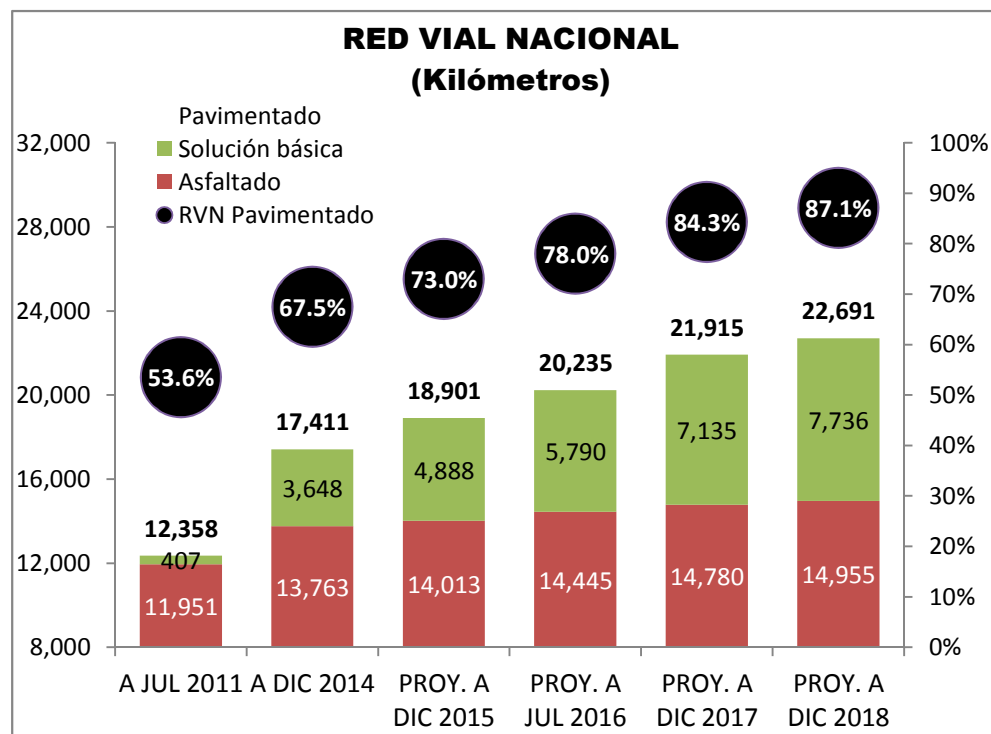

## Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A DICIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS <sup>1</sup>	FIN CONTRAC TUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A DIC 2014	C. OBRA Mil. S/.
			<b>2002210 Rehabilitación y mejoram. carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis</b>														
1		0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14		52.14				ene-13	may-15	sep-14	126-2012-MTC/20	84%	189.32
			<b>2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco</b>														
2		0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45		94.45				abr-12	oct-16	jul-15	081-2011-MTC/20	57%	513.38
			<b>2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar</b>														
3		0769	Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	28.33	18.83		18.83				abr-13	feb-15	sep-14	003-2013-MTC/20	89%	81.94
			<b>2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish</b>														
4		0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - 102 000	3271	79.47	24.47		24.47				may-12	dic-15	ene-15	032-2012-MTC/20	74%	359.63
5	0071	0923	Tr. Canta - Huallay	3271	96.11	82.89				82.89		ago-14	ago-17	jul-12	057-2014-MTC/20	0%	453.15
			<b>2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca</b>														
6		0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.86	51.67	51.67		51.67			may-12	mar-16	dic-15	021-2012-MTC/20	57%	274.95
			<b>2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna</b>														
7		0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.46	94.50		94.50				may-13	nov-15	nov-15	048-2013-MTC/20	84%	574.28
			<b>2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa</b>														
8		0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85		44.85				may-13	mar-16	ago-15	051-2013-MTC/20	62%	305.01
			<b>2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin</b>														
9		0671	Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99.28	54.40		54.40				abr-13	may-16	oct-15	036-2013-MTC/20	55%	539.27
			<b>2089761 Rehabilitación y mejoram. carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta</b>														
10	0161	0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.54	27.88	27.88		27.88			oct-13	mar-16	oct-14	055-2013-MTC/20	54%	120.65
			<b>2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo</b>														
11		1048	Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	116092	67.73	67.63		67.63				abr-13	ago-16	may-15	046-2013-MTC/20	43%	212.12
			<b>2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042 ) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún</b>														
12	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96		3.96				oct-14	nov-15	ago-13	138-2010-MTC/20	1%	9.75
			<b>2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao</b>														
13	1883	1746	Tr. Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)	48115	2.10							ene-15	may-16	nov-14	043-2014-MTC/20	2%	779.80
			<b>2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana</b>														
14		0503	Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37.44							ene-14	mar-16	jul-15	126-2013-MTC/20	68%	116.93
			<b>2043324 Culminación construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100</b>														
15		0655	Tr. Pimentel - Chiclayo (autopista)	10699	2.97							ene-14	abr-15	jul-14	141-2013-MTC/20	79%	17.14
			<b>2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha</b>														
16	0518	1001	Tr. San Marcos - Cajabamba	11432	58.80							sep-13	feb-16	ago-15	075-2013-MTC/20	64%	284.66
			<b>2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo</b>														
17		0100	Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo (2da Calzada)	128445	10.05							abr-14	feb-16	jun-15	008-2013-MTC/20	25%	127.12
			<b>2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas</b>														
18	1050	1591	Tr. Imperial - Pampas	73078	36.85	37.49		37.49				nov-14	jul-16	dic-13		3%	218.78
			<b>2188747 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. II: Km. 557+000 al 886+600</b>														
19		1714	Tr. II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600) **	279073	329.60							may-14	mar-16	jun-15	Acuerdo Arbitral	50%	248.31
			<b>2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa</b>														
20	0081	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytia (sectores dañados)	2434	7.94	0.52		0.52				ago-14	oct-15	ene-16	063-2014-MTC/20	5%	169.10
			<b>2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito</b>														
21	0193	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	108035	14.34	14.34		14.34				oct-14	oct-15	abr-14	094-2014-MTC/20	7%	19.85
			<b>OBRAS VIALES CONTRATADAS</b>		<b>1,271</b>	<b>670</b>	<b>80</b>	<b>209</b>	<b>378</b>	<b>83</b>	<b>-</b>						<b>5,615</b>

1/ Plazos estimados por regresión lineal en función de tiempos históricos de obras terminadas al 2012 - OPEI. (\*) Referencia de Convenio (\*\*) Rehabilitación en RVN Concesionada

a/ Los 57.4 Km de la ruta PE-3S, que no será asfaltada, será reclasificada por la variante Dv. Kishuara - Huancarama - Alfapata de la ruta PE-3SE que será asfaltada por ser de mayor transitabilidad.

F20150130

## ANEXO 2: OBRAS DE ASFALTADO EN CONTRATOS DE CONCESIÓN A DICIEMBRE 2014

Nº	PFIS CON	CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FECHA INICIO	FIN OBRA PFIS <sup>2</sup>	CONTRATISTA
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	41.11	41.11		41.11				ene-15	dic-15	COVIPERU
<b>OBRAS VIALES CONCESIONADAS</b>			<b>41</b>	<b>41</b>		<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

2/ Estimado por PFísica

<b>OBRAS VIALES CONTRATADAS</b>			<b>1,312</b>	<b>711</b>	<b>80</b>	<b>250</b>	<b>378</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>Km</b>		<b>5,615</b>
---------------------------------	--	--	--------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	----------	-----------	--	--------------

## Anexo 3.1: EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO A DICIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS <sup>1</sup>	FIN OBRA PFIS <sup>2</sup>	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A DIC 2014	VR. OBRA Mill. S/
			<b>2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro</b>														
3	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.00	1.75			1.75			nov-14	jul-16	jul-14	072-2011-MTC/20	100%	231.06
4	0516	0996	Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro	3373	55.00							ene-15	jul-17	abr-14	065-2011-MTC/20	100%	225.50
5	0517	1562	Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro	3373	62.90							ene-15	ago-17	feb-15	068-2011-MTC/20	95%	257.89
			<b>2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo</b>														
6	1042	1559	Tr. Andahuaylas - Huancabamba	5080	20.00	20.00			20.00			oct-14	jun-16	jun-14	001-2013-MTC/20	100%	50.80
			<b>2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp, PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp, PE-5N La Calzada</b>														
7	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.40	26.85			26.85			mar-15	nov-16	mar-14	066-2010-MTC/20	100%	123.30
			<b>2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna</b>														
8	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón	3272	51.30							ago-14	jul-16	feb-14	GRAQP-GRMOQ-SP*	100%	450.85
			<b>2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín</b>														
9	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churín	34470	5.14	5.10			5.10			mar-15	jul-16	ene-15	196-2008-MTC/01*	95%	21.54
			<b>2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay</b>														
11	1116	1556	Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55	73004	1.55							abr-15	sep-16	dic-13	013-2012-MTC/20*	100%	10.08
12	1117	1557	Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay	73004	75.45							nov-14	jul-17	dic-13	017-2012-MTC/20*	100%	377.25
			<b>2057739 Rehabilitación y mejoramiento carretera Ica - Los Molinos - Tambillos</b>														
13	0910	1552	Tr. Molinos - Tambillo	6804	13.80							abr-15	dic-16	mar-15	045-2013-MTC/20	80%	55.20
			<b>2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani</b>														
14	0155	0963	Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.60	40.60			40.60		sep-15	nov-17	abr-15	025-2012-MTC/20	90%	202.57
			<b>2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp. Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta Pe-5N La Calzada</b>														
15	0511	0432	Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro	3876	86.00	69.33				69.33		jun-15	oct-17	abr-15	180-2010-MTC/20	70%	180.60
			<b>2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote</b>														
16	0016	0937	Vía Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34.66	34.66				34.66		jul-15	feb-17	ene-12	209-2008-MTC/20	100%	121.31
			<b>2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay</b>														
17	1344	1568	Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	108630	9.50							feb-16	oct-17	oct-15	013-2014-MTC/20	40%	38.38
			<b>2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía</b>														
18	1340	1592	Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía	8669	36.30	23.67				23.67		nov-15	jul-17	jul-15	001-2014-MTC/20	50%	181.50
			<b>2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri</b>														
19	1578	1579	Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri	142861	73.90	73.39				73.39		jul-15	nov-17	oct-14	027-2012-MTC/20	100%	369.50
			<b>2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez</b>														
20	1128	1566	Tr. Villa Rica-Pto. Bermudez	3368	110.88	73.18					73.18	feb-16	dic-18	mar-16	028-2014-MTC/20	45%	554.40
			<b>2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo</b>														
21	1596	1597	Tr. Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)	93142	75.50	36.71					36.71	feb-16	jun-18	jun-15	004-2008-MTC/20*	60%	377.50
			<b>2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho</b>														
22	0519	1563	Tr. Cajabamba - Sausacocho	11432	39.20							ene-15	abr-17	feb-15	067-2011-MTC/20	80%	196.00
			<b>2173121 Longitudinal Sierra Norte, Tr. Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple</b>														
23	1059	1604	Tr. Chota - Cutervo - Chiple	103730	91.40							sep-15	feb-18	oct-13	025-2010-MTC/20*	100%	548.40
<b>O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO</b>					<b>983</b>	<b>405</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>242</b>	<b>110</b>						<b>6,565</b>

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio Definitivo. 2/ Plazo estimado por OPEI. (\*) Convenio

### Anexo 3.2: EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR A DICIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS <sup>1/</sup>	FIN OBRA PFIS <sup>2/</sup>	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A DIC 2014	VR OBRA Mill. S/
			<b>2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa</b>														
25	0090	1547	Tr. Aguaytia - San Alejandro(Sectores Críticos)	2434	10.00							sep-16	may-18	may-16	Por contratar		35.00
			<b>2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani</b>														
26	0470	0241	Tr. Colpahuayco - Langui	3876	10.00	10.00				10.00		abr-16	dic-17	dic-15	Por contratar		21.00
			<b>2158699 Rehabilitación de la carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - Dv. Pampas</b>														
27	1072	1567	Tr. II Pucara - Pazos y Tr. III Pazos - Dv. Pampas	198686	26.90							sep-16	sep-18	jun-16	Por contratar		134.50
			<b>2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz</b>														
28	1602	1603	Tr. Huallanca - Caraz	101490	37.00							ago-16	ago-18	abr-16	Por contratar		185.00
			<b>2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca</b>														
29	1122	1595	Autopista Juliaca - Puno	92806	48.45							abr-16	dic-17	dic-15	Por contratar		242.25
			<b>2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca</b>														
33	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64				65.64	ago-16	dic-18	abr-16	Por contratar		295.38
			<b>O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR</b>		<b>198</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>66</b>						<b>913</b>

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio de Factibilidad. 2/ Plazo estimado por OPEI. (\*) Convenio (\*\*) Contrato resuelto, se convocará otra vez

<b>OBRAS VIALES POR CONTRATAR</b>	<b>2,493</b>	<b>1,192</b>	<b>186</b>	<b>250</b>	<b>432</b>	<b>335</b>	<b>176</b>	<b>Km</b>		<b>7,478</b>
<b>TOTAL OBRAS VIALES</b>	<b>2,493</b>	<b>1,192</b>	<b>186</b>	<b>250</b>	<b>432</b>	<b>335</b>	<b>176</b>	<b>Km</b>		<b>11,102</b>
<b>TOTAL REHABILITACIÓN</b>	<b>1,301</b>			<b>77</b>	<b>633</b>	<b>349</b>	<b>242</b>	<b>Km</b>		
<b>TOTAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ASFALTADO</b>	<b>2,493</b>			<b>327</b>	<b>1,065</b>	<b>684</b>	<b>417</b>	<b>Km</b>		

#### NOTA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA - LS

Longitudinal de la Sierra a pavimentar después de Jul 2016

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS (Km)	INICIO OBRA	FIN OBRA <sup>1/</sup>
1	0904	0659	Tr. Chuquicara – Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64	jun-17	dic-18
2	0969	1593	Tr. Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata	86897	81.55	79.55	79.55	dic-16	ago-19
3	0155	0963	Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.60	40.60	sep-15	nov-17
			<b>TOTAL</b>		<b>203.39</b>	<b>185.78</b>	<b>185.78</b>		

**Anexo 4: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADAS EN CNS A DICIEMBRE 2014**

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1336	<b>034-2012-MTC/20</b> Puente Huarochiri - Sihuas	536	108.504		108.50					may-12
				108.504		108.50				2015	
3	0964	<b>049-2013-MTC/20</b> Bambas - Dv. Sihuas	408	76.605	18.13	76.61					abr-13
		Pallasca - Mollepata		58.479		58.48				2015	
				18.126	18.13	18.13				2015	
4	0318	<b>057-2010-MTC/20</b> Pizana - Perlamayo	458	14.389		14.39					abr-10
				14.389		14.39				2015	
5	1379	<b>066-2013-MTC/20</b> Huancavelica - Lircay	343	69.825		69.83					jul-13
				69.825		69.83				2015	
6	0312	<b>068-2010-MTC/20</b> Santa Ines-Pampano	343	22.292		22.29					mar-10
				22.292		22.29				2015	
7	1358	<b>069-2012-MTC/20</b> Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor	610	450.927	274.24	450.93					ago-12
		Huancabamba - Canchaque		71.520	71.52	71.52				2015	
		Huancabamba - Emp. PE-3N (Socchobamba)		67.281		67.28				2015	
		Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto		186.356	186.36	186.36				2015	
		San Jose de Alto - Emp. PE 5N (Ambato)		110.517	16.36	110.52				2015	
				15.253		15.25				2015	
8	0853	<b>070-2012-MTC/20</b> Abra Tocto - Huancapi	372	138.778		138.78					ago-12
		Huacana - Puquio		15.809		15.81				2015	
				122.969		122.97				2015	
9	1380	<b>070-2013-MTC/20</b> Puente Wawico - Seasmi	378	236.577		236.58					jul-13
		Seasmi - Saramiriza		65.325		65.33				2015	
		Puente Wawico - Santa María de Nieva		72.595		72.60				2015	
		Santa María de Nieva - Seasmi		84.657		84.66				2015	
				14.000		14.00				2015	
10	0854	<b>071-2012-MTC/20</b> EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa	526	94.983		94.98					ago-12
		Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa		0.263		0.26				2015	
				94.720		94.72				2015	
11	0320	<b>094-2010-MTC/20</b> Km 120-Punta de Carretera	526	26.817		26.82					abr-10
		Molinopampa-Rodriguez de Mendoza		15.262		15.26				2015	
		Rodriguez de Mendoza - Km 120		8.354		8.35				2015	
				3.201		3.20				2015	
12	1378	<b>143-2014-MTC/20</b> Emp PE-15 (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara	321	287.99		287.99					
				287.99		287.99				2016	

<b>SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADA</b>			<b>4,821</b>	<b>1,528</b>	<b>292</b>	<b>1,240</b>	<b>288</b>	-	-		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	---	---	--	--

**Anexo 5.1: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN AVANZADOS A DICIEMBRE 2014**

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A DIC 2014
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	332	291.266			291.27				120-2012-MTC/20	dic-12	95%
			Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panao û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Emp. PE-18B -Rlo Codo-Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		291.266			291.27			2016			
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26.123			26.12				014-2013-MTC/20	ene-13	95%
			Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26.123			26.12			2016			
3	1366	1617	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136.564			136.56				022-2013-MTC/20	ene-13	75%
			Capazo- Mazocruz		54.619			54.62			2016			
			Tarata - Capazo		81.945			81.95			2016			
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160.286			160.29				024-2013-MTC/20	feb-13	75%
			Andahuaylas (Emp. PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp. PE-30A)		160.286			160.29			2016			

			<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS</b>	<b>1,272</b>	<b>614</b>		-	<b>614</b>	-	-				
--	--	--	---	--------------	------------	--	---	------------	---	---	--	--	--	--

F20150130

			<b>SOLUCIÓN BÁSICA A JUL 2016 POR CONTRATAR</b>	<b>1,593</b>	<b>902</b>		-	<b>902</b>	-	-	<b>Km</b>			
--	--	--	---	--------------	------------	--	---	------------	---	---	-----------	--	--	--

			<b>TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA A JUL 2016</b>	<b>6,093</b>	<b>2,142</b>	<b>292</b>	<b>1,240</b>	<b>902</b>	-	-	<b>Km</b>			
--	--	--	---	--------------	--------------	------------	--------------	------------	---	---	-----------	--	--	--

**Anexo 5.2: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN INICIADOS A DICIEMBRE 2014**

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A DIC 2014
5	1363	1619	Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	250	215.28							078-2013-MTC/20	ago-13	72%
			Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuahuacho		215.28				215.28		2017			
6	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188.63							096-2013-MTC/20	oct-13	75%
			Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188.63				188.63		2017			
7	1304	1644	Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Palla	597	562.78				562.78			107-2013-MTC/20	oct-13	75%
			Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232.86				232.86		2017			
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		329.92				329.92		2017			
8	1663	1665	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	61.97							138-2013-MTC/20	dic-13	75%
			DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. Carretera		61.97				61.97		2017			
9	1648	1650	Emp. AR-10S (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)	410	0.00							005-2014-MTC/20	ene-14	35%
			Emp. PE-34A -Vizchane-Chivay-Cabanaconde-Huambo-Ayo-Andagua-Dv. Aplao								2018			
10	1704	1703	Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	26.36							029-2014-MTC/20	feb-14	70%
			Pausa - Maran		26.36				26.36		2017			
11	1654	0315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia y Dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149.48				149.48			036-2014-MTC/20	mar-14	35%
			Dv. Huancane - Putina		1.42				1.42		2017			
			Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61.50				61.50		2017			
			Quiquirá - San Ignacio		86.56				86.56		2017			
12	1657	0313	Emp PE-3S - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	140.54							037-2014-MTC/20	mar-14	58%
			Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140.54				140.54		2017			
13	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon - Emp.PE-18A (Tingo María)	536	406.29							055-2014-MTC/20	jun-14	23%
			Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		406.29					411.41	2018			
14	1798	2060	Emp. PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande	395	0.00							065-2014-MTC/20	jul-14	23%
			Emp. PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande								2018			
15	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18	214	189.52							090-2014-MTC/20	sep-14	3%
			Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189.52					189.52	2018			

			<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS INICIADOS</b>	<b>4,093</b>	<b>1,941</b>		-	-	<b>1,345</b>	<b>601</b>				
--	--	--	---	--------------	--------------	--	---	---	--------------	------------	--	--	--	--

			<b>TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA AL 2018</b>	<b>10,186</b>	<b>4,083</b>	<b>292</b>	<b>1,240</b>	<b>902</b>	<b>1,345</b>	<b>601</b>	<b>Km</b>			
--	--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	--	--	--
