



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROVÍAS NACIONALES

Agosto de 2013
OPEI



VISIÓN Y MISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VISIÓN



País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

MISIÓN



Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011-2016

Acciones Estratégicas Período 2011-2016:

I

Asfaltar el
85% de la
Red Vial
Nacional

**Proyecto
Principal:**
Pavimentado
del 100% de
la
Longitudinal
de la Sierra

II

Construcción
de la Red
Metro de
Lima

**Proyecto
Principal:**
Construcción de
la Línea 2 Ate –
Callao –
Aeropuerto
Jorge Chávez

III

Modernización
de Puentes de
la RVN.


**Proyecto
Principal:**
Construcción y
rehabilitación
de 1,000
puentes

IV

Banda
Ancha
capitales de
provincia


**Proyecto
Principal:**
Red Dorsal
de Fibra
Óptica

Objetivos Estratégicos Período 2011-2016:

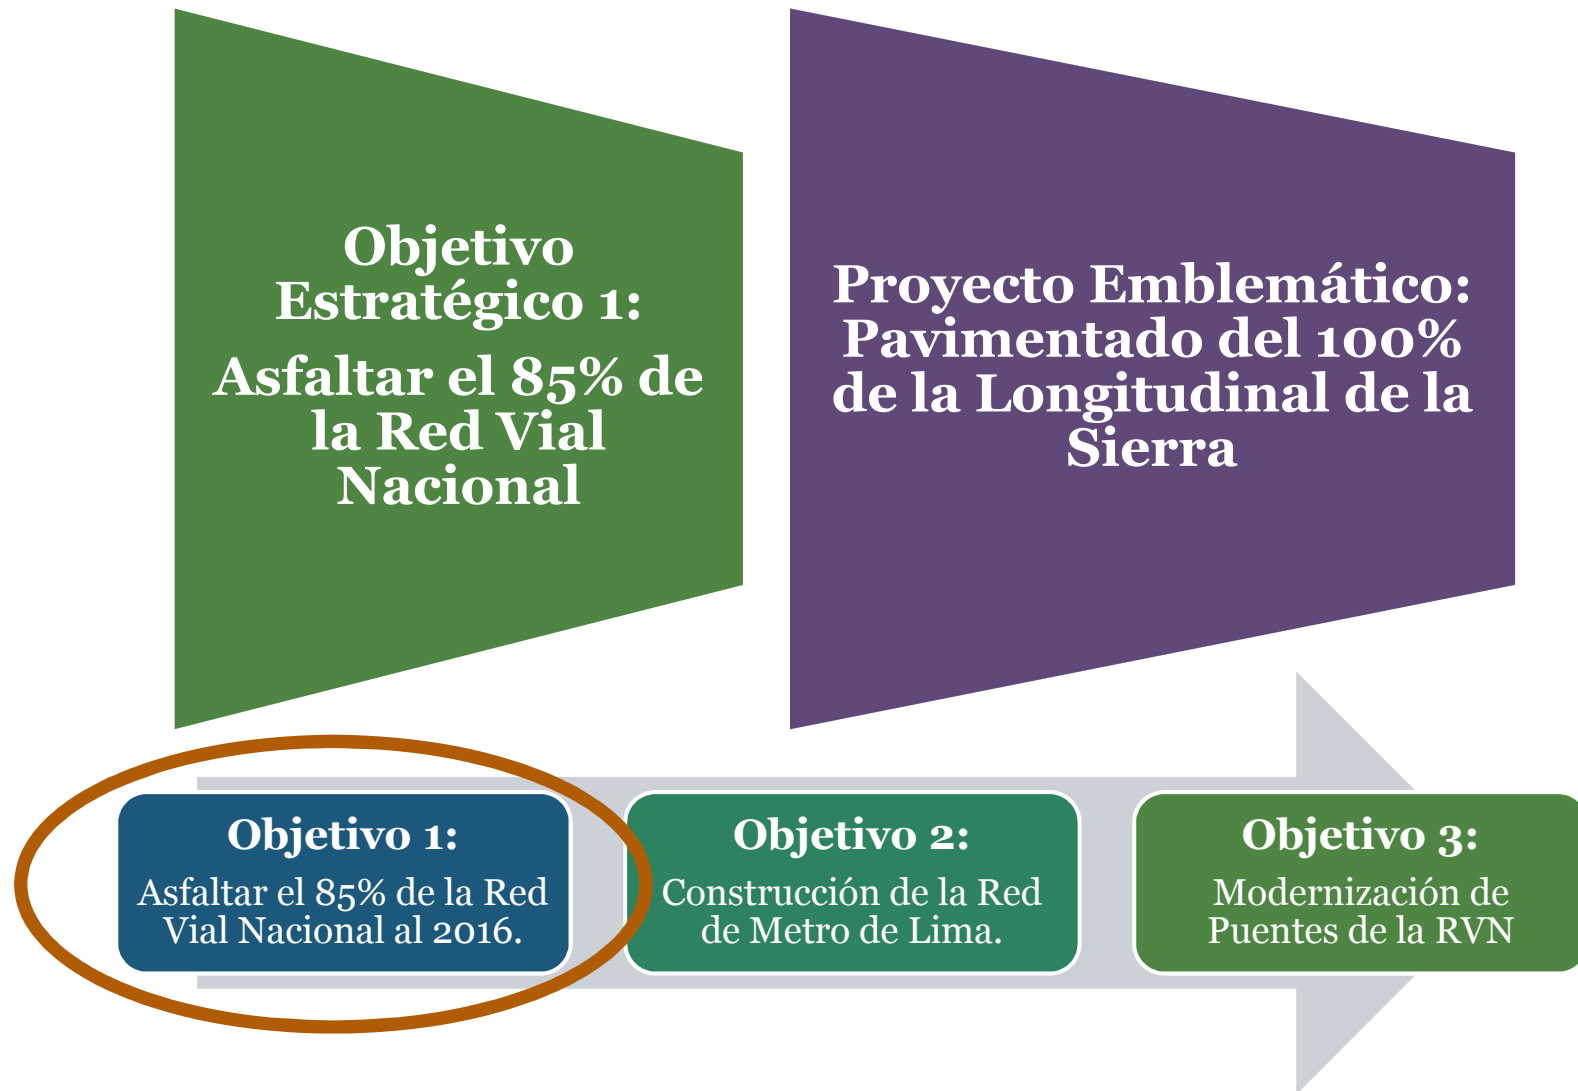


**INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL
EJECUTADO AGO 2011 – JUL 2013 Y
PROGRAMADO AGO 2013 – JUL 2016**


RED VIAL NACIONAL EXISTENTE (Km)

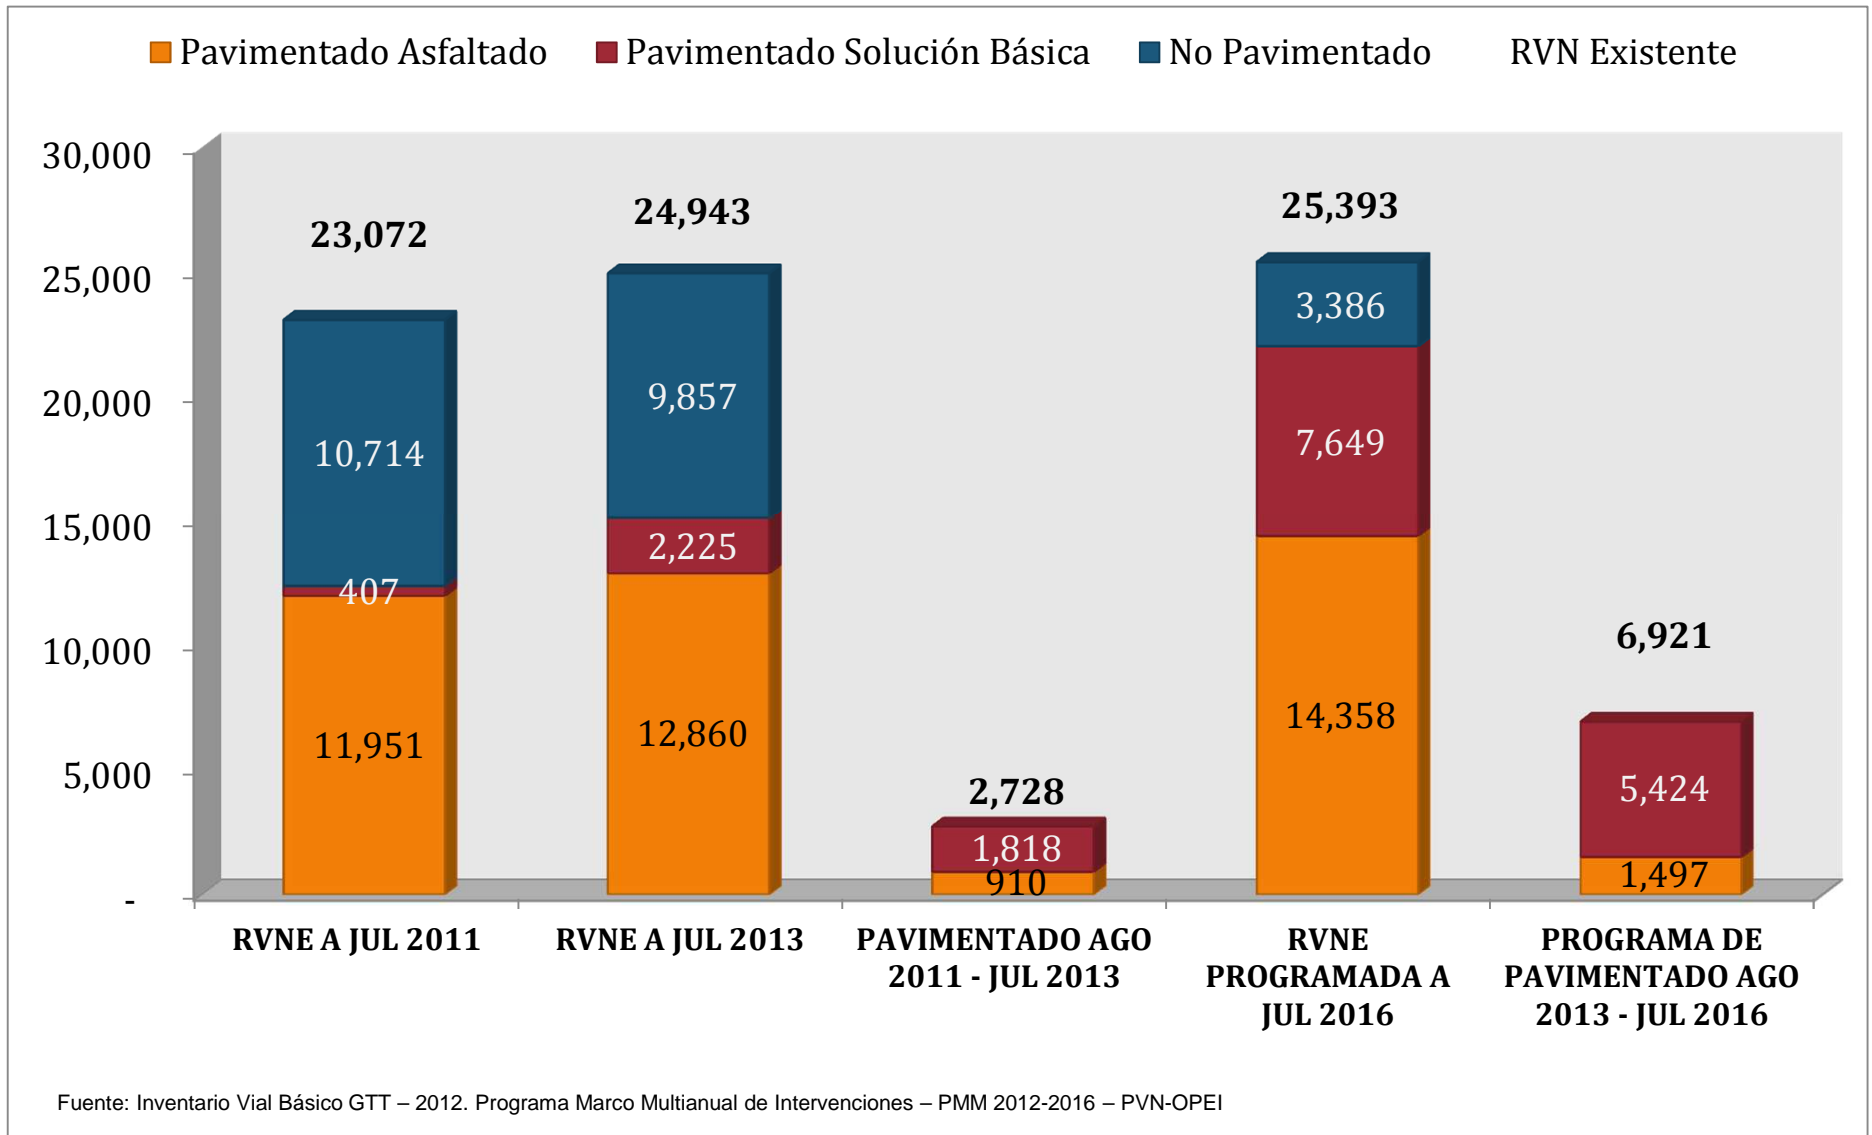

RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (Km)

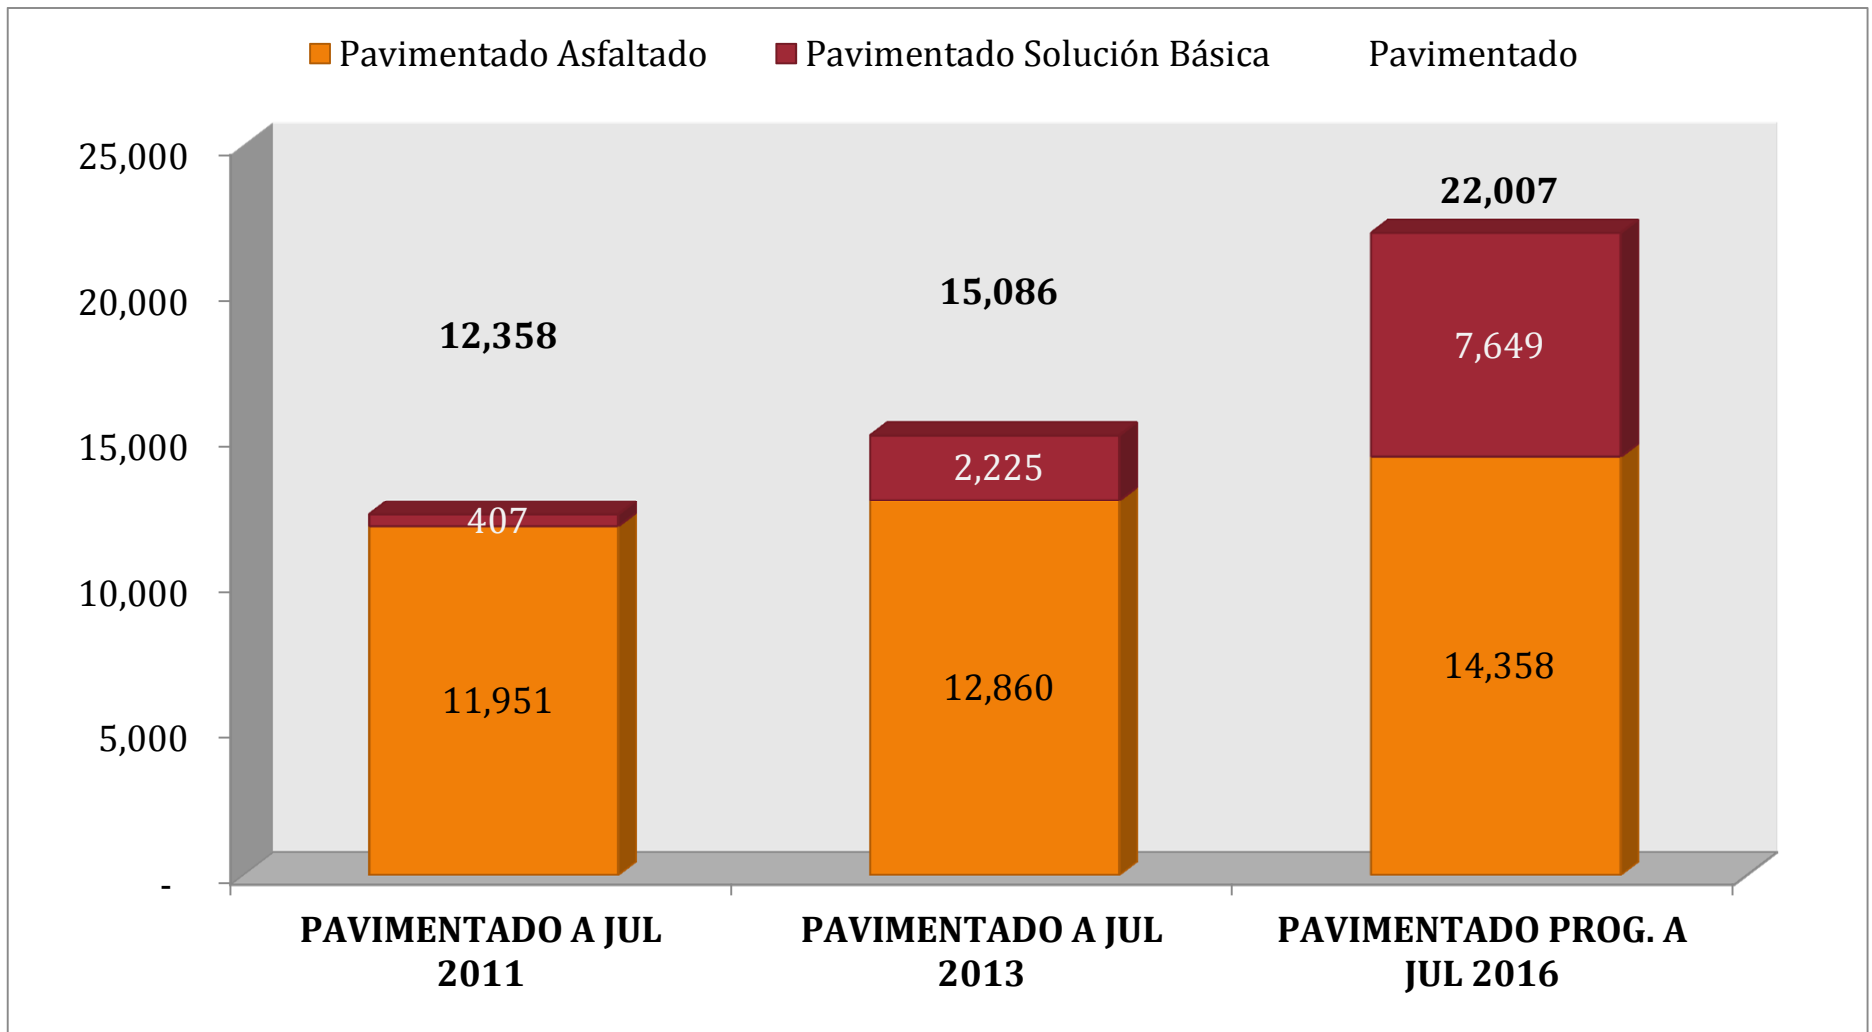

RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA (%)

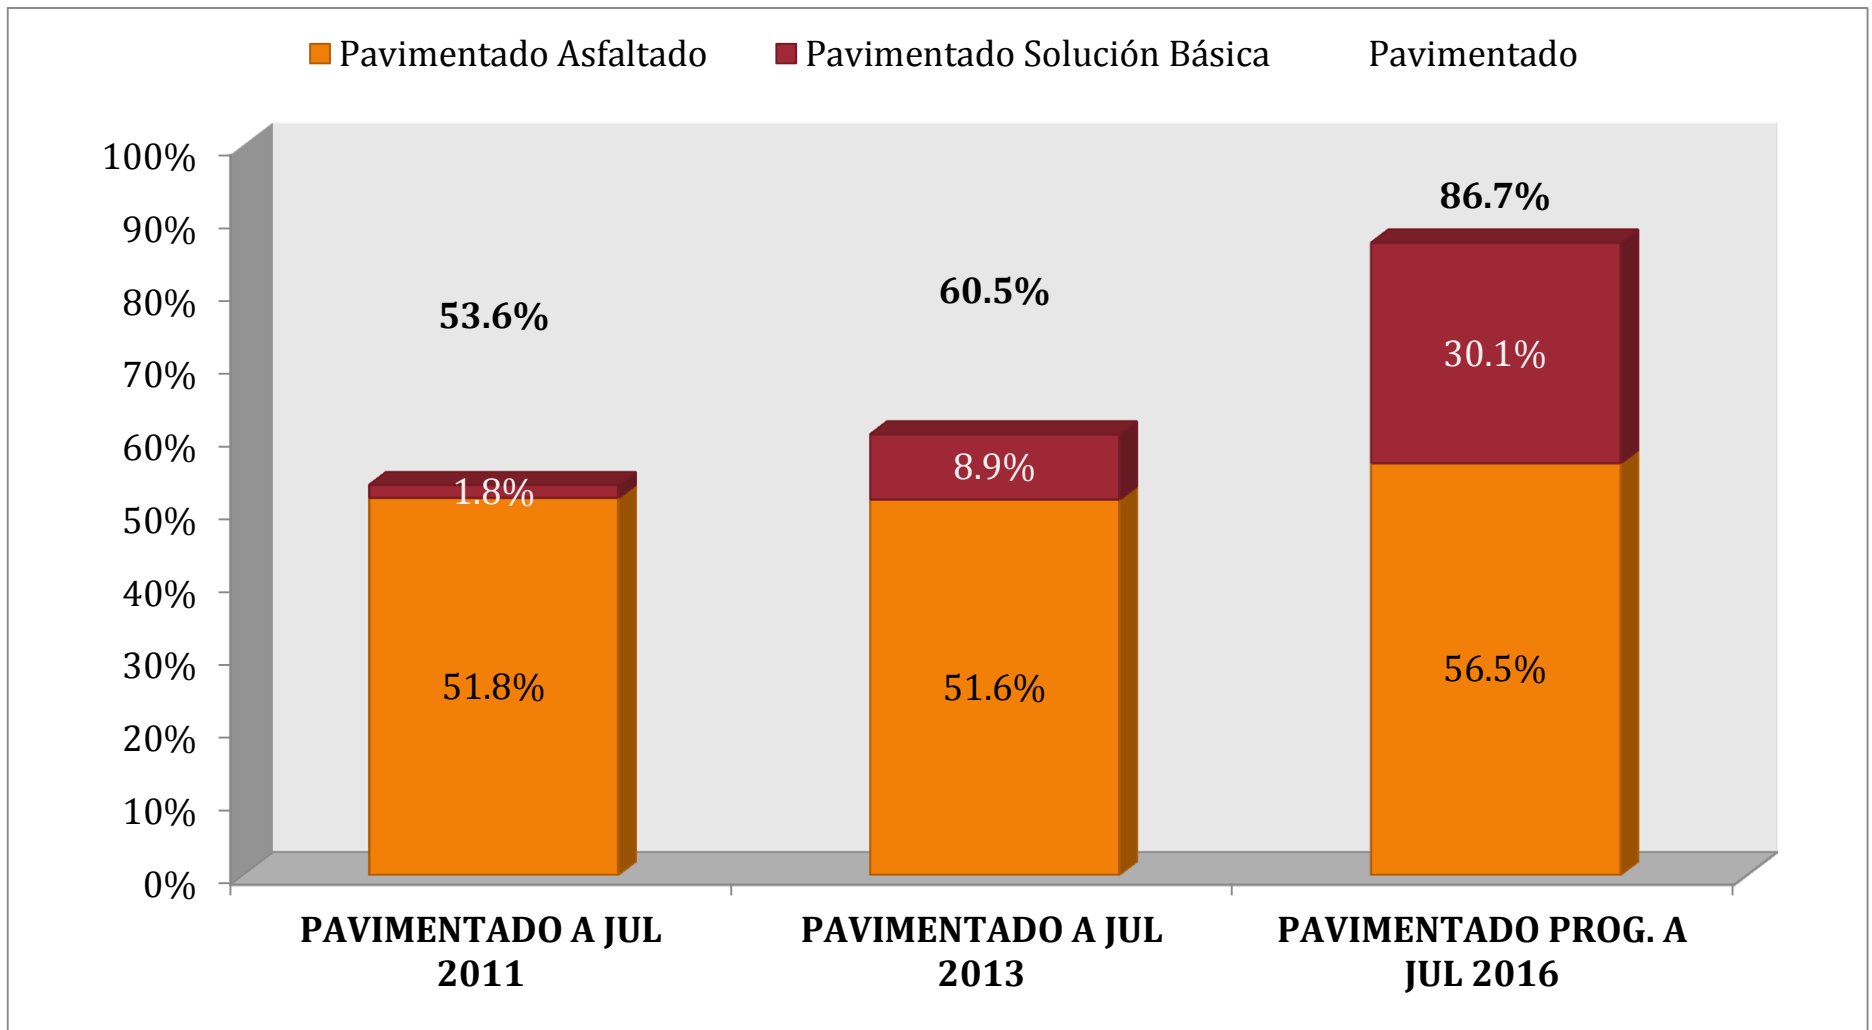


PROGRAMA DE PAVIMENTADO
AGO 2013 – JUL 2016
(En 1.095 días)

PROGRAMA DE PAVIMENTADO AGO 2013 – JUL 2016

- El plazo para cumplir la Meta de Gobierno a Jul 2016, es de 1095 días calendario y se debe **pavimentar 6.921 Km de carreteras**.
- Estas intervenciones para pavimentar corresponden a Obras de Asfaltado (22%) y obras de Solución Básica (78%).
- El 57% de los kilómetros de Obras para pavimentar están contratadas, en tanto que el 43% están para contratar.
- El principal **riesgo de incumplimiento alcanza el 37% de la Meta de Gobierno**, y radica en los Perfiles de Mejoramiento por Niveles de Servicio en ejecución (9%) pero sobre todo en los Perfiles que aún están programados contratarse (28%); puesto que en estos se requiere obtener la viabilidad (OPI-MTC) y luego contratar las obras a través de CCNS.
- Por lo tanto, dado el transcurso del tiempo y la proximidad de la culminación del Gobierno, es necesario poner atención y concentración de toda la Unidad Ejecutora Provías Nacional sobre estas intervenciones a ejecutarse, para cumplir la Metas de Pavimentar el 85% de la RVN y el 100% de la Longitudinal de la Sierra.

PROGRAMA DE PAVIMENTADO AGO 2013 – JUL 2016

SITUACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS A JUL 2013 (6.921 Km)

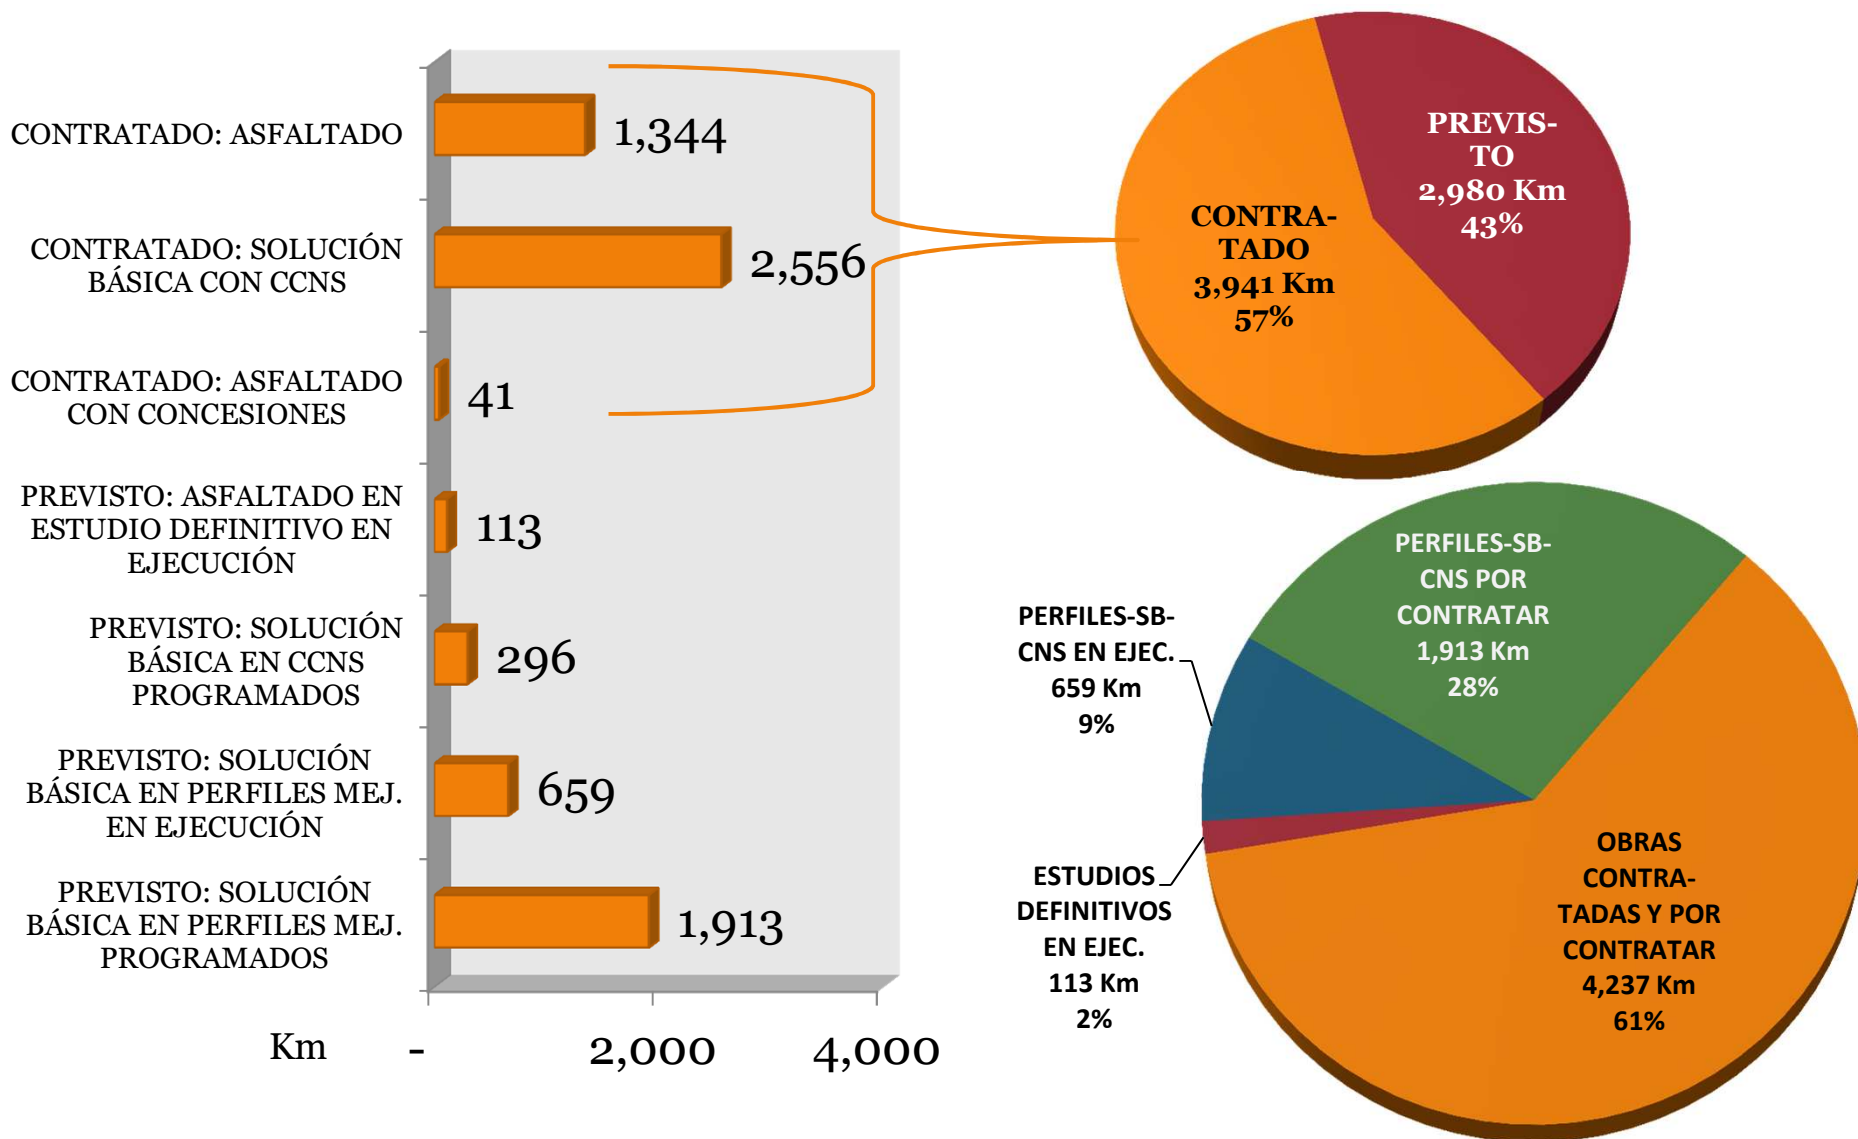

PAVIMENTADO ASFALTADO

Rehabilitación y Mejoramiento

OBRAS ASFALTADO CONTRATADO A JUL 2013 (1/2)

N	PFIS	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRATO / CONVENIO	A JUL 2013
		2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis							
1	0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14	ene/13	jun/15	126-2012-MTC/20	13%
2	0110	Tr. San Ignacio - Pte. Integracion	8880	47.09	41.63	mar/12	nov/13	082-2011-MTC/20	84%
		2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache							
3	0221	Tr. Juanjui - Campanilla	2794	43.40	42.54	abr/13	jul/14	090-2012-MTC/20	15%
4	0217	Tr. Pizana - Tocache	2794	37.70	37.37	jun/12	ene/14	036-2012-MTC/20	88%
		2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba							
5	0230	Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba	6655	55.44	54.94	abr/10	sep/13	074-2010-MTC/20	90%
		2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco							
6	0233	Tr. Dv. Otuzco - Callacuyan	3291	70.90	54.57	nov/10	feb/14	157-2010-MTC/20	66%
		2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco							
7	0244	Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500	16256	50.91	51.43	abr/11	jul/13	182-2010-MTC/20	97%
8	0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45	abr/12	may/15	081-2011-MTC/20	50%
		2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas							
9	0464	Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000	4653	25.98	26.00	ene/13	may/14	097-2012-MTC/20	33%
10	0446	Tr. Km. 52+000 - Celendin	4653	42.78	44.28	dic/11	dic/13	070-2011-MTC/20	74%
		2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocho - Puente Pallar							
11	0769	Tr. Huamachuco - Sacsacocho - Puente Pallar	15956	28.33	18.83	abr/13	feb/15	003-2013-MTC/20	7%
		2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica							
12	0774	Tr. Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica	2941	39.40	39.44	abr/11	sep/13	189-2010-MTC/20	96%
		2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay							
13	0811	Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800	13558	48.80	48.80	abr/12	abr/14	092-2011-MTC/20	91%
14	0837	Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000	13558	55.20	54.18	jul/12	feb/15	049-2012-MTC/20	61%
15	0885	Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto	13558	76.45	76.45	ene/13	mar/16	118-2012-MTC/20	27%
		2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey							
16	0907	Tr. Santiago de Chuco - Shorey	52842	41.53	37.66	feb/11	Sep/13	111-2008-MTC/20	90%

OBRAS ASFALTADO CONTRATADO A JUL 2013 (2/2)

N	PFIS	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRATO / CONVENIO	A JUL 2013
		2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish							
17	0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000	3271	79.47	29.07	may/12	ene/15	032-2012-MTC/20	39%
		2058560 Construcción de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote							
18	0937	Tr. Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34.66	34.66	feb/14	sep/15	[LP N° 004-2012]	0%
		2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca							
19	0947	Tr. Llama - Cochabamba	10447	60.46	60.46	dic/10	nov/13	134-2010-MTC/20	91%
20	0146	Tr. Cochabamba - Chota	10447	31.86	31.04	dic/11	may/14	080-2011-MTC/20	63%
21	0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.89	51.67	may/12	may/15	021-2012-MTC/20	12%
		2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna							
22	0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.46	94.50	may/13	ago/16	048-2013-MTC/20	5%
		2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla							
23	0862	Tr. Mala - Calango - la Capilla	63404	25.48	21.72	ago/12	abr/14	040-2012-MTC/20	71%
		2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa							
24	0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85	may/13	feb/16	051-2013-MTC/20	1%
		2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin							
25	0671	Tr. Huaura - Sayan - Churin	34470	99.28	60.40	abr/13	abr/16	036-2013-MTC/20	1%
		2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta							
26	0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.95	27.88	oct/13	feb/15	055-2013-MTC/20	0%
		2105571 Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati							
27	0799	Tr. Sambarai - Dv. Puente Echarati*	23461	21.19	21.20	sep/10	dic/13	Convenio 009-2012-MTC/20	94%
		2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán							
28	1053	Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)	34473	42.60	23.93	mar/13	jul/14	102-2012-MTC/20	21%
		2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo							
29	1048	Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo	116092	67.73	67.63	abr/13	feb/16	046-2013-MTC/20	2%
		OBRAS VIALES CONTRATADAS		1,523	1,344				

CONTRATADO: PAVIMENTADO ASFALTADO

1.344 Km

OBRAS ASFALTADO EN ESTUDIO DEFINITIVO EN EJECUCIÓN A JUL 2013

N	PFIS	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	FIN E. DEF.	A JUL 2013	INICIO OBRA	FIN OBRA
		2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa							
1	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytía (sectores dañados)	2434	25.00	0.52	Set/13	95%	mar/14	dic/15
		2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna							
2	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón [Convenio: GR_AQP-GR_MOQ-SOUTHERN PERU]	3272	51.30	1.82	Oct/13	70%	mar/14	oct/13
		2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo							
3	1559	Tr. Andahuaylas – Huancabamba	5080	20.00	20.00	Jun/14	50%	ene/15	feb/16
		2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito							
4	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito	108035	15.30	15.30	Oct/13	80%	Abr/14	Sep/15
		2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro							
5	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.00	1.75	Oct/13	80%	Abr/14	jun/16
		2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+ 042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún							
6	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96	Oct/13	90%	Abr/14	Ago/15
		2078363 Mejoramiento Carretera Chuquicara - Pte Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval – Pallasca							
7	0963	Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.29	Oct/13	80%	jun/14	jun/16
		2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada							
8	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.40	29.27	Feb/14	40%	Sep/14	Abr/16
		OBRAS VIALES EN ESTUDIO DEFINITIVO		256	113				

PREVISTO: ASFALTADO EN ESTUDIO DEFINITIVO

113 Km

N	PFIS	CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRATISTA	A JUL 2013
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	40.88	40.88		Jul/15	COVIPERU	

PROGRAMA PAVIMENTADO ASFALTADO

1.497 Km

PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA

Contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio

OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA CON CCNS CONTRATADOS A JUL 2013 (1/2)

N	PFIS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJORAM. (Km)	FECHA CCNS	FECHA OBRA
1	1365	015-2013-MTC/20 Ayacucho û Tambillo û Ocos -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo û Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa	341.00	286.09	ene/13	2014
2	1332	033-2012-MTC/20 Celendin - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas	367.00	142.57	may/12	2014
3	1336	034-2012-MTC/20 Huallanca - Molinopampa Puente Huarochirý - Sihuas	536.00	124.58	may/12	2014
4	1319	035-2012-MTC/20 Churcampa - Mayocc Izcuchaca - Mayocc	430.00	60.63	may/12	2014 2013
5	0964	049-2013-MTC/20 Bambas - Dv. Sihuas Pallasca - Mollepata	408.00	89.08	abr/13	2015
6	0318	057-2010-MTC/20 Pizana - Perlamayo	458.00	14.39	abr/10	2013
7	1379	066-2013-MTC/20 Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)	343.00	347.83	jul/13	2015
8	0312	068-2010-MTC/20 Huancavelica-Ticrapo	290.00	32.80	mar/10	2013
9	1358	069-2012-MTC/20 EMP. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor Emp. PE-3N (Sochobamba) - Huancabamba Huancabamba - Canchaque Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto Puesta Vado Grande - Socchabamba San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato) Socchabamba - Ayabaca	610.00	523.33	ago/12	2014
10	0853	070-2012-MTC/20 Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca Querobamba - Huacaña - Puquio	372.00	308.07	ago/12	2014

OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA CON CCNS CONTRATADOS A JUL 2013 (2/2)

N	PFIS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJORAM. (Km)	FECHA CCNS	FECHA OBRA
11	1380	070-2013-MTC/20	378.00	299.75	jul/13	2015
		Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-Saramiriza y Puente Wawico - Urakusa - Santa MarYá de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmí)		299.75		
12	0854	071-2012-MTC/20	526.00	300.42	ago/12	2014
		EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa		46.76		
		Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa		161.01		
		Sifuentes - El Convento - EMP. 1S (Chala)		92.65		
13	0320	094-2010-MTC/20	135.00	26.82	abr/10	2013
		Km 120-Punta de Carretera		15.26		
		Molinopampa- Rodríguez de Mendoza		8.35		
		Rodríguez de Mendoza - Km 120		3.20		
		CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO	5,194	2,556		

CONTRATADO: SOLUCIÓN BÁSICA CON CCNS

2,556 Km

OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA EN CCNS PROGRAMADOS A JUL 2013

N	PFIS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	FECHA CCNS	FECHA OBRA
		CP-35-2012-MTC/20	321.00	295.79		
	1378	Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		295.79	sep/13	2015

PREVISTO: SOLUCIÓN BÁSICA EN CCNS PROGRAMADOS

296 Km

OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES MEJ. EN EJECUCIÓN A JUL 2013

N	PFIS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJORAM. (Km)	CONTRATO PERFIL	FECHA CONTRATO	A JUL 2013	FECHA OBRA
1	0505	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348.00	26.12	014-2013-MTC/20	ene/13	62%	2015
		Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26.12				
2	1366	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412.00	136.56	022-2013-MTC/20	ene/13	32%	2015
		Tarata - Capazo		81.95				
		(en blanco)		54.62				
3	1367	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180.00	160.29	024-2013-MTC/20	feb/13	32%	2015
		Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)		160.29				
	1371	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	332.00	336.00	120-2012-MTC/20	dic/12	42%	2015
4		Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panao û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B -RÝo Codo-Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		336.00				
		PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN	1,272.00	658.97				

PREVISTO: SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES DE MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN

659 Km

OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES MEJ. PROGRAMADOS A JUL 2013

N	PFIS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJORAM. (Km)	FECHA OBRA
1	1304	PE-3N Emp. 10B (Pte Pallar) - Shiracpata- Chugay-Pampa de Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. 12A (Huacrachuco)	597.00	562.96	2016
		Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232.86	
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		330.09	
2	1363	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	250.00	215.28	2016
		Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuahuacho		215.28	
3	1645	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)- Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230.00	188.63	2016
		Emp. PE-34B(Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188.63	
4	1651	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)	536.00	358.90	2016
		Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		358.90	
5	1654	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia-y dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439.00	149.48	2016
		Dv. Huancane - Putina		1.42	
		Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61.50	
		Quiquirá - San Ignacio		86.56	
6	1657	Emp PE-3S - La Quinoa - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382.00	69.83	2016
		DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. carretera		69.83	
7	1660	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18 (214 Km)	214.00	189.52	2016
		Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189.52	
8	1663	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490.00	37.42	2016
		Pausa - Maran		37.42	
9	1704	Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150.00	140.54	
		Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140.54	
PERFILES DE MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS			3,288.00	1,912.56	


PREVISTO: SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS

1,913 Km


PROGRAMA PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA

5.424 Km


RVN EXISTENTE – LONGITUDINAL DE LA SIERRA (Km)

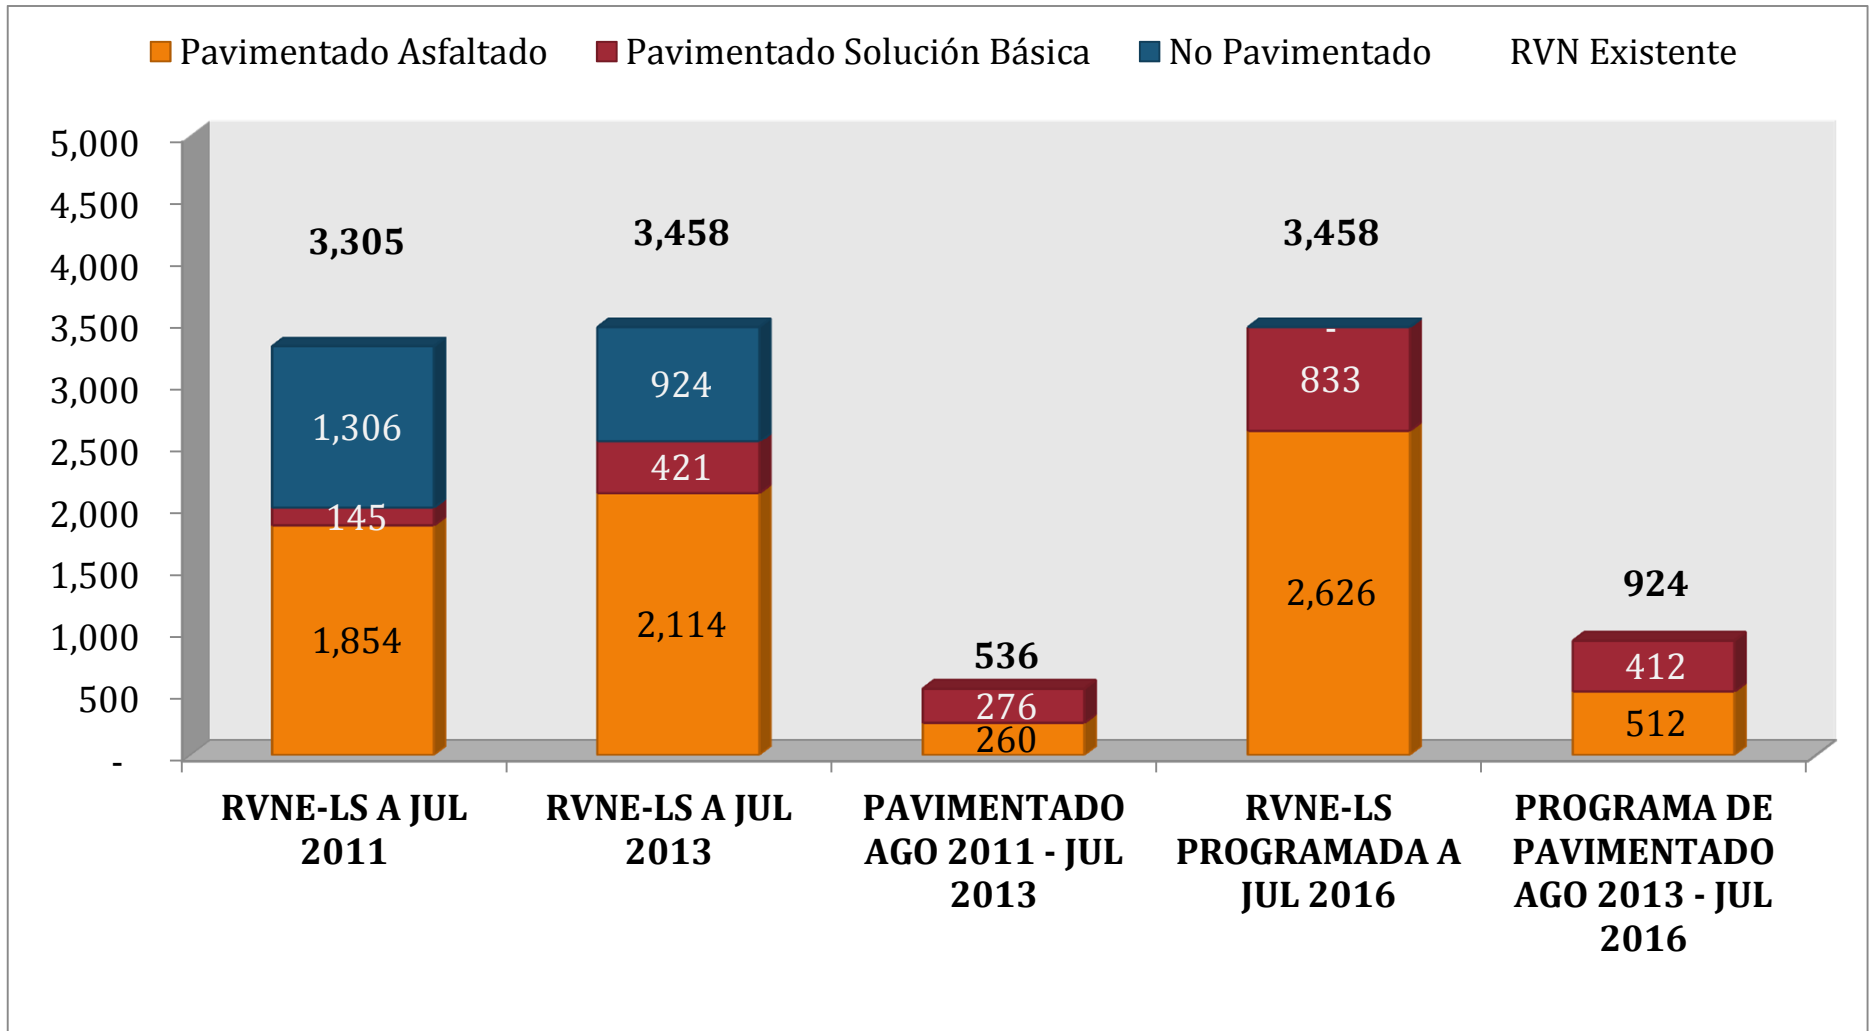


RVN PAVIMENTADA – LONGITUDINAL DE LA SIERRA (Km)

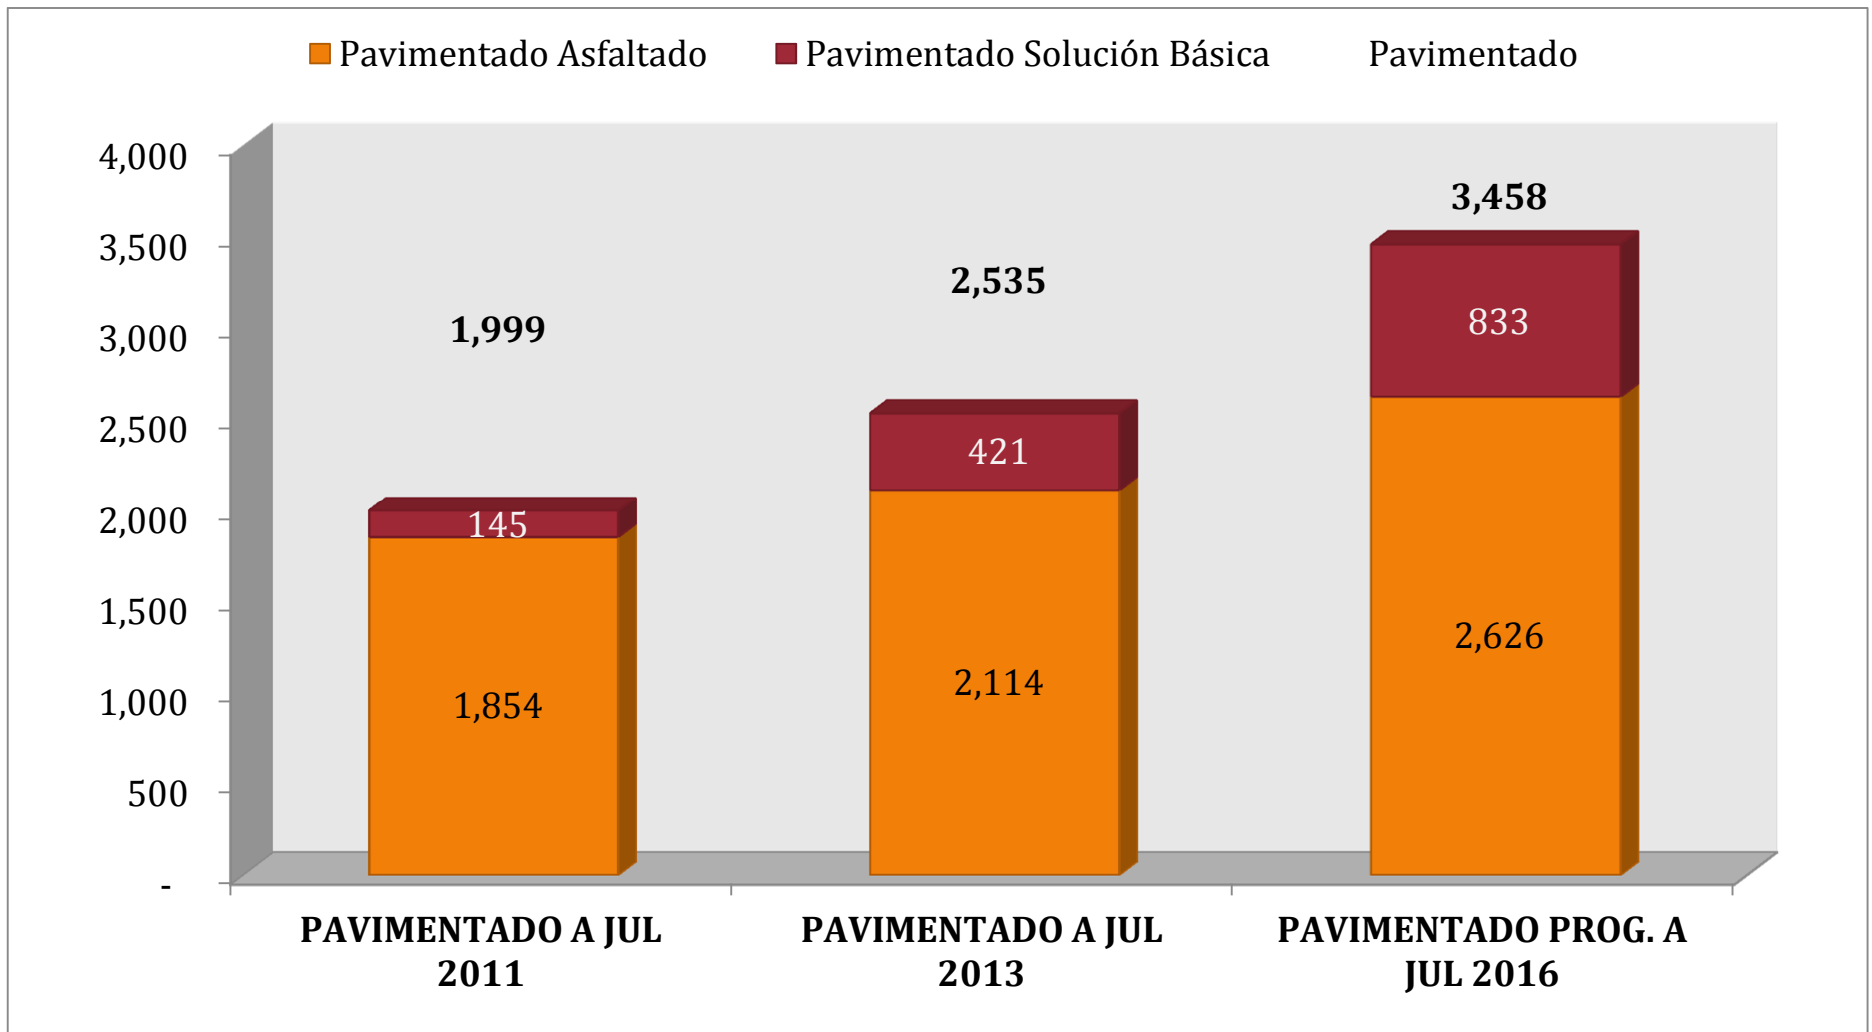

RVN PAVIMENTADA – LONGITUDINAL DE LA SIERRA (%)

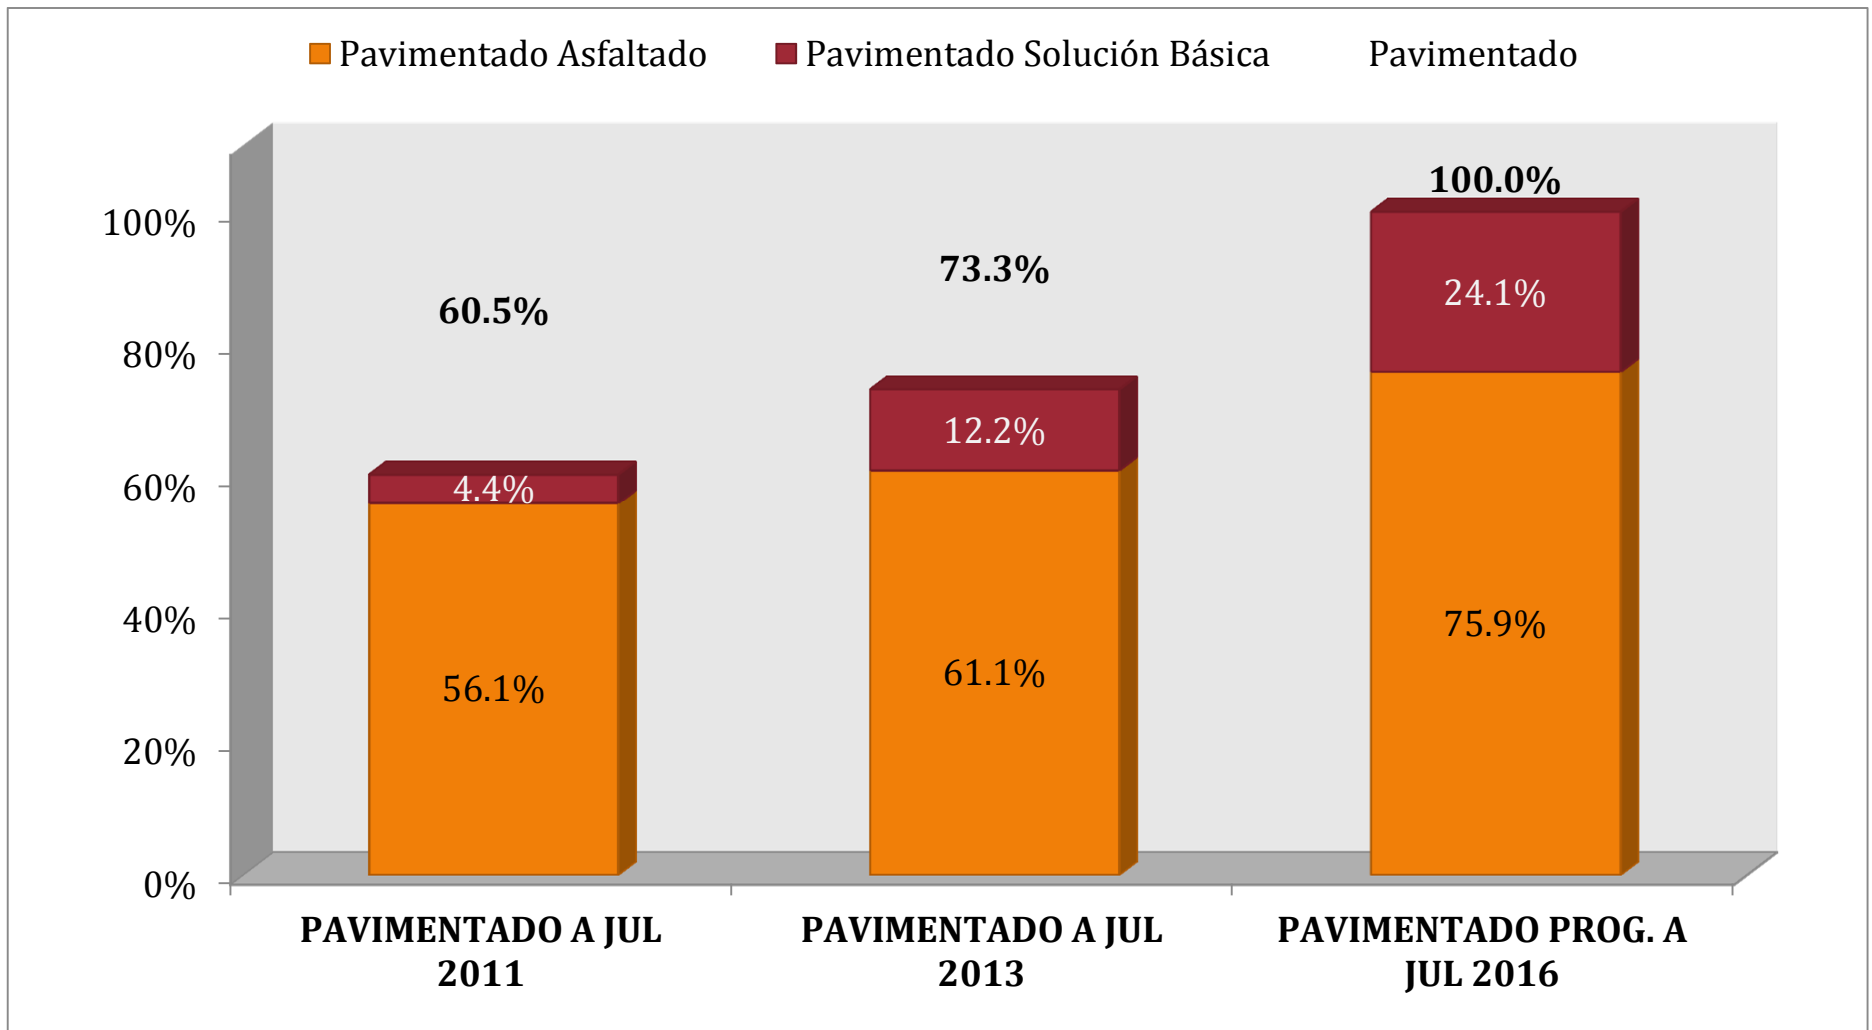


Objetivos Estratégicos Período 2011-2016:

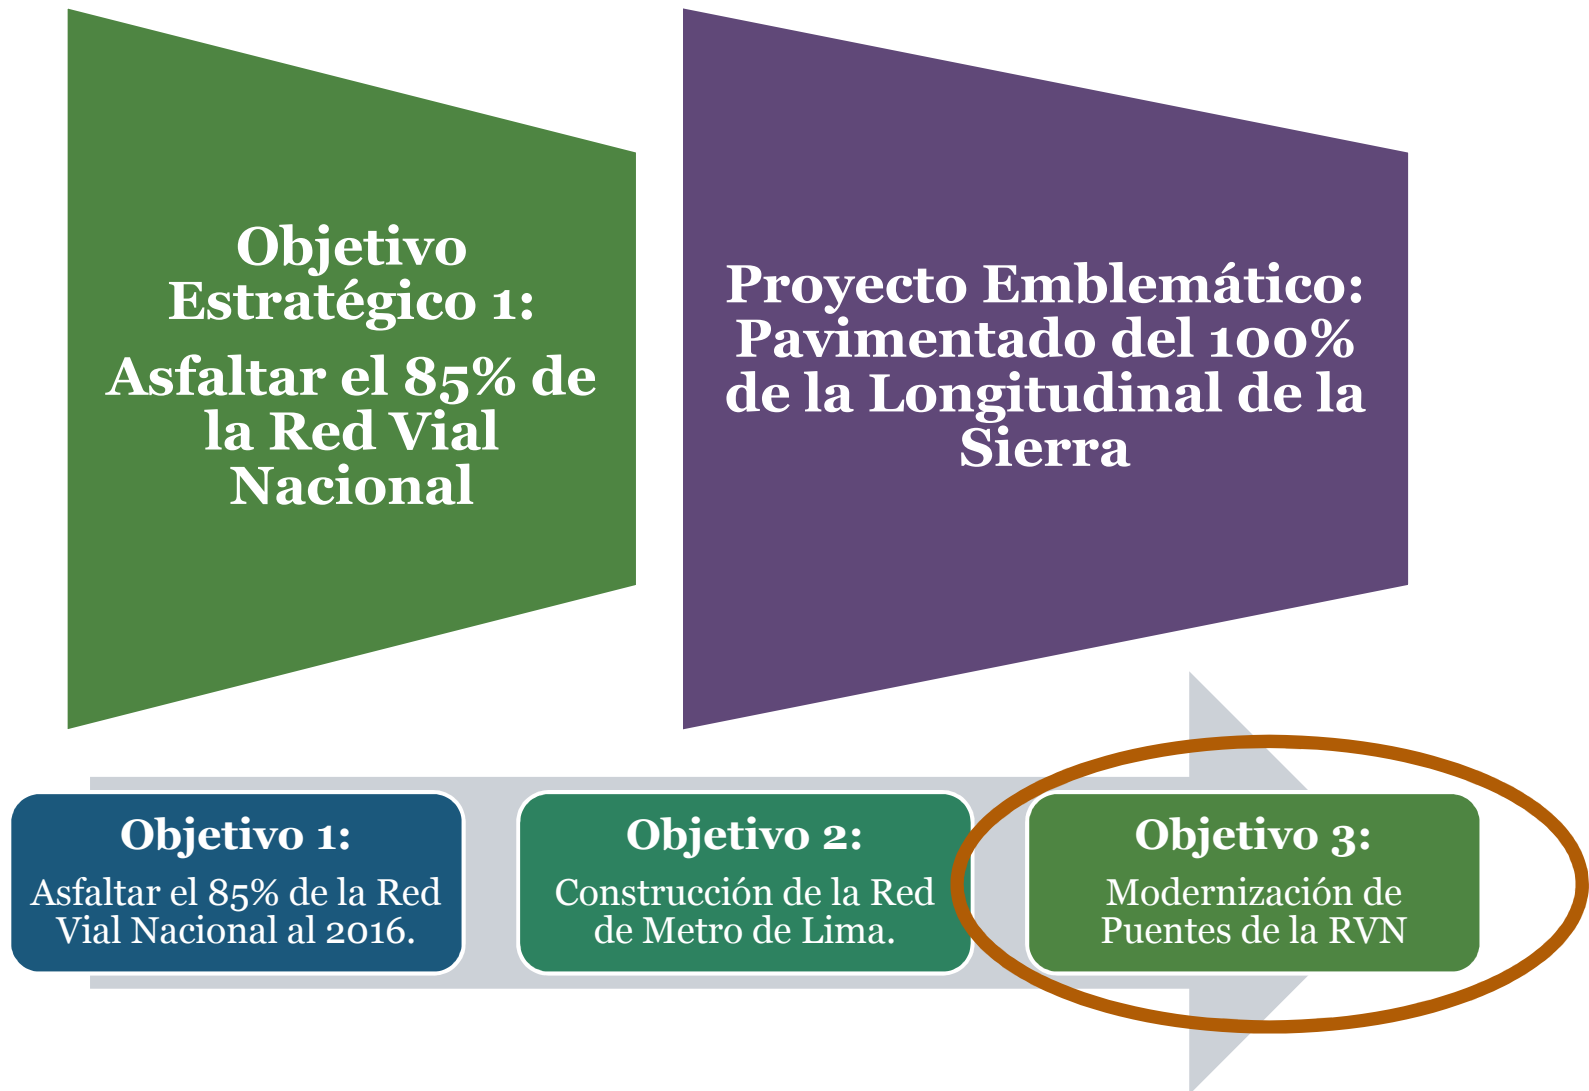

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

COMPONENTE	META 2012-2016		EJECUTADO			A JUL 2013
	UNIDAD MEDIDA	CANT.	A DIC 2012	ENE-JUN 2013	A JUL 2013	
CONSERVACION DE PUENTES	Puente	394	24	17	41	10.4%
EMERGENCIA DE PUENTES	Puente	20				
INSTALACION DE PUENTES MODULARES	Puente	374	24	17	41	11.0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS	Puente	429	10		10	2.3%
CONSTRUC. PUENTES DEFINITIVOS INDIVIDUALES	Puente	253	1		1	0.4%
CONSTRUC. PUENTES DEFINITIVOS EN CARRETERAS	Puente	176	9		9	5.1%
REINSTALACION DE PUENTES DE SEGUNDO USO	Puente	100				
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCESIONES	Puente	77				
TOTAL PUENTES		1,000	34	17	51	5.1%

AVANCE DEL PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

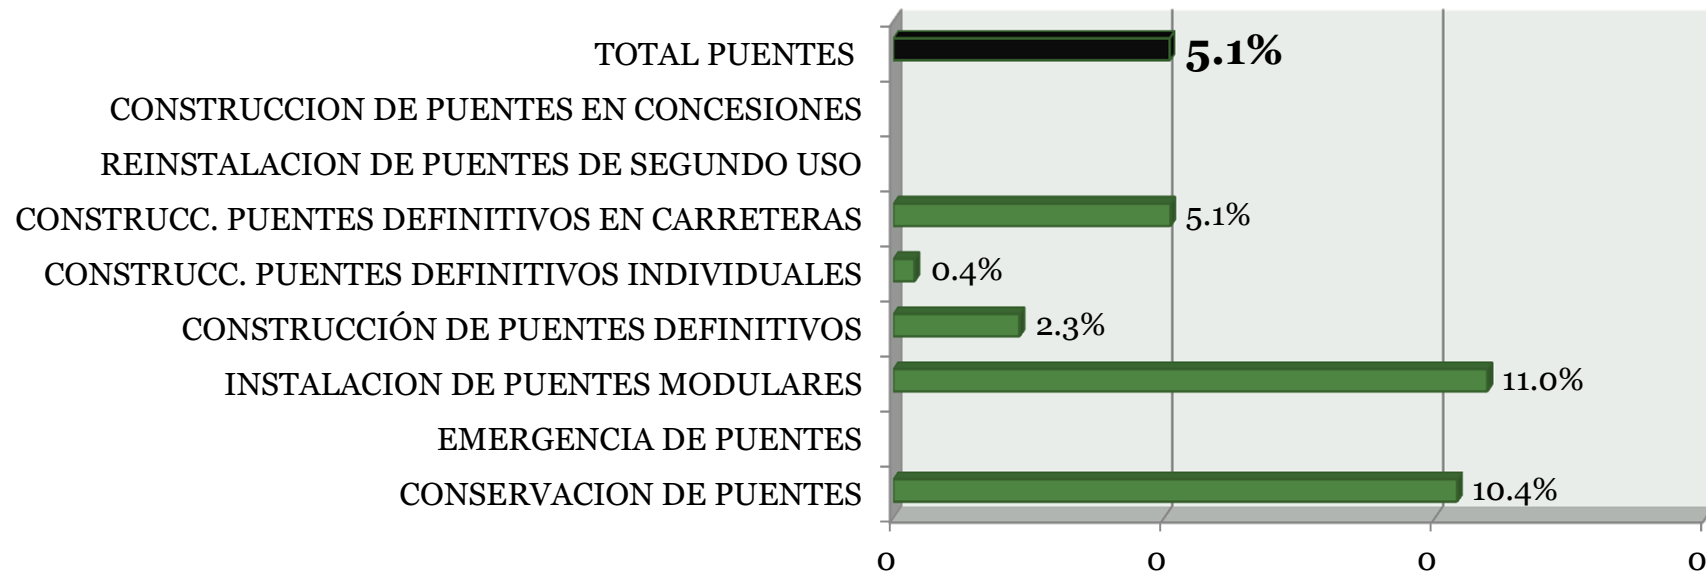



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
