



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL SITUACIÓN A DIC 2013 Y PROYECCIÓN A JUL 2016

PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
SITUACIÓN A DIC 2013, POI 2014 Y PROYECCIÓN A JUL 2016

F20140212



KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	LOGRADO		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	POR CONTRATAR	PROGRAMA PAVIMENTADO	POI 2014	PROYECCIÓN A JUL 2016
	A JUL 2011	A DIC 2013					
Pavimentado	12,358	15,906	3,082	2,983	6,066	1,781	21,972
Asfaltado	11,951	13,306	885	155	1,041	232	14,347
Solución básica	407	2,599	2,197	2,828	5,025	1,549	7,625
No Pavimentado	10,714	9,100					3,380
Total Existente	23,072	25,005					25,352
Pavimentado	53.6%	63.6%					86.7%

Fuente: PVN-OPEI (20130201). Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF

ESTRUCTURA PORCENTUAL

SUPERFICIE DE RODADURA	LOGRADO		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	POR CONTRATAR	PROGRAMA PAVIMENTADO	POI 2014	PROYECCIÓN A JUL 2016
	A JUL 2011	A DIC 2013					
Pavimentado	53.6	63.6	11.3	11.8	23.1	7.0	86.7
Asfaltado	51.8	53.2	2.8	0.6	3.4	0.9	56.6
Solución básica	1.8	10.4	8.5	11.2	19.7	6.1	30.1
No Pavimentado	46.4	36.4					13.3
Total Existente	100.0	100.0					100.0

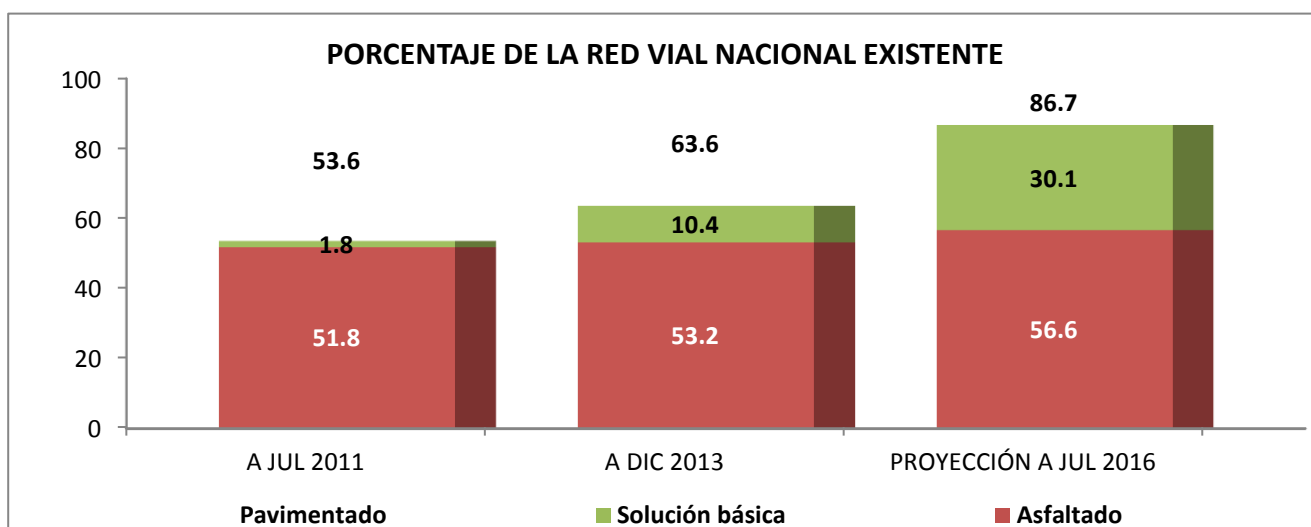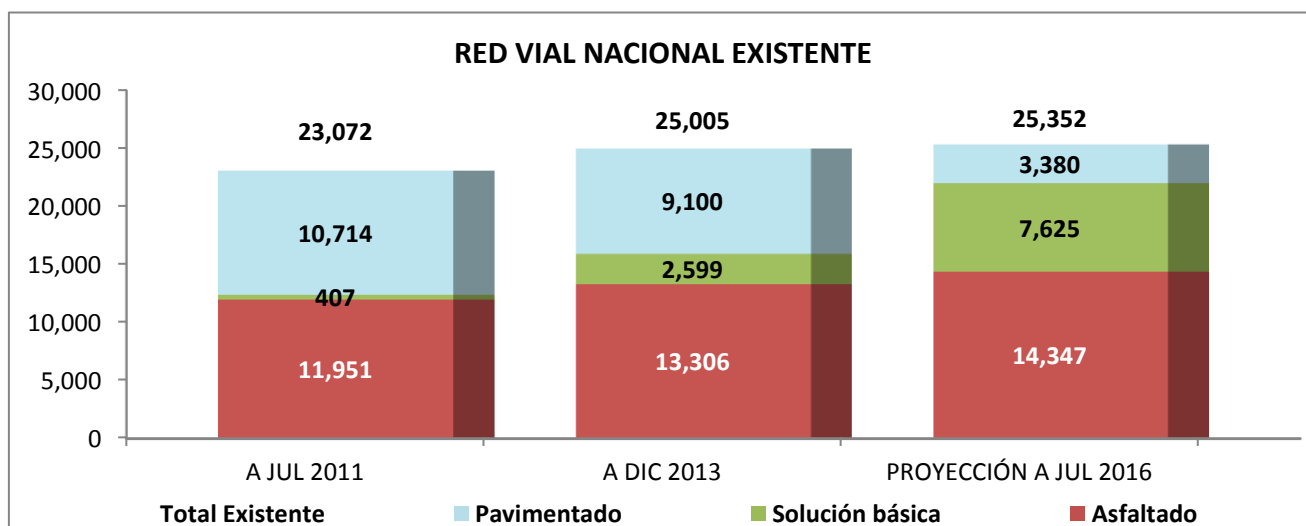

Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A DIC 2013

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	INICIO OBRA	FIN CONTRAC TUAL	FIN OBRA PFIS ¹	A DIC 2013	CONTRATO / CONVENIO	COSTO OBRA S/.
			2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis										
1		0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14		ene-13	sep-14	jun-15	28%	126-2012-MTC/20	189,320,643
			2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache										
2		0221	Tr. Juanjui - Campanilla	2794	43.28	42.54		abr-13	nov-14	mar-15	43%	090-2012-MTC/20	183,946,638
			2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco										
3		0233	Tr. Dv. Otuzco - Callacuyan	3291	70.90	54.57	54.57	nov-10	feb-14	mar-14	93%	157-2010-MTC/20	224,874,146
			2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco										
4		0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45		abr-12	jul-15	may-15	52%	081-2011-MTC/20	513,384,047
			2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas										
5		0464	Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000	4653	25.98	26.00	26.00	ene-13	mar-14	may-14	78%	097-2012-MTC/20	67,885,470
			2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar										
6		0769	Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	28.33	18.83		abr-13	feb-14	feb-15	28%	003-2013-MTC/20	81,944,103
			2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay										
7		0837	Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000	13558	55.20	54.18	54.18	jul-12	may-14	may-14	88%	049-2012-MTC/20	209,854,039
8		0885	Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto	13558	76.45	76.45		ene-13	may-15	may-15	63%	118-2012-MTC/20	455,577,555
			2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish										
9		0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000	3271	79.47	29.07		may-12	oct-14	ene-15	53%	032-2012-MTC/20	355,478,074
			2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca										
10		0146	Tr. Cochabamba - Chota	10447	31.86	31.04	31.04	dic-11	may-14	may-14	85%	080-2011-MTC/20	280,623,393
11		0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.89	51.67		may-12	ene-15	may-15	24%	021-2012-MTC/20	274,950,282
			2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna										
12		0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.46	94.50		may-13	oct-15	ago-16	36%	048-2013-MTC/20	553,293,164
			2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa										
13		0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85		may-13	abr-15	feb-16	14%	051-2013-MTC/20	305,013,261
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin										
14		0671	Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99.28	54.65		abr-13	abr-15	abr-16	8%	036-2013-MTC/20	531,425,832
			2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta										
15		0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.95	27.88		oct-13	nov-14	jul-15	4%	055-2013-MTC/20	120,647,375
			2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán										
16		1053	Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)	34473	42.60	23.93	23.93	mar-13	mar-14	jul-14	62%	102-2012-MTC/20	68,547,039
			2134881 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo										
17		1048	Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo	116092	67.73	67.63		abr-13	feb-15	feb-16	7%	046-2013-MTC/20	212,119,675
OBRAS VIALES CONTRATADAS					1,017	844	190						4,628,884,736

/1 Estimado por la OPEI-PFIS en función a tiempos históricos de obras terminadas al 2012.

F20140212

Anexo 2: OBRAS DE ASFALTADO PARA CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO EN EJECUCIÓN A DIC 2013

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	FIN ESTUD. DEFIN.	A DIC 2013*	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
			2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa									
1	0081	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytía (sectores dañados)	2434	25.00	0.52		ago-13	100%	may-14	dic-15	87,500,000
			2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas									
2	1050	1591	Tr. Imperial - Pampas	73078	37.67	37.49		dic-13	100%	may-14	may-16	202,670,000
			2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún									
3	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96		ago-13	100%	may-14	ago-15	8,621,794
			2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito									
4	0193	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito	108035	15.30	15.30		mar-14	95%	jul-14	ene-16	43,724,442
			2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro									
5	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.00	1.75		mar-14	90%	jun-14	may-16	231,062,508
			2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo									
6	1042	1559	Tr. Andahuaylas – Huancabamba	5080	20.00	20.00		abr-14	80%	ago-14	feb-16	50,800,000
			2078363 Mejoramiento Carretera Chuquicara - Pte Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval – Pallasca									
7	0155	0963	Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.29		abr-14	80%	ago-14	jul-16	202,567,129
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada									
8	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.40	29.27		may-14	75%	sep-14	may-16	123,300,000
			2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna									
9	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón 2/	3272	51.30	1.82		abr-14	80%	ago-14	jul-16	300,491,699
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin									
10	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churín 2/	34470	5.14	4.85		ago-14	40%	dic-14	mar-16	21,536,600

OBRAS VIALES EN ESTUDIO DEFINITIVO					299	155						1,272,274,172
---	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	----------------------

/1 Estimado por la OPEI-PFIS en función a tiempos históricos de obras terminadas al 2012. 2/ Por Convenio

ANEXO 3: OBRAS DE ASFALTADO EN CONTRATOS DE CONCESIÓN A DIC 2013

Nº	PFIS CON		CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	FECHA INICIO	FECHA FIN	A DIC 2013	CONTRATISTA
1	139	CON	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	40.88	40.88			oct-15		COVIPERU
OBRAS VIALES EN CONCESIONES				41	41					

F20140212

TOTAL PAVIMENTADO ASFALTADO

1,041 Km

Anexo 4: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADAS EN CNS A DIC 2013

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	FECHA SUSCRIP. CCNS	FIN OBRA
1	1365	015-2013-MTC/20	341	192.87	192.87	ene-13	
		Ayacucho ù Tambillo ù Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo ù Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa		192.87	192.87		2014
2	1336	034-2012-MTC/20	536	124.58	124.58	may-12	
		Huallanca - Molinopampa		16.07	16.07		2014
		Puente Huarochiri - Sihuas		108.50	108.50		2014
3	1319	035-2012-MTC/20	430	20.77	20.77	may-12	
		Churcampa - Mayocc		20.77	20.77		2014
4	0964	049-2013-MTC/20	408	89.08		abr-13	
		Bambas - Dv. Sihuas		58.48			2015
		Pallasca - Mollepata		30.60			2015
5	0318	057_2010-MTC/20	458	14.39		abr-10	
		Pizana _ Perlamayo		14.39	14.39		2014
6	1379	066-2013-MTC/20	343	347.83		jul-13	
		Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)		347.83			2015
7	0312	068-2010-MTC/20	343	22.29		mar-10	
		Huancavelica-Ticrapo		22.29	22.29		2014
8	1358	069-2012-MTC/20	610	471.82	316.31	ago-12	
		Emp PE 04-B (Hualapampa) - Sondor		123.26	123.26		2014
		Huancabamba - Canchaque		67.28	67.28		2014
		Huancabamba - Emp. PE-3N (Sochobamba)		155.51			2015
		Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto		110.52	110.52		2014
		San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)		15.25	15.25		2014
9	0853	070-2012-MTC/20	372	286.43	286.43	ago-12	
		Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca		120.77	120.77		2014
		Querobamba - Huacata - Puquio		165.67	165.67		2014
10	1380	070-2013-MTC/20	378	299.75		jul-13	
		Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-Saramiriza y Puente Wawico - Urakusa - Santa Marla de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmi)		299.75			2015
11	0854	071-2012-MTC/20	526	300.42	300.42	ago-12	
		EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa		46.76	46.76		2014
		Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa		161.01	161.01		2014
		Sifuentes - El Convento - EMP. 1S (Chala)		92.65	92.65		2014
12	0320	094-2010-MTC/20	526	26.82	26.82	abr-10	
		Km 120-Punta de Carretera		15.26	15.26		2014
		Molinopampa-Rodriguez de Mendoza		8.35	8.35		2014
		Rodriguez de Mendoza - Km 120		3.20	3.20		2014
		CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO	5,271	2,197	1,305		

F20140212

Anexo 5: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN CNS A DIC 2013

N	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	FECHA SUSCRIP. CCNS	FIN OBRA
1		CP-35-2012-MTC/20	321	295.79			
	1378	Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		295.79		abr-14	2016
		CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO	321	296			

Anexo 6: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN A DIC 2013

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	CONTRATO PERFIL	FECHA CONTRATO	A DIC 2013	FIN OBRA
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Empalme PE-18B (Río Codo) - Emp PE-5N	332	336.00		120-2012-MTC/20	dic-12	72%	
			Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panao û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B -Río Codo-Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		336.00					2015
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26.12		014-2013-MTC/20	ene-13	95%	
			Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26.12					2015
3	1366	1561	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136.56		022-2013-MTC/20	ene-13	42%	
			Capazo- Mazocruz		54.62					2015
			Tarata - Capazo		81.95					2015
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160.29		024-2013-MTC/20	feb-13	37%	
			Andahuaylas (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A)		160.29					2015
5	1363	1619	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	250	215.28		078-2013-MTC/20	ago-13	22%	
			Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Challhuahuacho		215.28					2016
6	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutiérrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188.63		096-2013-MTC/20	oct-13	23%	
			Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188.63					2016
7	1304	1644	PE-3N Emp. 10B (Pte Pallar) - Shiracpata- Chugay-Pampa de Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. 12A (Huacrachuco)	597	562.96		107-2013-MTC/20	oct-13	32%	
			Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232.86					2016
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		330.09					2016
8	1663	1665	Emp. PE-15 (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	37.42		138-2013-MTC/20	dic-13	0%	
			Pausa - Maran		37.42					2016
PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN				2,839	1,663					

F20140212

Anexo 7: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO PARA CONTRATAR A DIC 2013

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	MEJ. (Km) Año 2014	FIN OBRA
1	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)	536	358.90		
			Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		358.90		jun-2016
2	1654	315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia-y dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149.48		
			Dv. Huancane - Putina		1.42		jun-2016
			Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61.50		jun-2016
			Quiquirá - San Ignacio		86.56		jun-2016
3	1657	313	Emp PE-3S - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	30.57		
			DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. carretera		30.57		jun-2016
4	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18 (214 Km)	214	189.52		
			Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189.52		jun-2016
6	1704	1703	Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	140.54		
			Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140.54		jun-2016
PERFILES DE MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PARA CONTRATAR				1,721	869		

TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA

5,025

Km
