



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

PROGRAMA DE GESTIÓN

PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL PROYECCIONES ABR 2014 - JUL 2016 Y A DIC 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO

RED VIAL NACIONAL

KILÓMETROS

F20140512

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	MAR 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
Pavimentado	12,358	16,044	17,430	18,872	20,206	21,865	22,594
Asfaltado	11,951	13,390	13,525	13,963	14,376	14,679	14,859
Solución básica	407	2,654	3,904	4,908	5,830	7,186	7,735
No Pavimentado	10,714	9,374	7,988	6,588	5,319	3,718	3,066
Total Existente	23,072	25,418	25,418	25,460	25,525	25,583	25,659
Pavimentado	53.6%	63.1%	69%	74%	79%	85%	88%

PERIODOS	AGO 2011 - MAR 2014	2014 Abr-Dic	2015	ENE-JUL 2016	2017	2018
Pavimentado	3,687	1,385	1,442	1,334	1,659	729
Asfaltado	1,439	135	438	413	303	180
Solución básica	2,247	1,250	1,004	922	1,356	548
Rehabilitación	233	200	472	261	302	432
Rehabilitación y Mej.	1,672	335	910	674	605	612

Nota: En este caso la Rehabilitación y Mejoramiento corresponde a intervenciones en Asfaltado
Fuente: PVN-OPEI (20130201). Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF





LONGITUDINAL DE LA SIERRA

KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	MAR 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
Pavimentado	1,999	2,687	2,927	3,295	3,335	3,335	3,401
Asfaltado	1,854	2,185	2,270	2,421	2,461	2,461	2,527
Solución básica	145	502	657	874	874	874	874
No Pavimentado	1,306	813	573	205	165	165	99
Total Existente	3,305	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Pavimentado	60.5%	76.8%	84%	94%	95%	95%	97%

PERIODOS	AGO 2011 - MAR 2014	2014 Abr-Dic	2015	ENE-JUL 2016	2017	2018
Pavimentado	-	688	240	368	40	66
Asfaltado		331	85	151	40	66
Solución básica		357	155	217		
Rehabilitación				59	130	48
Rehabilitación y Mej.		331	85	151	99	114

Nota: En este caso la Rehabilitación y Mejoramiento corresponde a intervenciones en Asfaltado
Fuente: PVN-OPEI (20130201). Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF

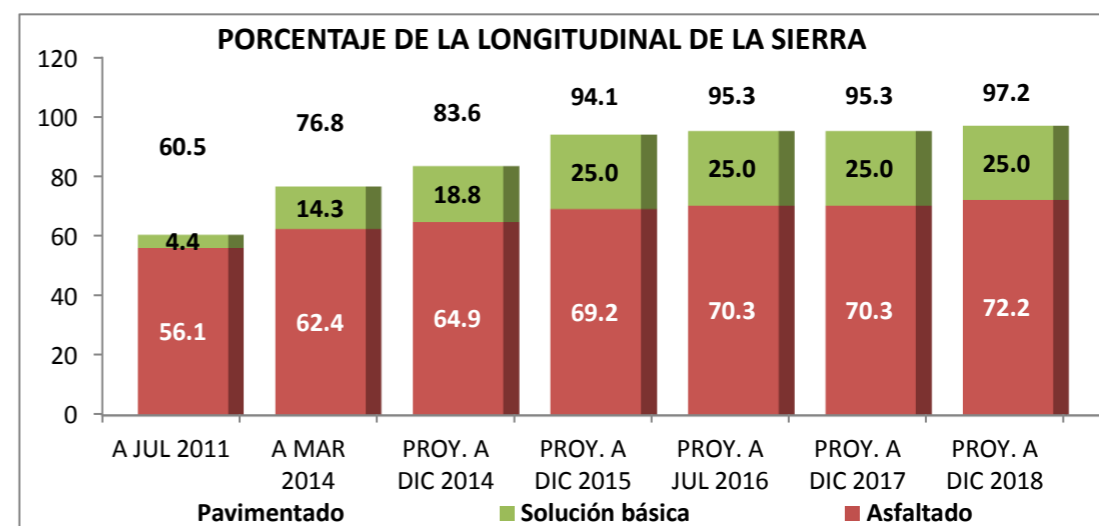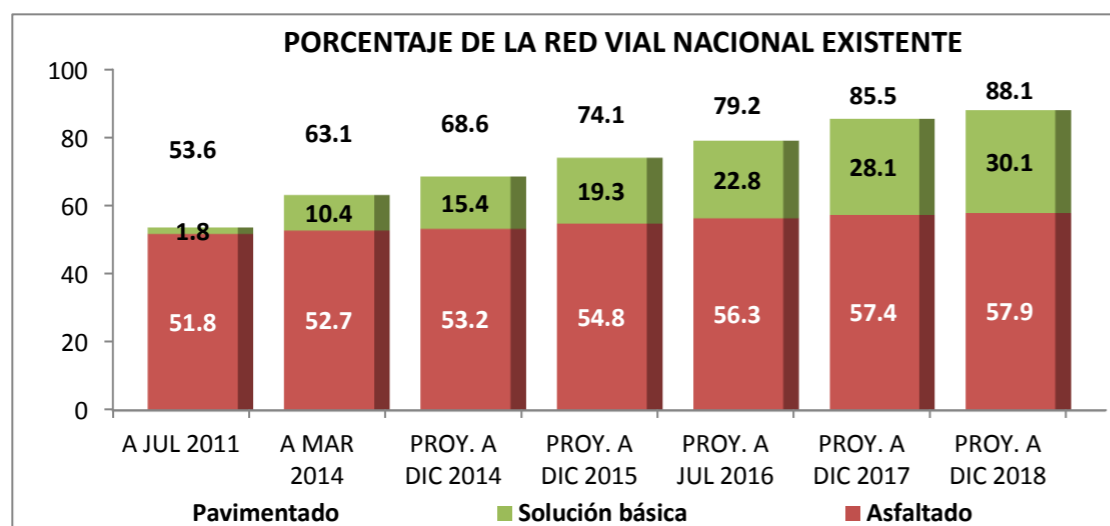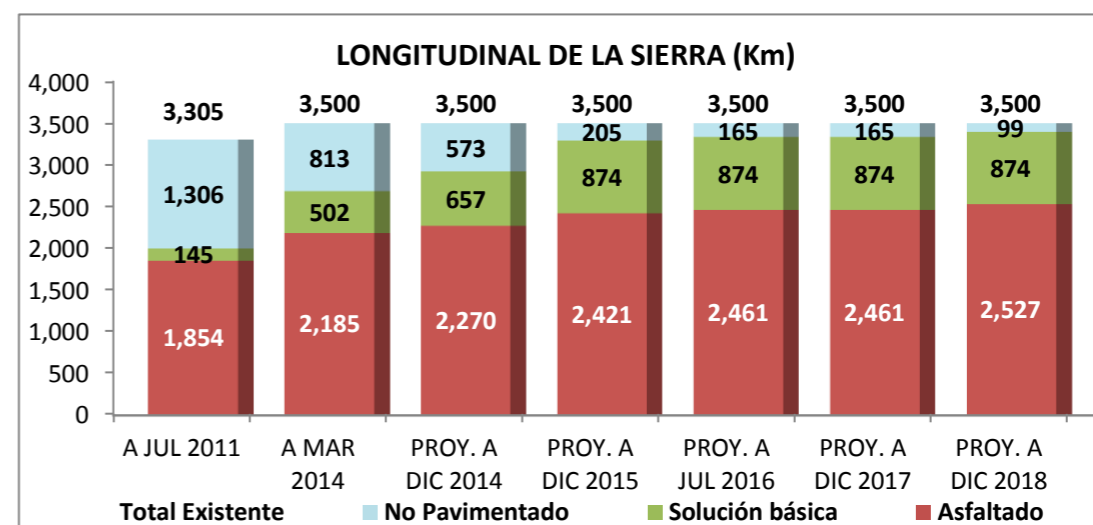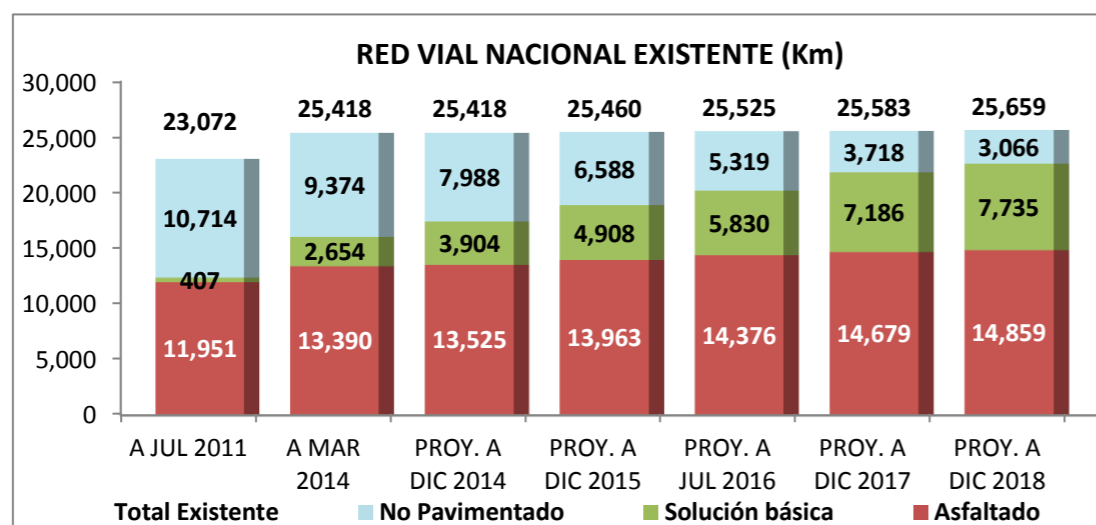

RED VIAL NACIONAL

KILÓMETROS

F20140512





SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	POR CONTRATAR	PROGRAMA PAVIMENTADO	PROYECTADO A JUL 2016
	JUL 2011	MAR 2014				
Pavimentado	12,358	16,044	3,004	1,158	4,161	20,206
Asfaltado	11,951	13,390	831	155	986	14,376
Solución básica	407	2,654	2,173	1,002	3,176	5,830
No Pavimentado	10,714	9,374				5,319
Total Existente	23,072	25,418				25,525
Pavimentado	53.6%	63%				79%

LONGITUDINAL DE LA SIERRA

KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	POR CONTRATAR	PROGRAMA PAVIMENTADO	PROYECTADO A JUL 2016
	JUL 2011	MAR 2014				
Pavimentado	1,999	2,687	608	40	648	3,335
Asfaltado	1,854	2,185	236	40	276	2,461
Solución básica	145	502	372		372	874
No Pavimentado	1,306	813				165
Total Existente	3,305	3,500				3,500
Pavimentado	60.5%	77%				95%

Fuente: PVN-OPEI (20130201). Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF

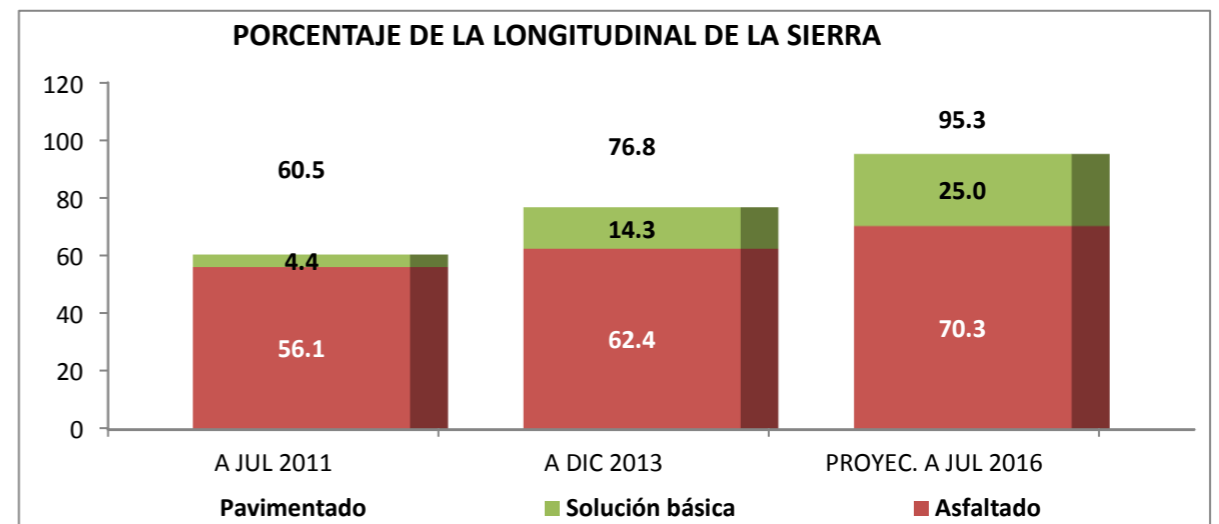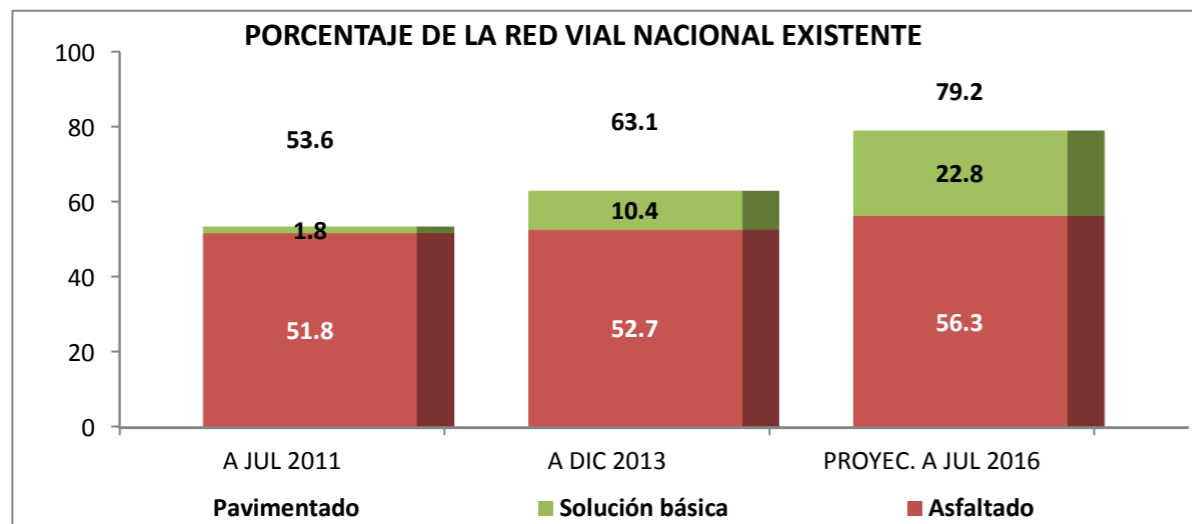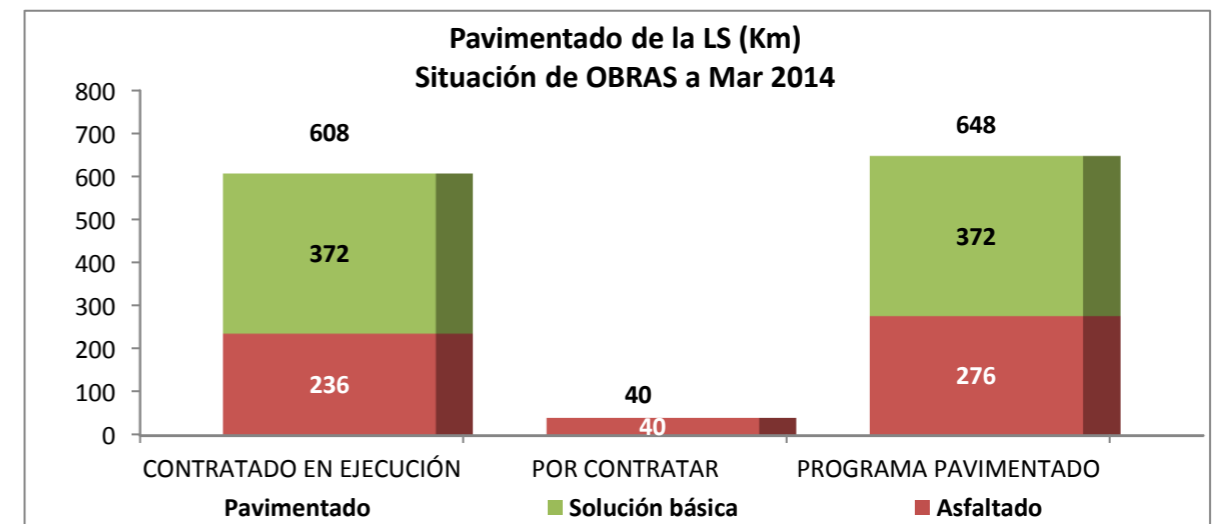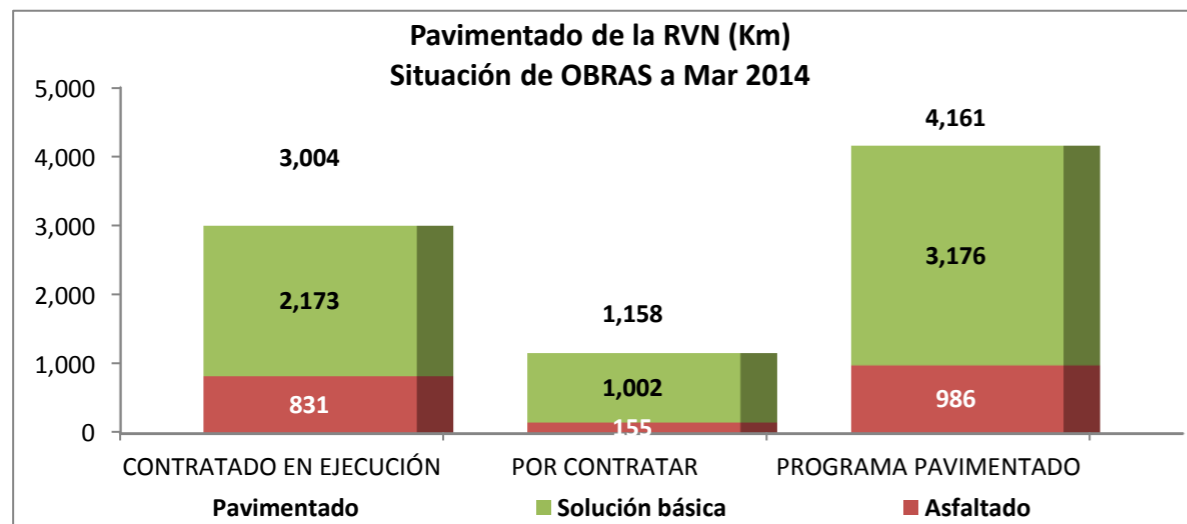

Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A MARZO 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS ¹	FIN CONTRAC TUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A MAR 2014	COSTO OBRA S/.
			2002210 Rehabilitación y mejoram. carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis															
1		0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14		52.14					ene-13	may-15	sep-14	126-2012-MTC/20	36%	189,320,643
			2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache															
2		0221	Tr. Juanjui - Campanilla	2794	43.28	42.54		42.54					abr-13	mar-15	nov-14	090-2012-MTC/20	64%	183,946,638
			2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco															
3		0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45		94.45					abr-12	jul-15	jul-15	081-2011-MTC/20	52%	513,384,047
			2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas															
4		0464	Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000	4653	26.00	26.00		26.00					ene-13	jul-14	may-14	097-2012-MTC/20	80%	67,885,470
			2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar															
5		0769	Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	28.33	18.83		18.83					abr-13	feb-15	sep-14	003-2013-MTC/20	39%	81,944,103
			2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay															
6		0837	Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000	13558	55.20	54.18	54.18	54.18					jul-12	jul-14	jun-14	049-2012-MTC/20	93%	220,742,988
7		0885	Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto /a	13558	76.45	76.45	71.18	76.45					ene-13	sep-15	may-15	118-2012-MTC/20	73%	455,577,555
			2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish															
8		0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000	3271	79.47	29.07		29.07					may-12	feb-15	ene-15	032-2012-MTC/20	61%	350,116,643
			2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca															
9		0146	Tr. Cochabamba - Chota	10447	31.86	31.04	31.04	31.04					dic-11	jul-14	jul-14	080-2011-MTC/20	88%	280,623,393
10		0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.86	51.67	51.67	51.67					may-12	jul-15	jul-15	021-2012-MTC/20	32%	274,950,282
			2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna															
11		0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.46	94.10		94.10					may-13	may-16	nov-15	048-2013-MTC/20	50%	553,293,164
			2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa															
12		0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85		44.85					may-13	feb-16	ago-15	051-2013-MTC/20	17%	305,013,261
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin															
13		0671	Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99.28	54.65		54.65					abr-13	abr-16	oct-15	036-2013-MTC/20	16%	531,425,832
			2089761 Rehabilitación y mejoram. carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta															
14		0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.95	27.88	27.88	27.88					oct-13	jul-15	oct-14	055-2013-MTC/20	11%	120,647,375
			2134846 Rehabilitación y mejoram. carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán															
15		1053	Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)	34473	42.60	23.93		23.93					mar-13	jun-14	may-14	102-2012-MTC/20	81%	68,547,039
			2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo															
16		1048	Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	116092	67.73	67.63		67.63					abr-13	ene-16	may-15	046-2013-MTC/20	9%	212,119,675
			2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana															
17		0503	Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37.44								ene-14	mar-16	jul-15	126-2013-MTC/20	1%	116,930,853
			2043324 Culminación construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100															
18		0655	Tr. Pimentel - Chiclayo (autopista)	10699	3.15								ene-14	abr-15	jul-14	141-2013-MTC/20	11%	17,139,636
			2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha															
19		1001	Tr. San Marcos - Cajabamba	11432	58.80								sep-13	nov-15	ago-15	075-2013-MTC/20	24%	284,662,570
			2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma															
20		1088	Tr. Dv. Las Vegas - Tarma	169126	32.62								sep-12	sep-14	jun-14	077-2012-MTC/20	59%	91,723,531
			2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo															
21		0100	Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo (2da Calzada)	128445	10.20								abr-14	jun-15	jun-15	008-2013-MTC/20	0%	127,124,273
			2179050 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. III Km 886+600 - 1033+100															
22		1712	Tr. III: Limite Piura (Km. 886+600) - Sullana (Km. 1033+100) **	258061	146.50								sep-13	nov-14	sep-14	Acuerdo Arbitral	93%	123,111,917
			2188747 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. II: Km. 557+000 al 886+600															
23		1714	Tr. II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600) **	279073	329.60								may-14	mar-16	jun-15	Acuerdo Arbitral	0%	263,478,246
			OBRAS VIALES CONTRATADAS		1,565	789	236	135	393	261	-	-						5,433,709,134

1/ Estimado por la OPEI-PFIS en función a tiempos históricos de obras terminadas al 2012. (*) Referencia de Convenio (**) En RVN Concesionada y no debe entrar a Productos en RVN No Concesionada
a/ Los 57.4 Km de la ruta PE-3S, que no será asfaltada, será reclasificada por la variante Dv. Kishuara - Huancarama - Alfapata de la ruta PE-3SE que será asfaltada por ser de mayor tránsito en la zona.

F20140512

ANEXO 2: OBRAS DE ASFALTADO EN CONTRATOS DE CONCESIÓN A MARZO 2014

Nº	PFIS CON	CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FECHA INICIO	FIN OBRA PFIS ²	CONTRATISTA
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	41.11	41.11		41.11					ene-15	oct-15	COVIPERU
		OBRAS VIALES CONCESIONADAS	41	41		-	41	-	-	-			
OBRAS VIALES CONTRATADAS Y CONCESIONADAS			1,606	831	236	135	434	261	-	-	Km		5,433,709,134

F20140512

Anexo 3.1: OBRAS DE ASFALTADO PARA CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO A MARZO 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A MAR 2014	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
			2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún															
	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96		3.96					may-14	ago-15	ago-13	138-2010-MTC/20	100%	8,971,000
			2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa															
	0081	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytia (sectores dañados)	2434	25.00	0.52		0.52					ago-14	abr-16	ago-13	008-2010-MTC/20	100%	155,126,819
			2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas															
	1050	1591	Tr. Imperial - Pampas	73078	37.67	37.49		37.49					may-14	may-16	dic-13	018-2012-MTC/20*	100%	202,670,000
			2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito															
	0193	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito	108035	15.30	15.30		15.30					jul-14	ene-16	abr-14	166-2010-MTC/20	95%	43,724,442
			2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro															
	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.00	1.75		1.75					jun-14	may-16	abr-14	072-2011-MTC/20	90%	231,062,508
	0516	0996	Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro	3373	55.00								ene-15	jul-17	abr-14	065-2011-MTC/20	95%	225,500,000
	0517	1562	Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro	3373	62.90								ene-15	ago-17	abr-14	068-2011-MTC/20	80%	257,890,000
			2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo															
	1042	1559	Tr. Andahuaylas – Huancabamba	5080	20.00	20.00		20.00					ago-14	feb-16	abr-14	001-2013-MTC/20	90%	50,800,000
			2078363 Mejoramiento Carretera Chuquicara - Pte Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval – Pallasca															
	0155	0963	Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.29	40.29	40.29					ago-14	jul-16	may-14	025-2012-MTC/20	80%	202,567,129
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp. Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta Pe-5N La Calzada															
	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.40	29.27		29.27					sep-14	may-16	mar-14	066-2010-MTC/20	100%	123,300,000
			2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna															
	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón	3272	51.30	1.82		1.82					ago-14	jul-16	feb-14	GRAQP-GRMOQ-SP*	100%	300,491,699
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin															
	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churín	34470	5.14	4.85		4.85					dic-14	mar-16	nov-14	196-2008-MTC/01*	75%	21,536,600
			2057739 Rehabilitación y mejoramiento carretera Ica - Los Molinos - Tambillos															
	0910	1552	DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. Carretera	6804	13.80								abr-15	dic-16	oct-14	045-2013-MTC/20	55%	55,200,000
			2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani															
	0511	0432	Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro	3876	86.00	69.33		69.33					jun-15	oct-17	jul-14	180-2010-MTC/20	60%	180,600,000
			2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish															
	0071	0923	Tr. Canta - Huallay	3271	96.50	91.74		91.74					mar-14	jul-17	jul-12	001-2009-MTC/20*	100%	482,500,000
			2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote															
	0016	0937	Vía Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34.66	34.66		34.66					jul-15	feb-17	ene-12	209-2008-MTC/20	100%	121,310,000
			2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay															
	1344	1568	Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	108630	9.50								oct-15	abr-17	jun-15	013-2014-MTC/20	0%	38,382,906
			2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía															
	1340	1592	Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía	8669	36.30	23.67		23.67					nov-15	jul-17	jul-15	001-2014-MTC/20	0%	181,500,000
			2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri															
	1578	1579	Tr. Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri	142861	73.90	73.39		73.39					jul-05	nov-17	abr-14	027-2012-MTC/20	70%	369,500,000
			2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez															
	1128	1566	Tr. Villa Rica-Pto. Bermudez	3368	110.88	73.18		73.18					feb-16	dic-18	sep-15	028-2014-MTC/20	0%	554,400,000
			2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo															
	1596	1597	Tr. Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)	93142	75.50	40.94		40.94					feb-16	jun-18	dic-14	004-2008-MTC/20*	10%	377,500,000
			2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho															
	0519	1563	Tr. Cajabamba - Sausacocho	11432	38.95								ene-15	mar-17	abr-14	067-2011-MTC/20	80%	194,750,000
			2173121 Longitudinal Sierra Norte, Tr. Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple															
	1059	1604	Tr. Chota - Cutervo - Chiple	103730	91.40								nov-14	abr-17	oct-13	025-2010-MTC/20*	100%	548,400,000
			O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO		1,084	562	40	-	4	151	293	114						4,927,683,103

(*) Convenio

Anexo 3.2: OBRAS DE ASFALTADO PARA CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR A MARZO 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A MAR 2014	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
			2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa															
3	0090	1547	Tr. Aguaytia - San Alejandro(Sectores Críticos)	2434	10.00								abr-16	oct-17	dic-15	Por contratar		35,000,000
			2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani															
	0419	0241	Tr. Colpahuayco - Langui	3876	10.00	10.00					10.00		nov-15	may-17	sep-14	Por contratar		21,000,000
			2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui															
	0137	1701	Tr. Juan Guerra - Puerto Lopez	13860	48.00	0.32					0.32		ene-16	abr-18	jun-15	Por contratar		240,000,000
			2158699 Rehabilitación de la carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - Dv. Pampas															
	1072	1567	Tr. II Pucara - Pazos y Tr. III Pazos - Dv. Pampas	198686	26.90								oct-16	may-18	jun-16	Por contratar		134,500,000
			2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz															
	1602	1603	Tr. Huallanca - Caraz	101490	37.00								ago-16	jul-18	abr-16	Por contratar		185,000,000
			2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca															
	1122	1595	Autopista Juliaca - Puno	92806	48.45								may-16	ago-18	ene-16	Por contratar		242,250,000
			2233819 Mejoramiento de la carretera Balzas - Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza															
	1588	1589	Tr. Tingo-Dv. Ingenio y Chachapoyas-Molinopampa	25096	63.74								may-16	sep-18	ene-16	Por contratar		350,570,000
			2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo															
	0510	0976	Tr. Tarata - Capazo	108281	83.90								feb-16	oct-18	nov-15	Por contratar (contrato		335,600,000
			2056359 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores															
	0662	1550	Tr. Santa Ines-Castrovirreyrna-Tirapo-Pampano	66742	51.60								sep-16	nov-18	jul-16	Por contratar		309,600,000
			2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca															
	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64				65.64		jun-16	dic-18	sep-15	Por contratar		295,380,000
			O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR		445	76	66	-	-	-	10	66						2,148,900,000

(*) Convenio

OBRAS VIALES POR CONTRATAR	1,530	638	106	-	4	151	303	180	Km		7,076,583,103
-----------------------------------	--------------	------------	------------	---	----------	------------	------------	------------	-----------	--	----------------------

TOTAL OBRAS VIALES	3,135	1,469	342	135	438	413	303	180	Km		12,510,292,237
---------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	-----------------------

TOTAL REHABILITACIÓN	1,667			200	472	261	302	432	Km		
-----------------------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--

TOTAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ASFALTADO	3,135			335	910	674	605	612	Km		
---	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--

NOTA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA - LS

Para pavimentar el 100% de la LS se requiere pavimentar con Solución Básica, haciendo una Adenda en el CCNS correspondiente, los tramos de los PIPs cuyo Fin de Obra sería después de Jul 2016.

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS (Km)	INICIO OBRA	FIN OBRA ¹	Implementar ADENDA en CCNS
1		0907	Tr. Santiago de Chuco - Shorey	52842	18.16	18.16	18.16			CCNS Nº 049-2013-MTC/20
2	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64	may-16	sep-18	CCNS Nº 034-2012-MTC/20
3	0969	1593	Tr. Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata	86897	81.55	80.91	80.91	dic-16	ago-19	CCNS Nº 049-2013-MTC/20
			TOTAL		165.35	164.70	164.70			

Anexo 4: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADAS EN CNS A MARZO 2014

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1365	015-2013-MTC/20	341	138.03		138.03						ene-13
		Ayacucho ù Tambillo ù Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo ù Carapo -Huancasancos		138.03		138.03					2014	
2	1336	034-2012-MTC/20	536	124.58	16.07	124.58						may-12
		Huallanca - Molinopampa		16.07	16.07	16.07					2014	
		Puente Huarochiri - Sihuas		108.50		108.50					2014	
3	1319	035-2012-MTC/20	430	21.68		21.68						may-12
		Churcampa - Mayocc		21.68		21.68					2014	
4	0964	049-2013-MTC/20	408	89.08	30.60							abr-13
		Bambas - Dv. Sihuas		58.48			58.48				2015	
5		Pallasca - Mollepata		30.60	30.60		30.60				2015	
5	0318	057-2010-MTC/20	458	14.39								abr-10
		Pizana _ Perlamayo		14.39		14.39					2014	
6	1379	066-2013-MTC/20	343	347.83								jul-13
		Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)		347.83			347.83				2015	
7	0312	068-2010-MTC/20	343	22.29								mar-10
		Huancavelica-Ticrapo		22.29		22.29					2014	
8	1358	069-2012-MTC/20	610	501.93		315.57						ago-12
		Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor		122.52	122.52	122.52					2014	
		Huancabamba - Canchaque		67.28		67.28					2014	
		Huancabamba - Emp. PE-3N (Socchobamba)		186.36	186.36		186.36				2015	
		Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto		110.52	16.36	110.52					2014	
		San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)		15.25		15.25					2014	
9	0853	070-2012-MTC/20	372	286.43		286.43						ago-12
		Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca		120.77		120.77					2014	
		Querobamba - Huacaza - Puquio		165.67		165.67					2014	
10	1380	070-2013-MTC/20	378	299.75								jul-13
		Emp. PE-5N (El Reposo) - Durbn-Puente Wawico - Puente Nieva-Saramiriza y Puente Wawico - Urakusa - Santa Marla de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmi)		299.75			299.75				2015	
11	0854	071-2012-MTC/20	526	300.42		300.42						ago-12
		EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa		46.76		46.76					2014	
		Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa		161.01		161.01					2014	
		Sifuentes - El Convento - EMP. 1S (Chala)		92.65		92.65					2014	
12	0320	094-2010-MTC/20	526	26.82		26.82						abr-10
		Km 120-Punta de Carretera		15.26		15.26					2014	
		Molinopampa-Rodriguez de Mendoza		8.35		8.35					2014	
		Rodriguez de Mendoza - Km 120		3.20		3.20					2014	
SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADA			5,271	2,173	372	1,250	923	-	-	-		

Anexo 5: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN CNS A MARZO 2014

N	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1378	CP-35-2012-MTC/20	321	295.79				295.79				
		Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		295.79				295.79			jun-16	ago-14
			321	296	-	-	-	296	-	-		

Anexo 6.1: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN A MARZO 2014

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A MAR 2014
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Empalme PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	384	383.72								120-2012-MTC/20	dic-12	72%
			Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panao û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B -Rlo Codo-Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		383.72				383.72			2016			
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26.12								014-2013-MTC/20	ene-13	95%
			Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26.12			26.12				2015			
3	1366	1561	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136.56								022-2013-MTC/20	ene-13	72%
			Capazo- Mazocruz		54.62			54.62				2015			
			Tarata - Capazo		81.95			81.95				2016			
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160.29								024-2013-MTC/20	feb-13	62%
			Andahuaylas (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A)		160.29			160.29				2016			
				1,324	707		-	81	626	-	-				

F20140512

SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR	1,645	1,002	-	-	81	922	-	-	Km
--------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----------

TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA	6,575	3,176	372	1,250	1,004	922	-	-	Km
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	----------	----------	-----------

Anexo 6.2: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCIÓN A MARZO 2014

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A MAR 2014
5	1363	1619	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	250	215.28								078-2013-MTC/20	ago-13	32%
			Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuahuacho		215.28					215.28		2017			
6	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188.63								096-2013-MTC/20	oct-13	58%
			Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188.63					188.63		2017			
7	1304	1644	Emp. PE 3N (laguna Sausacocho)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Palla	597	562.96								107-2013-MTC/20	oct-13	32%
			Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232.86					232.86		2017			
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		330.09					330.09		2017			
8	1663	1665	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	37.42								138-2013-MTC/20	dic-13	3%
			Pausa - Maran		37.42					37.42		2017			
9	1654	0315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia-y dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149.48								036-2014-MTC/20	mar-14	0%
			Dv. Huancane - Putina		1.42					1.42		2017			
			Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61.50					61.50		2017			
			Quiquirá - San Ignacio		86.56					86.56		2017			
10	1657	0313	Emp PE-3S - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	61.97								037-2014-MTC/20	mar-14	0%
			DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. Carretera		61.97					61.97		2017			
11	1704	1703	Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	140.54								029-2014-MTC/20	feb-14	0%
			Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140.54					140.54		2017			
				2,538	1,356		-	-	-	1,356		-			

(*) Las obras de solución básica culminarían después de Julio 2016

Anexo 7: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO PARA CONTRATAR A MARZO 2014

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA
12	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon - Emp.PE-18A (Tingo María)	536	358.90							
			Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		358.90						358.90	2018
13	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18 (214 Km)	214	189.52							
			Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189.52						189.52	2018
				750	548		-	-	-	-	548	

TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA	10,204	5,080	372	1,250	1,004	922	1,356	548	Km
--	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------
