



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

## **PROGRAMA DE GESTIÓN**

**PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL  
PROYECCIONES AGO 2014 - JUL 2016 Y A DIC 2018**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**

## RED VIAL NACIONAL

KILÓMETROS


F20140918

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	JUL 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
<b>Pavimentado</b>	12.358	16.187	17.503	18.863	20.145	21.835	22.607
Asfaltado	11.951	13.459	13.569	14.002	14.374	14.709	14.885
Solución básica	407	2.727	3.934	4.861	5.770	7.126	7.722
<b>No Pavimentado</b>	10.714	9.214	7.898	6.579	5.420	3.788	3.087
<b>RVN Existente</b>	23.072	25.400	25.400	25.442	25.564	25.623	25.694
<b>RVN Total</b>	25.530	27.155	27.155	27.155	27.155	27.155	27.155
<b>Pavimentado</b>	53,6%	63,7%	68,9%	74,1%	78,8%	85,2%	88,0%

PERIODOS	AGO 2011 - JUL 2014	2014 Ago-Dic	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
<b>Pavimentado</b>	3.829	1.316	1.361	1.281	1.691	772
Asfaltado	1.509	109	433	372	335	176
Solución básica	2.320	1.207	927	909	1.356	596
<b>Rehabilitación</b>	419	21	477	249	310	527
<b>Rehabilitación y Mej.</b>	1.927	130	910	622	645	703

Fuente: PVN-OPEI (20130201). Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF

Nota: En este caso la Rehabilitación y Mejoramiento corresponde a intervenciones en Asfaltado



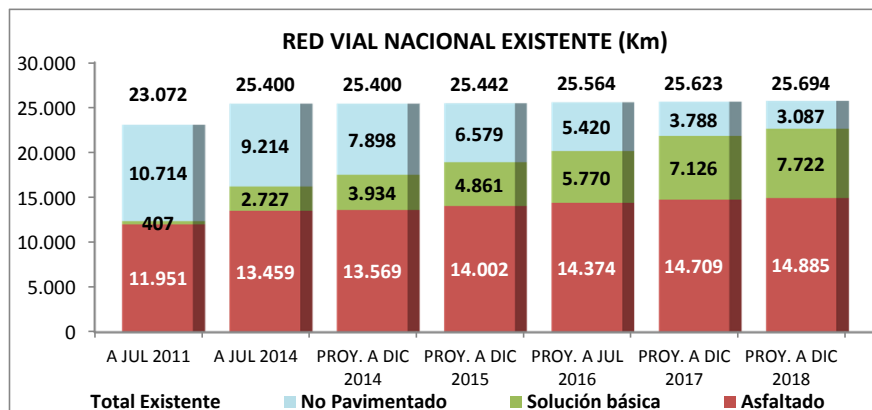


## LONGITUDINAL DE LA SIERRA

KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	JUL 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
<b>Pavimentado</b>	1.999	2.705	2.946	3.318	3.318	3.358	3.424
Asfaltado	1.854	2.202	2.288	2.438	2.438	2.479	2.544
Solución básica	145	503	658	879	879	879	879
<b>No Pavimentado</b>	1.306	798	558	186	186	145	80
<b>LS Existente</b>	3.305	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
<b>LS Total</b>	3.463	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
<b>Pavimentado</b>	60,5%	77,2%	84,1%	94,7%	94,7%	95,9%	97,7%

PERIODOS	AGO 2011 - JUL 2014	2014 Ago-Dic	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
<b>Pavimentado</b>	-	707	240	372	41	66
Asfaltado	-	349	85	151	0	41
Solución básica	-	358	155	221	-	-
<b>Rehabilitación</b>	-	16	-	-	-	-
<b>Rehabilitación y Mej.</b>	-	365	85	151	41	66

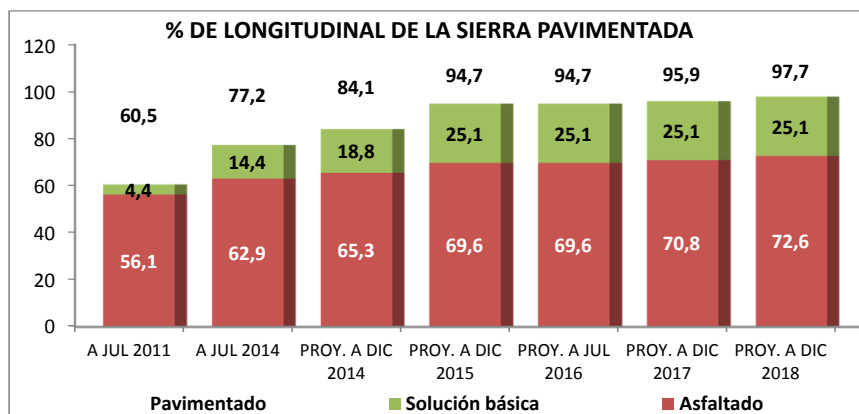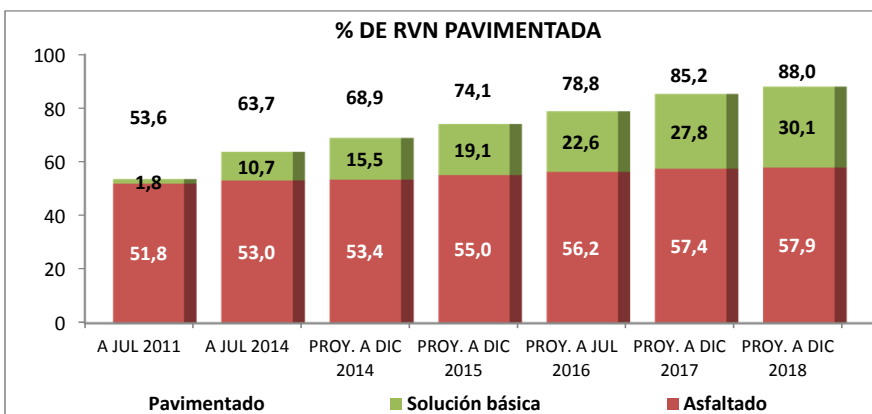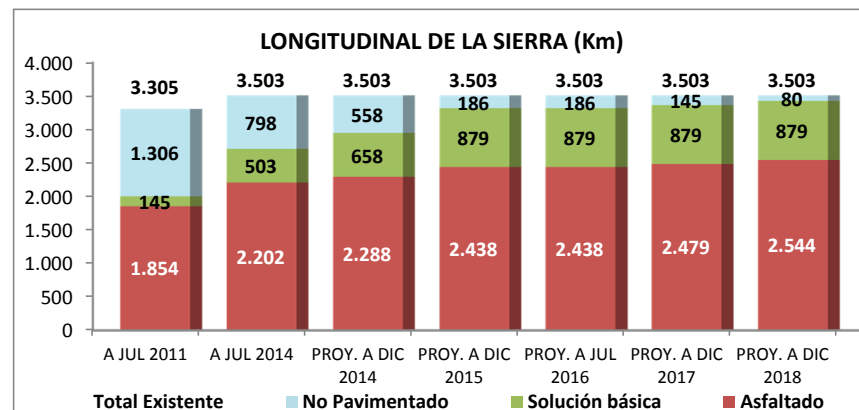

## Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A JULIO 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS <sup>1</sup>	FIN CONTRAC TUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A JUL 2014	COSTO OBRA S/.
			<b>2002210 Rehabilitación y mejoram. carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis</b>															
1		0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54,58	52,14			52,14				ene-13	may-15	sep-14	126-2012-MTC/20	57%	189.320.643
			<b>2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache</b>															
2		0221	Tr. Juanjui - Campanilla	2794	43,28	42,54			42,54				abr-13	mar-15	nov-14	090-2012-MTC/20	80%	183.946.638
			<b>2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco</b>															
3		0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94,59	94,45			94,45				abr-12	jul-15	jul-15	081-2011-MTC/20	52%	513.384.047
			<b>2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar</b>															
4		0769	Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	28,33	18,83			18,83				abr-13	feb-15	sep-14	003-2013-MTC/20	52%	81.944.103
			<b>2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay</b>															
5		0837	Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000	13558	55,20	54,18	54,18	54,18					jul-12	ago-14	jun-14	049-2012-MTC/20	99,9%	224.904.252
6		0885	Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto /a	13558	76,45	76,45	71,18		76,45				ene-13	sep-15	may-15	118-2012-MTC/20	89%	473.359.210
			<b>2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish</b>															
7		0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000	3271	79,47	24,47			24,47				may-12	feb-15	ene-15	032-2012-MTC/20	67%	359.634.583
8	0071	0923	Tr. Canta - Hualay	3271	96,11	82,89					82,89		ago-14	ago-17	jul-12	057-2014-MTC/20	0%	453.150.000
			<b>2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca</b>															
9		0146	Tr. Cochabamba - Chota	10447	31,86	31,04	31,04	31,04					dic-11	sep-14	jul-14	080-2011-MTC/20	91%	287.844.018
10		0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58,86	51,67	51,67		51,67				may-12	jul-15	jul-15	021-2012-MTC/20	38%	274.950.282
			<b>2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna</b>															
11		0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94,46	94,10				94,10			may-13	may-16	nov-15	048-2013-MTC/20	70%	574.284.291
			<b>2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa</b>															
12		0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65,82	44,85				44,85			may-13	feb-16	ago-15	051-2013-MTC/20	31%	305.013.261
			<b>2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín</b>															
13		0671	Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99,28	54,65				54,65			abr-13	abr-16	oct-15	036-2013-MTC/20	33%	539.270.774
			<b>2089761 Rehabilitación y mejoram. carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta</b>															
14	0161	0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27,95	27,88	27,88		27,88				oct-13	jul-15	oct-14	055-2013-MTC/20	23%	120.647.375
			<b>2134846 Rehabilitación y mejoram. carretera Emp. R01N Río Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán</b>															
15		1053	Tr. Emp. PE-1N (Ov. Río Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)	34473	42,60	23,93			23,93				mar-13	ago-14	may-14	102-2012-MTC/20	99%	68.547.039
			<b>2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo</b>															
16		1048	Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	116092	67,73	67,63				67,63			abr-13	ene-16	may-15	046-2013-MTC/20	24%	212.119.675
			<b>2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana</b>															
17		0503	Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37,44								ene-14	mar-16	jul-15	126-2013-MTC/20	14%	116.930.853
			<b>2043324 Culminación construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100</b>															
18		0655	Tr. Pimentel - Chiclayo (autopista)	10699	3,15								ene-14	abr-15	jul-14	141-2013-MTC/20	38%	17.139.636
			<b>2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha</b>															
19	0518	1001	Tr. San Marcos - Cajabamba	11432	58,80								sep-13	dic-15	ago-15	075-2013-MTC/20	40%	284.662.570
			<b>2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo</b>															
20		0100	Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo (2da Calzada)	128445	10,20								abr-14	jun-15	jun-15	008-2013-MTC/20	2%	127.124.273
			<b>2188747 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. II: Km. 557+000 al 886+600</b>															
21		1714	Tr. II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600) **	279073	329,60								may-14	oct-15	jun-15	Acuerdo Arbitral	5%	248.310.092
			<b>2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa</b>															
22	0081	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytía (sectores dañados)	2434	25,00	0,52				0,52			ago-14	abr-16	ene-16	063-2014-MTC/20		155.126.819
			<b>OBRAS VIALES CONTRATADAS</b>		<b>1.481</b>	<b>842</b>	<b>236</b>	<b>109</b>	<b>388</b>	<b>262</b>	<b>83</b>	<b>-</b>						<b>5.811.614.435</b>

1/ Plazos estimados por regresión lineal en función de tiempos históricos de obras terminadas al 2012 - OPEI. (\*) Referencia de Convenio (\*\*) Rehabilitación en RVN Concesionada a/ Los 57.4 Km de la ruta PE-3S, que no será asfaltada, será reclasificada por la variante Dv. Kishuara - Huancarama - Alfapata de la ruta PE-3SE que será asfaltada por ser de mayor transitabilidad.

F20140918

## ANEXO 2: OBRAS DE ASFALTADO EN CONTRATOS DE CONCESIÓN A JULIO 2014

Nº	PFIS CON	CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FECHA INICIO	FIN OBRA PFIS <sup>2</sup>	CONTRATISTA
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	41,110	41,11			41,11				ene-15	oct-15	COVIPERU
		<b>OBRAS VIALES CONCESIONADAS</b>	<b>41</b>	<b>41</b>			<b>-</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
		<b>OBRAS VIALES CONTRATADAS</b>	<b>1.522</b>	<b>883</b>	<b>236</b>	<b>109</b>	<b>430</b>	<b>262</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>Km</b>		<b>5.811.614.435</b>

2/ Estimado por PFísica

**Anexo 3.1: EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO A JULIO 2014**

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS <sup>1/</sup>	FIN OBRA PFIS <sup>2/</sup>	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A JUL 2014	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
			<b>2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042 ) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún</b>															
1	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4,04	3,96			3,96				oct-14	nov-15	ago-13	138-2010-MTC/20	100%	8.971.000
			<b>2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas</b>															
2	1050	1591	Tr. Imperial - Pampas	73078	37,49	37,49			37,49				nov-14	jul-16	dic-13	018-2012-MTC/20*	100%	202.670.000
			<b>2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito</b>															
3	0193	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito	108035	15,30	15,30			15,30				oct-14	jun-16	abr-14	166-2010-MTC/20	100%	43.724.442
			<b>2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro</b>															
4	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57,00	1,75			1,75				nov-14	jul-16	jul-14	072-2011-MTC/20	100%	231.062.508
5	0516	0996	Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro	3373	55,00								ene-15	jul-17	abr-14	065-2011-MTC/20	100%	225.500.000
6	0517	1562	Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro	3373	62,90								ene-15	ago-17	sep-14	068-2011-MTC/20	90%	257.890.000
			<b>2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo</b>															
7	1042	1559	Tr. Andahuaylas – Huancabamba	5080	20,00	20,00			20,00				oct-14	jun-16	jun-14	001-2013-MTC/20	100%	50.800.000
			<b>2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp, PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp, PE-5N La Calzada</b>															
8	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27,40	29,27			29,27				mar-15	nov-16	mar-14	066-2010-MTC/20	100%	123.300.000
			<b>2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna</b>															
9	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón	3272	51,30	1,82			1,82				ago-14	jul-16	feb-14	GRAQP-GRMOQ-SP*	100%	450.849.247
			<b>2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín</b>															
10	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churín	34470	5,14	4,85			4,85				mar-15	jul-16	nov-14	196-2008-MTC/01*	90%	21.536.600
			<b>2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao</b>															
11	1883	1746	Tr. Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)	48115	3,00								ene-15	mar-16	dic-14	043-2014-MTC/20	20%	779.801.260
			<b>2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay</b>															
12	1116	1556	Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55	73004	1,55								abr-15	sep-16	dic-13	013-2012-MTC/20*	100%	10.075.000
13	1117	1557	Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay	73004	75,45								nov-14	jul-17	dic-13	017-2012-MTC/20*	100%	377.250.000
			<b>2057739 Rehabilitación y mejoramiento carretera Ica - Los Molinos - Tambillos</b>															
14	0910	1552	Tr. Molinos - Tambillo	6804	13,80								abr-15	dic-16	ene-15	045-2013-MTC/20	70%	55.200.000
			<b>2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani</b>															
15	0155	0963	Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56,20	40,60	40,60			40,60			mar-15	mar-17	dic-14	025-2012-MTC/20	80%	202.567.129
			<b>2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp. Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta Pe-5N La Calzada</b>															
16	0511	0432	Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro	3876	86,00	69,33			69,33				jun-15	oct-17	dic-14	180-2010-MTC/20	70%	180.600.000
			<b>2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote</b>															
17	0016	0937	Vía Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34,66	34,66			34,66				jul-15	feb-17	ene-12	209-2008-MTC/20	100%	121.310.000
			<b>2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay</b>															
18	1344	1568	Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	108630	9,50								oct-15	abr-17	oct-15	013-2014-MTC/20	40%	38.382.906
			<b>2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía</b>															
19	1340	1592	Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía	8669	36,30	23,67			23,67				nov-15	jul-17	jul-15	001-2014-MTC/20	35%	181.500.000
			<b>2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri</b>															
20	1578	1579	Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri	142861	73,90	73,39			73,39				jul-15	nov-17	oct-14	027-2012-MTC/20	80%	369.500.000
			<b>2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez</b>															
21	1128	1566	Tr. Villa Rica-Pto. Bermudez	3368	110,88	73,18			73,18				feb-16	dic-18	dic-15	028-2014-MTC/20	10%	554.400.000
			<b>2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo</b>															
22	1596	1597	Tr. Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)	93142	75,50	36,71			36,71				feb-16	jun-18	jun-15	004-2008-MTC/20*	10%	377.500.000
			<b>2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho</b>															
23	0519	1563	Tr. Cajabamba - Sausacocho	11432	38,95								ene-15	mar-17	nov-14	067-2011-MTC/20	80%	194.750.000
			<b>2173121 Longitudinal Sierra Norte, Tr. Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple</b>															
24	1059	1604	Tr. Chota - Cutervo - Chiple	103730	91,40								ago-16	nov-18	oct-13	025-2010-MTC/20*	100%	548.400.000
<b>O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO</b>					<b>1.043</b>	<b>466</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>110</b>	<b>242</b>	<b>110</b>						<b>5.607.540.092</b>

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio Definitivo. 2/ Plazo estimado por OPEI. (\*) Convenio

**Anexo 3.2: EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR A JULIO 2014**

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS <sup>1</sup>	FIN OBRA PFIS <sup>2</sup>	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A JUL 2014	COSTO OBRA S/.(V. REF.)
			<b>2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa</b>															
25	0090	1547	Tr. Aguaytia - San Alejandro(Sectores Críticos)	2434	10,00								jun-16	dic-17	feb-16	Por contratar		35.000.000
			<b>2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani</b>															
26	0419	0241	Tr. Colpahuayco - Langui	3876	10,00	10,00					10,00		mar-16	oct-17	nov-15	Por contratar		21.000.000
			<b>2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui</b>															
27	0137	1701	Tr. Juan Guerra - Puerto Lopez	13860	48,00	0,32						0,32	ene-16	abr-18	jun-15	Por contratar		240.000.000
			<b>2158699 Rehabilitación de la carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - Dv. Pampas</b>															
28	1072	1567	Tr. II Pucara - Pazos y Tr. III Pazos - Dv. Pampas	198686	26,90								oct-16	may-18	jun-16	Por contratar		134.500.000
			<b>2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz</b>															
29	1602	1603	Tr. Huallanca - Caraz	101490	37,00								ago-16	jul-18	abr-16	Por contratar		185.000.000
			<b>2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca</b>															
30	1122	1595	Autopista Juliaca - Puno	92806	48,45								may-16	ago-18	ene-16	Por contratar		242.250.000
			<b>2233819 Mejoramiento de la carretera Balzas - Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza</b>															
31	1588	1589	Tr. Tingo-Dv. Ingenio y Chachapoyas-Molinopampa	25096	63,74								may-16	sep-18	ene-16	Por contratar		350.570.000
			<b>2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo</b>															
32	0510	0976	Tr. Tarata - Capazo	108281	83,90								feb-16	oct-18	nov-15	Por contratar**		335.600.000
			<b>2056359 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancavelca Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores</b>															
33	0662	1550	Tr. Santa Ines-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano	66742	51,60								sep-16	nov-18	jul-16	Por contratar		309.600.000
			<b>2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca</b>															
34	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65,64	65,64	65,64					65,64	ago-16	dic-18	abr-16	Por contratar		295.380.000
			<b>O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR</b>		<b>445</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	-	-	-	<b>10</b>	<b>66</b>						<b>2.148.900.000</b>

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio de Factibilidad. 2/ Plazo estimado por OPEI. (\*) Convenio (\*\*) Contrato resuelto, se convocará otra vez

<b>OBRAS VIALES POR CONTRATAR</b>	<b>1.488</b>	<b>542</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>110</b>	<b>252</b>	<b>176</b>	<b>Km</b>		<b>7.756.440.092</b>
<b>TOTAL OBRAS VIALES</b>	<b>3.010</b>	<b>1.425</b>	<b>342</b>	<b>109</b>	<b>433</b>	<b>372</b>	<b>335</b>	<b>176</b>	<b>Km</b>		<b>13.568.054.527</b>
<b>TOTAL REHABILITACIÓN</b>	<b>1.584</b>			<b>21</b>	<b>477</b>	<b>249</b>	<b>310</b>	<b>527</b>	<b>Km</b>		
<b>TOTAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ASFALTADO</b>	<b>3.010</b>			<b>130</b>	<b>910</b>	<b>622</b>	<b>645</b>	<b>703</b>	<b>Km</b>		

**NOTA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA - LS**

Para pavimentar el 100% de la LS antes de Jul 2016, se requiere hacer Adendas a CCNS vigentes para pavimentar con solución básica en tramos donde las obras de PIPs culminarían después de Jul 2016

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS (Km)	INICIO OBRA	FIN OBRA <sup>1</sup>	Implementar ADENDA en CCNS
1	0904	0659	Tr. Chuquicara – Huallanca	3293	65,64	65,64	65,64	ago-16	dic-18	CCNS Nº 034-2012-MTC/20
2	0969	1593	Tr. Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata	86897	81,56	79,55	79,55	dic-16	ago-19	CCNS Nº 049-2013-MTC/20
3	0155	0963	Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56,20	40,60	40,60	mar-15	mar-17	CCNS Nº 049-2013-MTC/20
			<b>TOTAL</b>		<b>203,40</b>	<b>185,78</b>	<b>185,78</b>			

**Anexo 4: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADAS EN CNS A JULIO 2014**

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1365	<b>015-2013-MTC/20</b> Ayacucho ù Tambillo ù Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo ù Carapo -Huancasancos	341	134,52		134,52						ene-13
2	1336	<b>034-2012-MTC/20</b> Huallanca - Molinopampa Puente Huarochiri - Sihuas	536	124,58	16,07	124,58	16,07					may-12
3	1319	<b>035-2012-MTC/20</b> Churcampa - Mayocc	430	21,68		21,68						may-12
4	0964	<b>049-2013-MTC/20</b> Bambas - Dv. Sihuas Pallasca - Mollepata Santiago de Chuco – Shorey	408	93,34	34,86		93,34					abr-13
5	0318	<b>057-2010-MTC/20</b> Pizana _Perlamayo	458	14,39		14,39						abr-10
6	1379	<b>066-2013-MTC/20</b> Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)	343	347,83		347,83						jul-13
7	0312	<b>068-2010-MTC/20</b> Huancavelica-Ticrapo	343	22,29		22,29						mar-10
8	1358	<b>069-2012-MTC/20</b> Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor Huancabamba - Canchaque Huancabamba - Emp. PE-3N (Socchobamba) Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)	610	501,93	325,24	315,57	186,36					ago-12
9	0853	<b>070-2012-MTC/20</b> Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca Querobamba - Huacata - Puquio	372	246,43		246,43						ago-12
10	1380	<b>070-2013-MTC/20</b> Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-Saramiriza y Puente Wawico - Urakusa - Santa Marla de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmi)	378	299,75		299,75						jul-13
11	0854	<b>071-2012-MTC/20</b> EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa Sifuentes - El Convento - EMP. 1S (Chala)	526	300,42		300,42						ago-12
12	0320	<b>094-2010-MTC/20</b> Km 120-Punta de Carretera Molinopampa-Rodriguez de Mendoza Rodriguez de Mendoza - Km 120	526	26,82		26,82						abr-10
<b>SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADA</b>			<b>5.271</b>	<b>2.134</b>	<b>376</b>	<b>1.207</b>	<b>927</b>	-	-	-		

**Anexo 5: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN CNS A JULIO 2014**

N	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1378	CP-35-2012-MTC/20	321	287,99				287,99				
		Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		287,99				287,99			2016	
<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR SIN PCNS</b>			<b>321</b>	<b>288</b>	-	-	-	<b>288</b>	-	-		

**Anexo 6.1: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO AVANZADOS EN EJECUCIÓN A JULIO 2014**

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A JUL 2014
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panoa - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	332	298,11				298,11				120-2012-MTC/20	dic-12	95%
			Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panoa û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B -Rio Codo-Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		298,11				298,11			2016			
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26,12				26,12				014-2013-MTC/20	ene-13	95%
			Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26,12				26,12			2016			
3	1366	1561	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136,56				136,56				022-2013-MTC/20	ene-13	75%
			Capazo- Mazocruz		54,62				54,62			2016			
			Tarata - Capazo		81,95				81,95			2016			
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160,29				160,29				024-2013-MTC/20	feb-13	75%
			Andahuaylas (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A)		160,29				160,29			2016			

<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS</b>			<b>1.272</b>	<b>621</b>		-	-	<b>621</b>	-	-					
---	--	--	--------------	------------	--	---	---	------------	---	---	--	--	--	--	--

F20140918

<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR AVANZADOS</b>			<b>1.593</b>	<b>909</b>	-	-	-	<b>909</b>	-	-	<b>Km</b>				
--	--	--	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	-----------	--	--	--	--

<b>TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA A JUL 2016</b>			<b>6.523</b>	<b>3.043</b>	<b>376</b>	<b>1.207</b>	<b>927</b>	<b>909</b>	-	-	<b>Km</b>				
---	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	---	---	-----------	--	--	--	--

**Anexo 6.2: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO INICIADOS EN EJECUCIÓN A JULIO 2014**

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A JUL 2014
5	1363	1619	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhahuacho	250	215,28								078-2013-MTC/20	ago-13	72%
			Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuhahuacho		215,28					215,28		2017			
6	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188,63								096-2013-MTC/20	oct-13	75%
			Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188,63					188,63		2017			
7	1304	1644	Emp. PE 3N (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Palla	597	562,78								107-2013-MTC/20	oct-13	70%
			Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232,86					232,86		2017			
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		329,92					329,92		2017			
8	1663	1665	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	37,42								138-2013-MTC/20	dic-13	70%
			Pausa - Maran		37,42					37,42		2017			
9	1654	0315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia-y dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149,48								036-2014-MTC/20	mar-14	23%
			Dv. Huancane - Putina		1,42					1,42		2017			
			Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61,50					61,50		2017			
			Quiquirá - San Ignacio		86,56					86,56		2017			
10	1657	0313	Emp PE-3S - La Quinoa - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	61,97								037-2014-MTC/20	mar-14	23%
			DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. Carretera		61,97					61,97		2017			
11	1704	1703	Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	140,54								029-2014-MTC/20	feb-14	23%
			Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140,54					140,54		2017			
12	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon - Emp.PE-18A (Tingo María)	536	406,29								055-2014-MTC/20	jun-14	
			Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		406,29					406,29		2018			
<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS INICIADOS</b>				<b>3.074</b>	<b>1.762</b>		-	-	-	<b>1.356</b>	<b>406</b>				

(\*) Las obras de solución básica culminarían después de Julio 2016

**Anexo 7: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO PARA CONTRATAR A JULIO 2014**

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA
13	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18 (214 Km)	214	189,52							
			Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189,52						189,52	2018
<b>SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS POR CONTRATAR</b>				<b>750</b>	<b>190</b>		-	-	-	-	<b>190</b>	
<b>TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA AL 2018</b>				<b>10.152</b>	<b>4.995</b>	<b>376</b>	<b>1.207</b>	<b>927</b>	<b>909</b>	<b>1.356</b>	<b>596</b>	<b>Km</b>
