



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

PROGRAMA DE GESTIÓN

PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL PROYECCIONES OCT 2014 - JUL 2016 Y A DIC 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO

RED VIAL NACIONAL

KILÓMETROS

F20141115

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	SET 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
Pavimentado	12,358	16,647	17,701	18,926	20,236	21,916	22,687
Asfaltado	11,951	13,606	13,679	14,070	14,440	14,775	14,950
Solución básica	407	3,041	4,022	4,856	5,796	7,141	7,736
No Pavimentado	10,714	8,977	7,922	6,739	5,541	3,920	3,220
RVN Existente	23,072	25,624	25,624	25,665	25,777	25,835	25,907
RVN Total	25,530	27,405	27,405	27,405	27,405	27,405	27,405
Pavimentado	53.6%	65.0%	69.1%	73.7%	78.5%	84.8%	87.6%

PERIODOS	AGO 2011 - SET 2014	2014 Oct -Dic	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
Pavimentado	4,289	1,055	1,225	1,310	1,680	771
Asfaltado	1,655	74	391	370	335	176
Solución básica	2,634	981	834	940	1,345	596
Rehabilitación	590	1	477	252	300	489
Rehabilitación y Mej.	2,245	74	868	622	635	665

Fuente: PVN-OPEI. Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF





Nota: En este caso, la Rehabilitación y Mej. corresponde a intervenciones en Asfaltado

LONGITUDINAL DE LA SIERRA

KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A				
	JUL 2011	SET 2014	DIC 2014	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2017	DIC 2018
Pavimentado	1,999	2,760	2,946	3,318	3,318	3,358	3,424
Asfaltado	1,854	2,256	2,288	2,438	2,438	2,479	2,544
Solución básica	145	503	658	879	879	879	879
No Pavimentado	1,306	744	558	186	186	145	80
LS Existente	3,305	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
LS Total	3,463	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
Pavimentado	60.5%	78.8%	84.1%	94.7%	94.7%	95.9%	97.7%

PERIODOS	AGO 2011 - SET 2014	2014 Oct -Dic	2015	2016 Ene-Jul	2017	2018
Pavimentado	-	761	186	372	41	66
Asfaltado	-	403	31	151	41	66
Solución básica	-	358	155	221	-	-
Rehabilitación	-	16	-	-	-	-
Rehabilitación y Mej.	-	419	31	151	41	66

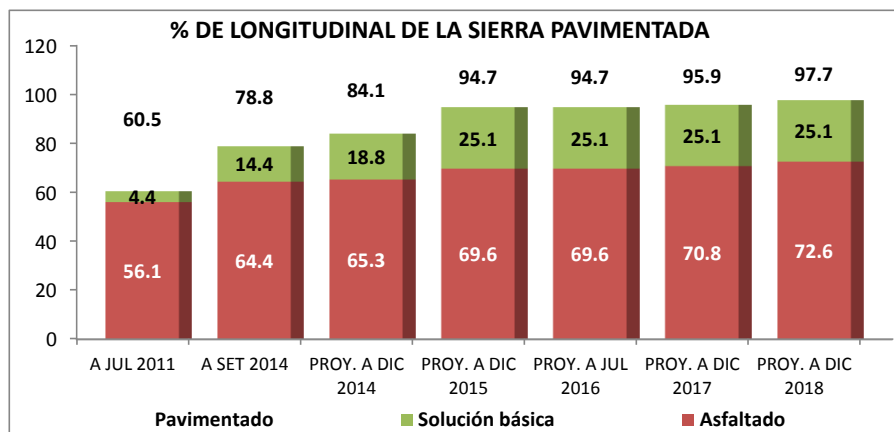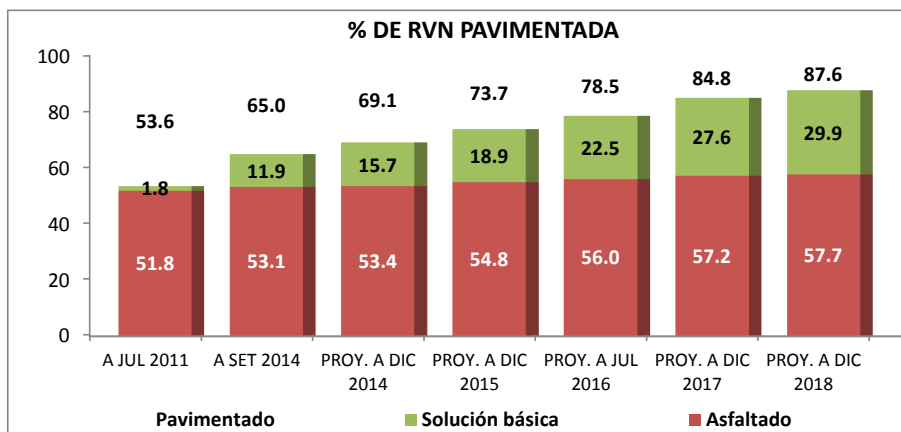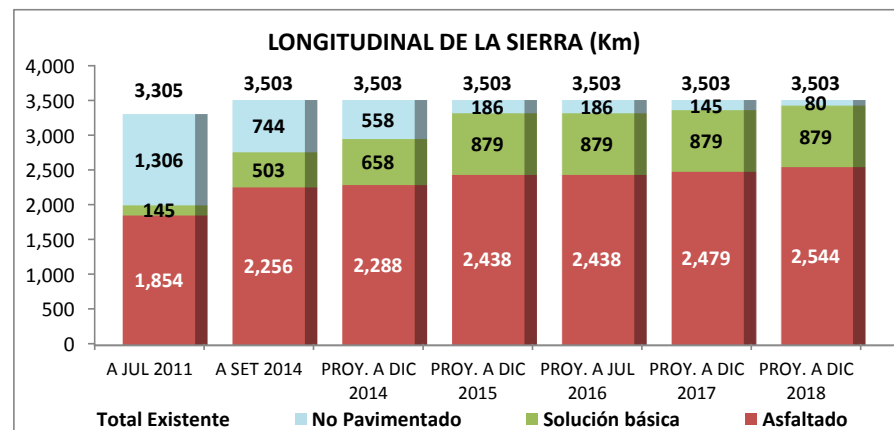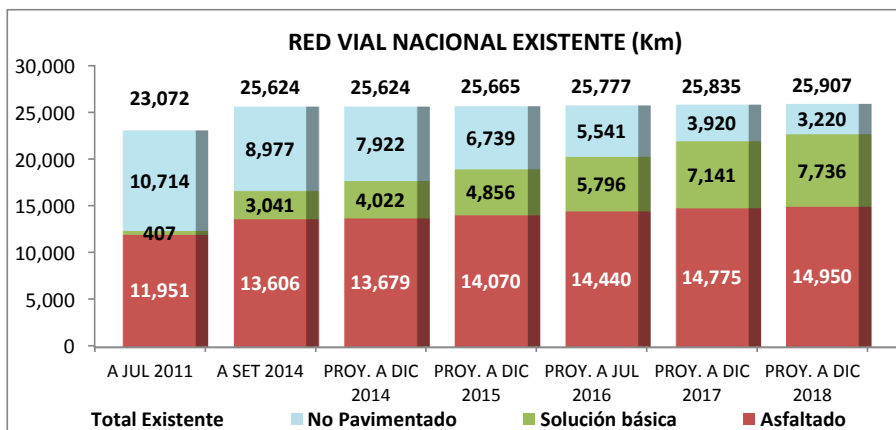

Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A SETIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS ^{1/}	FIN CONTRACTUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A SET 2014	COSTO OBRA S/.
1		0116	2002210 Rehabilitación y mejoram. carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14		52.14					ene-13	may-15	sep-14	126-2012-MTC/20	65%	189,320,643
2		0221	2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache Tr. Juanjui - Campanilla	2794	43.28	42.54		42.54					abr-13	mar-15	nov-14	090-2012-MTC/20	90%	183,946,638
3		0406	2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45		94.45					abr-12	jul-15	jul-15	081-2011-MTC/20	52%	513,384,047
4		0769	2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	15956	28.33	18.83		18.83					abr-13	feb-15	sep-14	003-2013-MTC/20	73%	81,944,103
5		0885	2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto /a	13558	76.45	76.45	71.18	76.45					ene-13	sep-15	may-15	118-2012-MTC/20	89%	473,359,210
6		0928	2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000	3271	79.47	24.47		24.47					may-12	feb-15	ene-15	032-2012-MTC/20	71%	359,634,583
7	0071	0923	2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca Tr. Canta - Huallay	3271	96.11	82.89				82.89			ago-14	ago-17	jul-12	057-2014-MTC/20		453,150,000
8		0146	2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tr. Cochabamba - Chota	10447	31.86	31.04	31.04	31.04					dic-11	dic-14	jul-14	080-2011-MTC/20	94%	287,844,018
9		0955	2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.86	51.67	51.67	51.67					may-12	jul-15	jul-15	021-2012-MTC/20	49%	274,950,282
10		0959	2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.46	94.50			94.50				may-13	may-16	nov-15	048-2013-MTC/20	75%	574,284,291
11		0967	2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85			44.85				may-13	feb-16	ago-15	051-2013-MTC/20	42%	305,013,261
12		0671	2089761 Rehabilitación y mejoram. carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99.28	54.40			54.40				abr-13	abr-16	oct-15	036-2013-MTC/20	44%	539,270,774
13	0161	0972	2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.95	27.88	27.88	27.88					oct-13	jul-15	oct-14	055-2013-MTC/20	29%	120,647,375
14		1048	2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	116092	67.73	67.63			67.63				abr-13	ene-16	may-15	046-2013-MTC/20	37%	212,119,675
15		0503	2043324 Culminación construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37.44								ene-14	mar-16	jul-15	126-2013-MTC/20	30%	116,930,853
16		0655	2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba-Sausacocha Tr. Pimentel - Chiclayo (autopista)	10699	3.15								ene-14	abr-15	jul-14	141-2013-MTC/20	48%	17,139,636
17	0518	1001	2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo Tr. San Marcos - Cajabamba	11432	58.80								sep-13	dic-15	ago-15	075-2013-MTC/20	52%	284,662,570
18		0100	2188747 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. II: Km. 557+000 al 886+600 Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo (2da Calzada)	128445	10.20								abr-14	jul-15	jun-15	008-2013-MTC/20	14%	127,124,273
19		1714	2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tr. II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600) **	279073	329.60								may-14	oct-15	jun-15	Acuerdo Arbitral	25%	248,310,092
20	0081	0088	2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito Tr. Pte. Chino - Aguaytia (sectores dañados)	2434	25.00	0.52			0.52				ago-14	abr-16	ene-16	063-2014-MTC/20	3%	169,095,118
21	0193	0989	2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	108035	15.30	15.30			15.30				oct-14	jun-16	abr-14	094-2014-MTC/20		19,845,109
OBRAS VIALES CONTRATADAS					1,398	780	182	74	346	277	83	-						5,551,976,551

1/ Plazos estimados por regresión lineal en función de tiempos históricos de obras terminadas al 2012 - OPEL. (*) Referencia de Convenio (**) Rehabilitación en RVN Concesionada

a/ Los 57.4 Km de la ruta PE-35, que no será asfaltada, será reclasificada por la variante Dv. Kishuara - Huancarama - Alfapata de la ruta PE-35E que será asfaltada por ser de mayor transitabilidad.

ANEXO 2: OBRAS DE ASFALTADO EN CONTRATOS DE CONCESIÓN A SETIEMBRE 2014

Nº	PFIS CON	CONCESIÓN	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FECHA INICIO	FIN OBRA PFIS ^{2/}	CONTRATISTA
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	41.110	41.11		41.11					ene-15	oct-15	COVIPERU
OBRAS VIALES CONCESIONADAS			41	41		-	41	-	-	-			
OBRAS VIALES CONTRATADAS			1,439	821	182	74	387	277	83	-	Km		5,551,976,551

2/ Estimado por PFísica

Anexo 3.1: EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO A SETIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A SET 2014	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
			2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún															
1	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96		3.96					oct-14	nov-15	ago-13	138-2010-MTC/20	100%	8,971,000
			2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas						37.49									
2	1050	1591	Tr. Imperial - Pampas	73078	38.00	37.49							nov-14	jul-16	dic-13	018-2012-MTC/20*	100%	202,670,000
			2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro															
3	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.00	1.75		1.75					nov-14	jul-16	jul-14	072-2011-MTC/20	100%	231,062,508
4	0516	0996	Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro	3373	55.00								ene-15	jul-17	abr-14	065-2011-MTC/20	100%	225,500,000
5	0517	1562	Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro	3373	62.90								ene-15	ago-17	nov-14	068-2011-MTC/20	90%	257,890,000
			2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo															
6	1042	1559	Tr. Andahuaylas - Huancabamba	5080	20.00	20.00			20.00				oct-14	jun-16	jun-14	001-2013-MTC/20	100%	50,800,000
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp, PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp, PE-5N La Calzada															
7	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.40	26.85			26.85				mar-15	nov-16	mar-14	066-2010-MTC/20	100%	123,300,000
			2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna															
8	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón	3272	51.30	1.82			1.82				ago-14	jul-16	feb-14	GRAQP-GRMOQ-SP*	100%	450,849,247
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin															
9	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churin	34470	5.14	5.10			5.10				mar-15	jul-16	nov-14	196-2008-MTC/01*	90%	21,536,600
			2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao															
10	1883	1746	Tr. Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)	48115	3.00								ene-15	mar-16	nov-14	043-2014-MTC/20	90%	779,801,260
			2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay															
11	1116	1556	Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55	73004	1.55								abr-15	sep-16	dic-13	013-2012-MTC/20*	100%	10,075,000
12	1117	1557	Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay	73004	75.45								nov-14	jul-17	dic-13	017-2012-MTC/20*	100%	377,250,000
			2057739 Rehabilitación y mejoramiento carretera Ica - Los Molinos - Tambillos															
13	0910	1552	Tr. Molinos - Tambillo	6804	13.80								abr-15	dic-16	ene-15	045-2013-MTC/20	80%	55,200,000
			2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani															
14	0155	0963	Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.60	40.60				40.60		mar-15	mar-17	dic-14	025-2012-MTC/20	80%	202,567,129
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp. Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta Pe-5N La Calzada															
15	0511	0432	Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro	3876	86.00	69.33				69.33			jun-15	oct-17	dic-14	180-2010-MTC/20	70%	180,600,000
			2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote															
16	0016	0937	Vía Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34.66	34.66				34.66			jul-15	feb-17	ene-12	209-2008-MTC/20	100%	121,310,000
			2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay															
17	1344	1568	Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	108630	9.50								feb-16	oct-17	oct-15	013-2014-MTC/20	40%	38,382,906
			2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangao - Cubantía															
18	1340	1592	Tr. Mazamari - Pangao - Cubantía	8669	36.30	23.67				23.67			nov-15	jul-17	jul-15	001-2014-MTC/20	35%	181,500,000
			2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri															
19	1578	1579	Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri	142861	73.90	73.39				73.39			jul-15	nov-17	oct-14	027-2012-MTC/20	95%	369,500,000
			2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez															
20	1128	1566	Tr. Villa Rica-Pto. Bermudez	3368	110.88	73.18					73.18		feb-16	dic-18	jun-15	028-2014-MTC/20	45%	554,400,000
			2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo															
21	1596	1597	Tr. Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)	93142	75.50	36.71					36.71		feb-16	jun-18	jun-15	004-2008-MTC/20*	60%	377,500,000
			2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho															
22	0519	1563	Tr. Cajabamba - Sausacocho	11432	38.95								ene-15	abr-17	dic-14	067-2011-MTC/20	80%	194,750,000
			2173121 Longitudinal Sierra Norte, Tr. Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple															
23	1059	1604	Tr. Chota - Cutervo - Chiple	103730	91.40								ago-16	nov-18	oct-13	025-2010-MTC/20*	100%	548,400,000
O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO					1,028	449	41	-	4	93	242	110						5,563,815,650

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio Definitivo. 2/ Plazo estimado por OPEI. (*) Convenio

Anexo 3.2: EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR A SETIEMBRE 2014

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A SET 2014	COSTO OBRA S/. (V. REF.)
25	0090	1547	2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tr. Aguaytia - San Alejandro(Sectores Criticos)	2434	10.00								sep-16	may-18	may-16	Por contratar		35,000,000
26	0419	0241	2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tr. Colpahuayco - Langui	3876	10.00	10.00				10.00			mar-16	nov-17	nov-15	Por contratar		21,000,000
27	1072	1567	2158699 Rehabilitación de la carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - Dv. Pampas 2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz	198686	26.90								oct-16	sep-18	jun-16	Por contratar		134,500,000
28	1602	1603	Tr. Huallanca - Caraz 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca	101490	37.00								ago-16	ago-18	abr-16	Por contratar		185,000,000
29	1122	1595	Autopista Juliaca - Puno 2233819 Mejoramiento de la carretera Balzas - Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza	92806	48.45								may-16	sep-18	ene-16	Por contratar		242,250,000
30	1588	1589	Tr. Tingo-Dv. Ingenio y Chachapoyas-Molinopampa 2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo	25096	63.74								may-16	sep-18	ene-16	Por contratar		350,570,000
31	0510	0976	Tr. Tarata - Capazo 2056359 Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores	108281	83.90								mar-16	nov-18	nov-15	Por contratar**		335,600,000
32	0662	1550	Tr. Santa Ines-Castrovirreyrna-Ticrapo-Pampano 2055842 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca	66742	51.60								nov-16	dic-18	jul-16	Por contratar		309,600,000
33	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64					65.64	ago-16	dic-18	abr-16	Por contratar		295,380,000
O.V. POR CONTRATAR - EN ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATAR					397	76	66	-	-	-	10	66						1,908,900,000

1/ Estimado por OPEI en función a culminación de estudio de Factibilidad. 2/ Plazo estimado por OPEI. (*) Convenio (**) Contrato resuelto, se convocará otra vez

OBRAS VIALES POR CONTRATAR	1,425	524	106	-	4	93	252	176	176	Km	7,472,715,650
TOTAL OBRAS VIALES	2,864	1,345	288	74	391	370	335	176	176	Km	13,024,692,201
TOTAL REHABILITACIÓN	1,520			1	477	252	300	489		Km	
TOTAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ASFALTADO	2,864			74	868	622	635	665		Km	

NOTA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA - LS

Para pavimentar el 100% de la LS antes de Jul 2016, se requiere hacer Adendas a CCNS vigentes para pavimentar con solución básica en tramos donde las obras de PIPs culminarían después de Jul 2016

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	MEJ. (Km)	LS (Km)	INICIO OBRA	FIN OBRA ¹	Implementar ADENDA en CCNS
1	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64	ago-16	dic-18	CCNS Nº 034-2012-MTC/20
2	0969	1593	Tr. Santiago de Chuco-Cachicadan-Mollepata	86897	81.55	79.55	79.55	dic-16	ago-19	CCNS Nº 049-2013-MTC/20
3	0155	0963	Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.60	40.60	mar-15	mar-17	CCNS Nº 049-2013-MTC/20
TOTAL					203.39	185.78	185.78			

Anexo 4: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADAS EN CNS A SETIEMBRE 2014

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORREDOR (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1365	015-2013-MTC/20 Emp. PE35 (Ayacucho) Emp. PE-35(Ocros) y Dv. Carapo - Pomabamba	341	6.33		6.33						ene-13
2	1336	034-2012-MTC/20 Huallanca - Molinopampa Puente Huarochiri - Sihuas	536	124.58	16.07	124.58						may-12
3	1319	035-2012-MTC/20 Churcampa - Mayocc	430	18.62		18.62						may-12
4	0964	049-2013-MTC/20 Bambas - Dv. Sihuas Pallasca - Mollepata Santiago de Chuco - Shorey	408	93.34	34.86		93.34					abr-13
5	0318	057-2010-MTC/20 Pizana - Perlamayo	458	14.39		14.39						abr-10
6	1379	066-2013-MTC/20 Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay) Huancavelica - Lircay Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa)	343	254.30		254.30						jul-13
7	0312	068-2010-MTC/20 Santa Ines-Pampano	343	22.29		22.29						mar-10
8	1358	069-2012-MTC/20 Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor Huancabamba - Canchaque Huancabamba - Emp. PE-3N (Socchobamba) Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)	610	501.93	325.24	315.57	186.36					ago-12
9	0853	070-2012-MTC/20 Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca Querobamba - Huacata - Puquio Abra Tocto - Huancapi	372	244.59		244.59	0.00					ago-12
10	1380	070-2013-MTC/20 Puente Wawico - Seasmi Seasmi - Saramiriza Puente Wawico - Santa María de Nieva Durán-Puente Wawico Santa María de Nieva - Seasmi	378	299.75		299.75						jul-13
11	0854	071-2012-MTC/20 EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa	526	207.77		207.77						ago-12
12	0320	094-2010-MTC/20 Km 120-Punta de Carretera Molinopampa-Rodríguez de Mendoza Rodríguez de Mendoza - Km 120	526	26.82		26.82						abr-10
SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADA			5,271	1,815	376	981	834	-	-	-		

Anexo 5: OBRAS DE SOLUCIÓN BÁSICA PARA CONTRATAR EN CNS A SETIEMBRE 2014

N	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1378	CP-35-2012-MTC/20	321	287.99				287.99				
		Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		287.99				287.99			2016	
SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR SIN PCNS			321	288	-	-	-	288	-	-		

Anexo 6.1: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO AVANZADOS EN EJECUCIÓN A SETIEMBRE 2014

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A SET 2014
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	332	328.88				328.88				120-2012-MTC/20	dic-12	95%
			Emp. PE-18A (Pte Rancho) û Panao û Chaglla û Pozuzo - Oxapampa y Empalme PE-18B -Rlo Codo- Codo del Pozuzo - Emp. PE-5N (Puerto Inca)		328.88				328.88			2016			
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26.12				26.12				014-2013-MTC/20	ene-13	95%
			Pucara - Pazos - Dv. Pampas		26.12				26.12			2016			
3	1366	1617	Dv. Humalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136.56				136.56				022-2013-MTC/20	ene-13	75%
			Capazo- Mazocruz		54.62				54.62			2016			
			Tarata - Capazo		81.95				81.95			2016			
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160.29				160.29				024-2013-MTC/20	feb-13	75%
			Andahuaylas (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A)		160.29				160.29			2016			
SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS				1,272	652		-	-	652	-	-				

F20141115

SOLUCIÓN BÁSICA A JUL 2016 POR CONTRATAR				1,593	940	-	-	-	940	-	-	Km
TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA A JUL 2016				6,523	2,755	376	981	834	940	-	-	Km

Anexo 6.2: EN PERFILES DE MEJ. POR NIVELES DE SERVICIO INICIADOS EN EJECUCIÓN A SETIEMBRE 2014

N	PFIS PCNS	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	LONGITUD (Km)	MEJ. (Km)	LS MEJ. (Km)	MEJ. (Km) 2014	MEJ. (Km) 2015	MEJ. (Km) 2016	MEJ. (Km) 2017	MEJ. (Km) 2018	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A SET 2014
5	1363	1619	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	250	215.28								078-2013-MTC/20	ago-13	72%
			Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuahuacho		215.28					215.28		2017			
6	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188.63								096-2013-MTC/20	oct-13	75%
			Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Cojata - Vilque - Emp. PE-12A (Coasia)		188.63					188.63		2017			
7	1304	1644	Emp. PE 3N (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Palla	597	562.78								107-2013-MTC/20	oct-13	70%
			Chagual - Tayabamba - Pte Huacrachuco		232.86					232.86		2017			
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Puente Calemar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el Ramal Puente Pallar - Calemar		329.92					329.92		2017			
8	1663	1665	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Culies- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	26.36								138-2013-MTC/20	dic-13	70%
			Pausa - Maran		26.36					26.36		2017			
9	1654	0315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia-y dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149.48								036-2014-MTC/20	mar-14	23%
			Dv. Huancane - Putina		1.42					1.42		2017			
			Huancane - Moho - Frontera Bolivia		61.50					61.50		2017			
			Quiquirá - San Ignacio		86.56					86.56		2017			
10	1657	0313	Emp PE-3S - La Quinoa - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	61.97								037-2014-MTC/20	mar-14	23%
			DV. Quillabamba - Puerto Ene - Pta. Carretera		61.97					61.97		2017			
11	1704	1703	Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	140.54								029-2014-MTC/20	feb-14	23%
			Cutervo - Socota - Santo Tomas - Pinpingo - Emp PE 5N (Irsa Norte)		140.54					140.54		2017			
12	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon - Emp.PE-18A (Tingo María)	536	406.29								055-2014-MTC/20	jun-14	
			Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba-Jircan-Monzon-EMP.PE-18A (Tingo María)		406.29						406.29	2018			
13	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18 (214 Km)	214	189.52								090-2014-MTC/20	sep-14	
			Emp. PE-1N - Pamplona - Cajatambo - Oyon - Emp. PE-18		189.52						189.52	2018			
SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR CON PCNS INICIADOS				3,288	1,941		-	-	-	1,345	596				

(*) Las obras de solución básica culminarían después de Julio 2016

TOTAL PAVIMENTADO SOLUCIÓN BÁSICA AL 2018	10,152	4,695	376	981	834	940	1,345	596	Km
--	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	-----------
