



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

PROGRAMA DE GESTIÓN

PAVIMENTADO DE LA RED VIAL NACIONAL PROYECCIONES ABRIL 2015 - JULIO 2016 Y AL 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO

RED VIAL NACIONAL KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A								
	JUL 2011	MAR 2015	JUL 2015	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2016	DIC 2017	DIC 2018	DIC 2019	DIC 2020	DIC 2021
Pavimentado	12,358	17,434	17,539	18,514	19,619	20,339	22,288	23,757	24,027	24,221	24,299
Asfaltado	11,951	13,795	13,836	13,892	14,204	14,456	14,685	14,862	15,131	15,324	15,402
Solución básica	407	3,639	3,703	4,623	5,414	5,883	7,603	8,896	8,897	8,897	8,897
No Pavimentado	10,714	8,314	8,251	7,275	6,312	5,591	3,677	2,370	2,137	1,943	1,878
RVN Existente	23,072	25,748	25,789	25,789	25,930	25,930	25,965	26,128	26,164	26,164	26,176
RVN Total	25,530	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590	27,590
RVN Pavimentado*	53.6%	75.6%	76.0%	80.2%	85.0%	88.2%	96.6%	103.0%	104.1%	105.0%	105.3%
RVN Pavimentado**	53.6%	67.7%	68.0%	71.8%	75.7%	78.4%	85.8%	90.9%	91.8%	92.6%	92.8%



(*) Sobre la RVN Existente a Jul 2011 (**) Sobre la RVN existente al periodo

PERIODOS	Ago 2011 - Mar 2015	2015 Abr-Jul	2015 Ago-Dic	2016 Ene-Jul	2016 Ago-Dic	2017	2018	2019	2020	2021
	Nuevo Pavimento	5,076	105	976	1,104	720	1,949	1,469	270	194
Asfaltado	1,844	41	56	313	252	229	177	269	194	77
Solución básica	3,232	64	920	792	469	1,720	1,292	1		
Rehabilitación pavimento	739	2	374	298	49	607	181	373	232	616
REHAB. Y MEJ. ASF.	2,582	43	430	611	301	837	358	642	426	693

Fuente: PVN-OPEI. Inventario Vial Básico 2010 MTC-DGCF

F20150605

Nota: Rehabilitación y Mejoramiento son intervenciones con solución definitiva (Asfaltado).

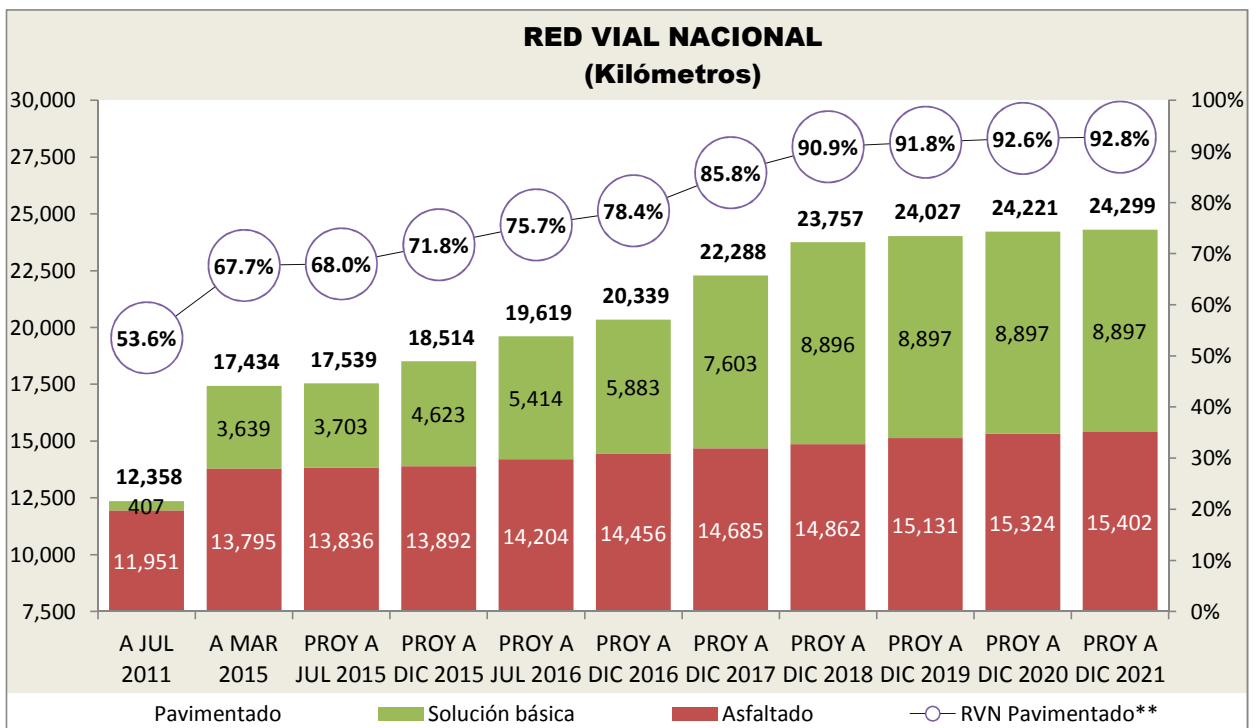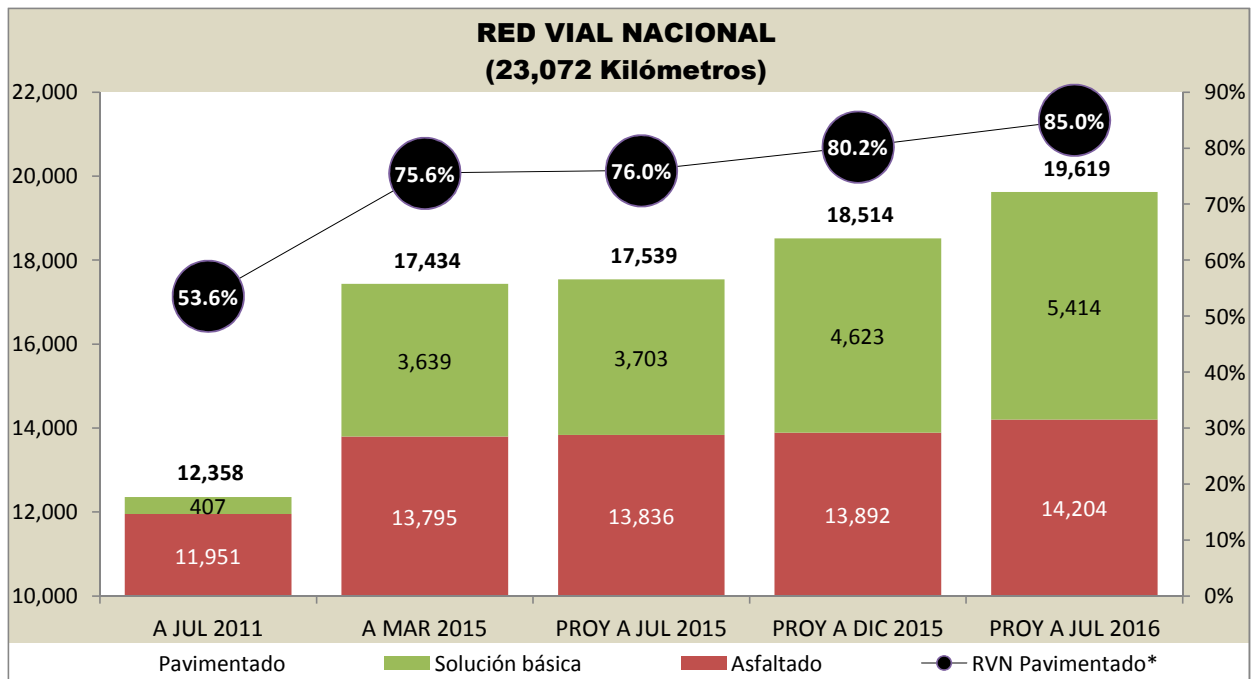


LONGITUDINAL DE LA SIERRA KILÓMETROS

SUPERFICIE DE RODADURA	SITUACIÓN A		PROYECTADO A								
	JUL 2011	MAR 2015	JUL 2015	DIC 2015	JUL 2016	DIC 2016	DIC 2017	DIC 2018	DIC 2019	DIC 2020	DIC 2021
Pavimentado	1,999	2,946	2,946	3,052	3,131	3,131	3,358	3,358	3,358	3,438	3,503
Asfaltado	1,854	2,359	2,359	2,359	2,438	2,438	2,479	2,479	2,479	2,558	2,624
Solución básica	145	587	587	693	693	693	879	879	879	879	879
No Pavimentado	1,306	558	558	452	372	372	145	145	145	66	66
LS Existente	3,305	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
LS Total	3,463	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
LS Pavimentada	60.5%	84.1%	84.1%	87.1%	89.4%	89.4%	95.9%	95.9%	95.9%	98.1%	100.0%

PERIODOS	Ago 2011 - Mar 2015	2015 Abr-Jul	2015 Ago-Dic	2016 Ene-Jul	2016 Ago-Dic	2017	2018	2019	2020	2021
Pavimentado	947		106	80		227			80	66
Asfaltado	505			80		41			80	66
Solución básica	442		106			186				
Rehabilitación	21									
REHAB. Y MEJ. ASF.	526									

F20150605

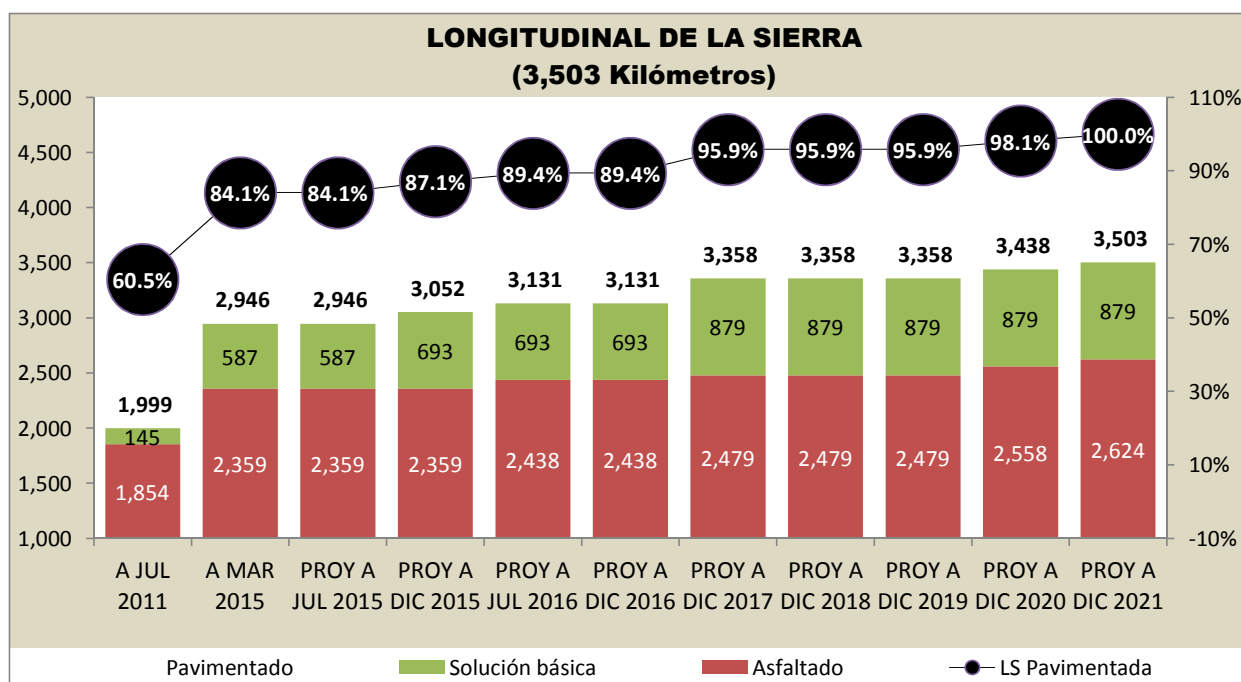

Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A MARZO 2015

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS ¹	FIN CONTRAC TUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A MAR 2015	C. OBRA Mill. S/.
			2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa																			
1	0081	0088	Tr. Pte. Chino - Aguaytía (sectores dañados)	2434	7.94	0.52					0.52						jul-14	feb-16	mar-15	063-2014-MTC/20	14%	169.10
			2002210 Rehabilitación y mejoram. carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis																			
2	0167	0116	Tr. Pericos - San Ignacio	8880	54.58	52.14			52.14								dic-12	ago-15	sep-14	126-2012-MTC/20	89%	189.32
			2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco																			
3	0171	0406	Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420	16256	94.59	94.45					94.45						nov-11	oct-16	jul-15	081-2011-MTC/20	62%	513.38
			2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 - 4+042) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún																			
4	0780	0786	Tr. Oyotun - Las Delicias	38965	4.04	3.96			3.96								nov-14	dic-15	oct-15	118-2014-MTC/20	10%	9.75
			2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao																			
5	1883	1746	Tr. Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)	48115	2.10												abr-14	abr-16	nov-15	043-2014-MTC/20	9%	779.80
			2058733 Constr. y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																			
6	0761	1553	Tr. Matarani - Punta de Bombón	3272	45.21												dic-14	may-17	oct-16	146-2014-MTC/20	1%	412.21
			2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana																			
7	0153	0503	Tr. Cañete - Lunahuana	57858	37.44												nov-13	dic-15	jul-15	126-2013-MTC/20	78%	116.93
			2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay																			
8	1116	1556	Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - 1.55	73004	1.55												jul-14	jun-15	abr-15	329-2014-GM/MPH		6.02
9	1117	1557	Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay	73004	71.96	69.83						69.83					dic-14	jul-17	jul-16	145-2014-MTC/20	1%	332.93
			2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish																			
10	0070	0928	Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - 102 000	3271	79.47	24.47				24.47							may-12	feb-16	ene-15	032-2012-MTC/20	78%	359.63
11	0071	0923	Tr. Canta - Huallay	3271	96.11	82.89						82.89					jun-14	may-17	may-16	057-2014-MTC/20	2%	453.15
			2058698 Rehab. y Mejoramiento Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca																			
12	0180	0955	Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc	10447	58.86	51.67	51.67				51.67						mar-12	mar-16	dic-15	021-2012-MTC/20	64%	274.95
			2058733 Const. y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																			
13	0020	0959	Tr. Dv. Quilca - Matarani	3272	94.50	94.50					94.50						abr-13	mar-16	nov-15	048-2013-MTC/20	90%	574.28
			2078371 Mejoramiento Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa																			
14	0156	0967	Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa	4808	65.82	44.85					44.85						abr-13	mar-16	ago-15	051-2013-MTC/20	69%	305.01
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																			
15	0245	0671	Tr. Huaura - Sayan - Puente Tingo	34470	99.28	54.40					54.40						mar-13	may-16	oct-15	036-2013-MTC/20	64%	539.27
			2089761 Rehabilitación y mejoram. carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																			
16	0161	0972	Tr. Mayocc - Huanta	70107	27.54	27.88	27.88				27.88						may-13	mar-16	oct-14	055-2013-MTC/20	69%	120.65
			2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																			
17	0193	0989	Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	108035	14.34	14.34					14.34						sep-14	may-16	jun-15	094-2014-MTC/20	46%	19.85
			2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo																			
18	1045	1048	Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	116092	67.73	67.63					67.63						abr-13	ago-16	may-15	046-2013-MTC/20	50%	212.12
			2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha																			
19	0518	1001	Tr. San Marcos - Cajabamba	11432	58.80												jul-13	feb-16	ago-15	075-2013-MTC/20	72%	284.66
			2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo																			
20	0864	0100	Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo (2da Calzada)	128445	10.05												ene-13	feb-16	ago-14	008-2013-MTC/20	25%	127.12
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp, PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp, PE-5N La Calzada																			
21	1320	1323	Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)	107953	27.39	26.85					26.85						dic-14	nov-16	jun-16	156-2014-MTC/20	0%	86.62

Anexo 1: OBRAS DE ASFALTADO CONTRATADAS A MARZO 2015

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	INICIO OBRA	FIN OBRA PFIS ^{1/}	FIN CONTRATUAL	CONTRATO / CONVENIO OBRA	A MAR 2015	C. OBRA Mill. S/.
22	1050	1591	2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas Tr. Imperial - Pampas	73078	36.85	37.49					37.49						oct-14	oct-16	abr-16	109-2014-MTC/20	11%	218.78
23	1059	1604	2173121 Longitudinal Sierra Norte, Tr. Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple Tr. Chota - Cutervo - Chiple	103730	91.40												sep-15	mar-16	oct-13	CONCESIÓN	10%	548.40
24		1735	2196783 Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura Intercambio Vial Piura***	250148	4.80												nov-14	nov-15		CONCESIÓN		48.00
25	1780	1714	2188747 Rehabilitación carretera Panamericana Norte Tr. II: Km. 557+000 al 886+600 Tr. II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600) **	279073	329.60												mar-14	sep-15	jun-15	CONCESION	80%	248.31
OBRAS VIALES CONTRATADAS					1,482	748	80	-	56	313	226	153	-	-	-	-	Km					6,950

1/ Estimado por OPEI-PFISICA (Regresión lineal), obras terminadas al 2012 (*) Referencia de Convenio (**) Rehabilitación en RVN Concesionada (***) Por incorporar a la RVN

F20150605

ANEXO 2: OBRAS DE ASFALTADO EN CONCESIONES A MARZO 2015

Nº	PFIS CON	CONCESIÓN	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	FECHA INICIO	FIN OBRA PFIS ^{2/}	CONTRATISTA
1	0139	Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	41.11	41.11		41.11									jun-14	jun-15	COVIPERU
OBRAS VIALES CONCESIONADAS			41	41		41	-	-						-			
OBRAS VIALES CONTRATADAS			1,523	789	80	41	56	313	226	153	-	-	-	-	Km		6,950

2/ Estimado por PFísica

Anexo 3.1: OBRAS DE ASFALTADO CON ESTUDIO DEFINITIVO CONTRATADO A MARZO 2015

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	CONTRATO / CONVENIO E. DEFINITIVO	A MAR 2015	VR. OBRA Mill. S/
			2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro																			
1	0515	0993	Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución	3373	57.24	1.75						1.75					ago-15	dic-17	jul-14	072-2011-MTC/20	100%	231.06
2	0516	0996	Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro	3373	54.97												jul-15	oct-17	abr-14	065-2011-MTC/20	100%	225.38
3	0517	1562	Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro	3373	62.90												may-15	dic-17	ene-15	068-2011-MTC/20	100%	257.89
			2106854 Rehab. y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo																			
4	1042	1559	Tr. Andahuaylas - Huancabamba	5080	20.70	20.00				20.00							abr-15	dic-16	jun-14	001-2013-MTC/20	100%	50.80
			2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																			
5	1628	1068	Tr. Puente Tingo - Churín	34470	5.14	5.10				5.10							jun-15	oct-16	ene-15	043-2009-MTC/20*	100%	21.54
			2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri																			
6	1578	1579	Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri	142861	76.50	74.76						74.76					jun-15	dic-17	oct-14	027-2012-MTC/20	100%	382.50
			2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote																			
7	0016	0937	Vía Evitamiento Ciudad de Chimbote	13969	34.66	34.66						34.66					jul-16	jun-18	ene-12	209-2008-MTC/20	100%	121.31
			2057739 Rehabilitación y mejoramiento carretera Ica - Los Molinos - Tambillos																			
8	0910	1552	Tr. Molinos - Tambillo	6804	13.80												oct-16	may-18	ago-15	045-2013-MTC/20	80%	55.20
			2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani																			
9	0155	0963	Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)	3543	56.20	40.60	40.60					40.60					mar-16	jul-18	ago-15	025-2012-MTC/20	90%	202.57
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Emp. Ruta PE-5N La Calzada, Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta Pe-5N La Calzada																			
10	0511	0432	Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro	3876	86.00	79.21							79.21				jun-16	mar-19	jul-15	180-2010-MTC/20	90%	180.60
			2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay																			
11	1344	1568	Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	108630	9.50												oct-16	abr-18	ago-16	013-2014-MTC/20	40%	38.38
			2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía																			
12	1340	1592	Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía	8669	36.30	23.67						23.67					nov-16	nov-18	sep-15	001-2014-MTC/20	75%	181.50
			2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez																			
13	1128	1566	Tr. Villa Rica-Pto. Bermudez	3368	110.88	73.18							73.18				abr-17	mar-20	oct-16	028-2014-MTC/20	65%	554.40
			2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo																			
14	1596	1597	Tr. Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)	93142	75.50	36.71							36.71				feb-17	ago-19	ago-16	006-2014-MTC/20*	60%	377.50
			2015918 Integración Vial Tacna -La Paz																			
15	2034	2178	Tr. I: Tacna - La Paz, Km 43+610 - 94+000	1249	50.39												oct-16	dic-18	abr-16	004-2014-MTC/20*	75%	60.47
16	2035	2179	Tr. II: Tacna - La Paz, Km 94+000 - 146+180 (Dv.Tripartito)	1249	52.18	36.21							36.21				oct-16	dic-18	abr-16	004-2014-MTC/20*	45%	62.62
17	2036	2180	Tr. III: Tacna - La Paz, Km 146+180 - 187+404 (Frontera con Bolivia)	1249	41.22	41.50							41.50				sep-16	oct-18	mar-16	004-2014-MTC/20*	75%	49.46
			2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache																			
18	0226	1548	Tr. Campanilla - Perlamayo - La Polvora - Pizarrón - Pizana	2794	92.00												ene-17	nov-19	ago-16	042-2014-MTC/20	50%	294.40
			2177209 Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta PE-3N																			
19	1338	1598	Tr. Huanuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)	9615	152.20												dic-17	feb-21	mar-17	088-2014-MTC/20	25%	471.82
			2234355 Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo																			
20	1574	1575	Tr. Oyón - Ambo	116051	153.73	142.91							142.91				jul-16	oct-19	ene-16	043-2012-MTC/20	50%	937.75
			2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalme Ruta No 10																			
21	0969	1593	Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan - Mollepata	86897	81.55	79.55	79.55						79.55				jul-17	mar-20	oct-16	057-2011-MTC/20	55%	334.37
			2235630 Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paíta																			
22	2138	2139	Tr. Piura - Paíta	299572	48.00												ene-17	mar-18	dic-16	CONCESIÓN	0%	264.00
			2235631 Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+00 al Km. 1001+924																			
23	2141	2142	Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001+924	286270	13.92												jul-16	jun-17	jul-16	CONCESIÓN	0%	279.97
			2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca																			
24	1122	1595	Autopista Juliaca - Puno	92806	48.45												oct-15	dic-16	oct-15	CONCESIÓN	0%	242.25
			2263613 Rehabilitación de la Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry																			
25	1611	1612	Tr. Pativilca - Qda Seca - Pte Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry	2263613	357.70												jul-16	dic-17	jul-16	CONCESIÓN	0%	759.56
OBRAS VIALES CON ESTUDIO DEFINITIVO					1,792	690	120	-	-	-	25	77	177	259	153	-						6,637

1/ 2/ Según OPEI-PFISICA, fin de estudio Definitivo y plazo estimado para Obra (*) Referencia Convenio

Anexo 3.2: OBRAS DE ASFALTADO PARA CONTRATAR ESTUDIO DEFINITIVO A MARZO 2015

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	SITUACIÓN	A MAR 2015	VR OBRA Mill. S/
			2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa																			
1	0090	1547	Tr. Aguaytia - San Alejandro (Sectores Críticos)	2434	10.00												sep-16	may-18	may-16	ELAB. TdR EXP.TEC.		35.00
			2110581 Mejoramiento de Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho																			
2	0519	1563	Tr. Cajabamba - Sausacocho	11432	38.95												mar-18	mar-20	nov-17	ELAB. TdR DEF.		194.75
			2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani																			
3	0470	0241	Tr. Colpahuayco - Langui	3876	10.00	10.00								10.00			abr-18	ago-19	may-17	ELAB. TdR DEF.		21.00
			2158699 Rehabilitación de la carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - Dv. Pampas																			
4	1072	1567	Tr. II Pucara - Pazos y Tr. III Pazos - Dv. Pampas	198686	26.90												oct-17	jul-19	may-16	PERFIL VIABLE	100%	134.50
			2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz																			
5	1602	1603	Tr. Huallanca - Caraz	101490	37.00												may-17	abr-19	dic-16	FACTIB VIABLE	100%	185.00
			2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo																			
6	0510	0976	Tr. Tarata - Capazo	108281	83.90												ene-19	sep-21	jul-18	ELAB. TdR DEF.		335.60
			2081615 Construcción y Mejoramiento de la Via Expresa de Evitamiento de la Ciudad de Huancayo (Tramo:Quebrada Honda - Terminal Terrestre - Cruce Rio Chilca - Panamericana Sur), Provincia de Huancayo - Junin																			
7	2267	2268	Via de Evitamiento a la Ciudad de Huancayo	87486	12.40												feb-18	jun-19	jul-17	FACTIB	80%	68.20
			2166949 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca - Huanta; Tramo: Izcuchaca - Mayocc																			
8	1318	1599	Tr. Izcuchaca - Mayocc	98352	115.30												abr-18	jul-19	abr-18	ENC. CONCESIÓN		634.15
			2056359 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores																			
9	0660	1549	Tr. Huancavelica - Santa Ines	66742	78.00												sep-18	mar-21	abr-18	FACTIB	80%	429.00
10	0662	1550	Tr. Santa Ines-Castrovirreyna-Tirapo-Pampano	66742	108.00												feb-19	dic-21	jun-18	FACTIB	80%	594.00
11	0661	1551	Tr. Santa Ines-Rumichaca	66742	30.90												nov-18	sep-20	sep-17	FACTIB	80%	169.95
			2233861 Construcción Vía de Evitamiento a la ciudad de Ollantaytambo																			
12	1892	1893	Vía de Evitamiento Ollantaytambo	140818	3.40												mar-18	ago-19	sep-17	FACTIB	90%	18.70
			2233958 Construcción y mejoramiento carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. Ruta 05N - Tocache																			
13	0911	1590	Tr. Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza -Tocache	4588	86.96												dic-17	sep-20	sep-17	FACTIB VIABLE	100%	478.28
			2234905 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-3S) - Chupaca																			
14	1886	1887	Tr. Chupaca - Pilcomayo	227125	5.30												ago-17	dic-18	dic-16	FACTIB VIABLE	100%	29.15
			2234980 Rehabilitación y construcción carretera afirmada Puente el Cumbil - Santa Cruz de Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta pe-3N (Túnel Chotano)																			
15	1576	1577	Tr. Pte. Cumbil - Santa Cruz-Túnel Chotano	133088	103.64												ene-19	nov-21	sep-18	FACTIB	45%	570.02
			2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalme Ruta No 10																			
16	1985	2301	Tr. Mollepata - Pallasca	86897	30.00												jul-17	may-19	ene-17	FACTIB VIABLE	100%	165.00
			Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya																			
17	1902	1903	Vía de Evitamiento La Oroya	284611	30.38												oct-19	jul-21	may-19	ELAB. TdR FACTIB.		167.06
			2266239 Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Tumbes																			
18	2234	2235	Vía de Evitamiento Tumbes	22422	15.00	11.77								11.77			oct-19	jun-21	may-19	PERIFL	90%	82.50
			Construcción y Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Región Lima																			
19	2239	2240	Tr. Av. Santa Rosa, Lima		4.50												dic-19	may-21	sep-19	ELAB. TdR PERFIL		24.75
			Mejoramiento de la Carretera Santa Teresa-puente Central Hidroeléctrica Macchupicchu																			
20	1580	1581	Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica	172973	31.10												may-18	feb-20	nov-17	FACTIB	90%	171.05
			Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Juliaca																			
21	1626	1627	Vía de Evitamiento a la ciudad de Juliaca	185240	23.80												ago-19	abr-21	feb-19	ELAB. TdR FACTIB.		130.90
			Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tocache																			
22	1600	1601	Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tocache	215192	3.50												mar-19	jul-20	jul-18	ELAB. TdR FACTIB.		19.25
			Construcción y Mejoramiento de la Carretera Central, Tramo Autopista Puente Los Ángeles - Ricardo Palma																			
23	1613	1614	Tr. Autopista Puente Los Ángeles - Ricardo Palma	250356	28.00												nov-19	ago-21	may-19	ELAB. TdR FACTIB.		154.00

Anexo 3.2: OBRAS DE ASFALTADO PARA CONTRATAR ESTUDIO DEFINITIVO A MARZO 2015

Nº	PFIS DEF	PFIS OBRA	PROYECTO - TRAMO	SNIP	RMC RVN (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	INICIO OBRA PFIS ¹	FIN OBRA PFIS ²	FIN ESTUD. DEFIN.	SITUACIÓN	A MAR 2015	VR OBRA Mill. S/
			Mejoramiento de la Carretera Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real; Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Región del Cusco																			
24	2195	2196	Tr. Dv. Echarati – Palma Real	259436	42.00	40.99									40.99		sep-18	sep-20	may-18	FACTIB (MDE*)		231.00
			2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca																			
25	0904	0659	Tr. Chuquicara - Huallanca	3293	65.64	65.64	65.64									65.64	ago-18	feb-21	feb-18	ELAB. TdR DEF.		295.38
OBRAS VIALES A CONTRATAR ESTUDIO DEFINITIVO					1,025	128	66	-	-	-	-	-	-	-	10	41	77					5,338
OBRAS VIALES POR CONTRATAR					2,816	818	186	-	-	-	25	77	177	269	194	77	Km					11,975
TOTAL OBRAS VIALES					4,339	1,607	265	41	56	312	252	229	177	269	194	77	Km					18,757
TOTAL REHABILITACIÓN					2,733			2	374	298	49	607	181	373	232	616	Km					
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ASFALTADO					4,339			43	430	610	301	837	358	642	426	693	Km					

1/ 2/ Según OPEI-PFISICA, fin de estudio Factibilidad y plazo estimado para estudio Definitivo y Obra (*) Referencia Convenio

Anexo 4.1: SOLUCIÓN BÁSICA EN CONTRATOS DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO A MARZO 2015

Nº	PFIS CCNS	CONTRATO - TRAMO	CORRE- DOR (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	FIN OBRA	FECHA SUSCRIPCIÓN CCNS
1	1336	034-2012-MTC/20 Puente Huarochiri - Sihuas	536	108.50			108.50								2015	may-12
2	0964	049-2013-MTC/20 Bambas - Dv. Sihuas Pallasca - Mollepata	408	76.61	18.13		76.61								2015	abr-13
3	0318	057-2010-MTC/20 Pizana - Perlamayo	458	14.39		14.39									2015	abr-10
4	0312	068-2010-MTC/20 Santa Ines-Pampano	343	22.29		22.29									2015	mar-10
5	1358	069-2012-MTC/20 Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor Huancabamba - Canchaque Huancabamba - Sondor - Tabaconas - San Jose del Alto San Jose de Alto - Emp. PE 5N (Ambato)	610	264.57	87.88		264.57								2015	ago-12
6	0853	070-2012-MTC/20 Abra Tocto - Huancapi Huacata - Puquio	372	138.78			138.78								2015	ago-12
7	1380	070-2013-MTC/20 Puente Wawico - Seasmi Seasmi - Saramiriza Puente Wawico - Santa María de Nieva Santa María de Nieva - Seasmi	378	236.58			236.58								2015	jul-13
8	0854	071-2012-MTC/20 Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa Pausa - Sifuentes Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa	526	139.27		0.26	94.72								2015	ago-12
9	0320	094-2010-MTC/20 Km 120-Punta de Carretera Molinopampa-Rodriguez de Mendoza Rodriguez de Mendoza - Km 120	526	26.82		26.82									2015	abr-10
10	1378	143-2014-MTC/20 Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara	321	287.99				287.99							2016	mar-14
SOLUCIÓN BÁSICA CONTRATADA			4,478	1,316	106	64	920	332	-	-	-	-	-	-		

Anexo 5.1: OBRAS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIÓN BÁSICA CON PIP AVANZADOS A MARZO 2015

Nº	PFIS PMSB	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	CORRE-DOR (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	FIN OBRA	CONTRATO PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO	FECHA CONTRATO	A MAR 2015	
1	1371	1618	Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. PE-18B (Rio Codo) - Emp PE-5N	332	276.03				153.14	122.89						2016	120-2012-MTC/20	dic-12	100%	
2	0505	1616	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	348	26.12				26.12							2016	014-2013-MTC/20	ene-13	100%	
3	1366	1617	Dv. Humajalso - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412	136.56				81.95	54.62						2016	022-2013-MTC/20	ene-13	100%	
4	1367	1615	Andahuaylas (Emp PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Emp PE-30A)	180	160.29				66.05	94.24						2016	024-2013-MTC/20	feb-13	100%	
5	1645	1647	Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)	230	188.63				65.33	123.30						2016	096-2013-MTC/20	oct-13	100%	
6	1704	1703	Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	150	140.54				66.79	73.75						2016	029-2014-MTC/20	feb-14	100%	
7	1648	1650	Emp. AR-105 (Acoty) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo- Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)*	410												2016	005-2014-MTC/20	ene-14	100%	
SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR				2,062	928				459	469						Km				
(*) RVN Temporal																				
TOTAL PAVIMENTADO CON SOLUCIÓN BÁSICA AL 2016				6,540	2,244	106	64	920	792	469						Km				

F20150605

Anexo 5.2: OBRAS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIÓN BÁSICA CON PIP A MARZO 2015

Nº	PFIS PMSB	PFIS CCNS	CORREDOR VIAL	CORRE-DOR (Km)	MEJ. RVN (Km)	MEJ. LS (Km)	MEJ. 2015 Abr-Jul	MEJ. 2015 Ago-Dic	MEJ. 2016 Ene-Jul	MEJ. 2016 Ago-Dic	MEJ. 2017	MEJ. 2018	MEJ. 2019	MEJ. 2020	MEJ. 2021	FIN OBRA	SITUACIÓN	FECHA CONTRATO	A MAR 2015
8	1363	1619	Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas-Tambobamba - Chalhuahuacho	250	215.28						215.28					2017	078-2013-MTC/20	ago-13	72%
9	1304	1644	Emp. PE 3N (laguna Sausacocho)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Palla	597	562.78						562.78					2017	107-2013-MTC/20	oct-13	75%
10	1663	1665	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Arma-Pte. Arma -Abra de Viscos-Abra Cules- Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa	490	26.36						26.36					2017	138-2013-MTC/20	dic-13	75%
11	1657	0313	Emp PE-3S - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (Puerto Ene) - Cubantía	382	168.54						168.54					2017	037-2014-MTC/20	mar-14	63%
12	1836	2062	Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)	573	199.02							199.02				2018	001-2014-MTC/20*	ene-14	63%
13	1654	0315	Juliaca - Huancane- Moho-Tilali- Frontera Bolivia y Dv. Huancane-Putina-Sandia- San Ignacio	439	149.48						149.48					2017	036-2014-MTC/20	mar-14	35%
14	1651	1653	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Monzon - Emp.PE-18A (Tingo María)	536	411.40						411.40					2017	055-2014-MTC/20	jun-14	23%
15	1798	2060	Emp. PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande (a/)	395	186.36	186.36					186.36					2017	065-2014-MTC/20	jul-14	23%
16	1660	1662	Emp. PE-1N-Pamplona-San José-Cajatambo-Emp.PE-18	214	189.52							189.52				2018	090-2014-MTC/20	sep-14	23%
17	1608	1866	Emp. PE-3S (Concepción) - Comas - Emp. PE-5S (Satipo)/Emp. PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya/EMP. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki)-Buenos Aires-Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni	536	148.33							148.33				2018	PERFIL P.SELEC.		
18	1624	2308	Emp PE-3NG (La Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha	112	113.53							113.53				2018	PERFIL P.SELEC.		
19	1806	2061	Emp. PE-1 S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan de Viscos - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Chicllapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco)	200	153.71							153.71				2018	ELAB. TdR PERFIL		
20	2040	1870	Emp. PE-22B (Pte. Raither) - Pte. Paucartambo - Villa Rica - Pto. Bermudez - Von Humbolt y Pte. Paucartambo - Oxapampa	365	1.24								1.24			2019	ELAB. TdR PERFIL		
21	1609	2309	Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo	339	264.10							264.10				2018	ELAB. TdR PERFIL		
22	2242	2054	Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz	367	1.50							1.50				2018	ELAB. TdR PERFIL		
23	2281	2311	Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouno) - Dv. Echarati	280	222.50							222.50				2018	ELAB. TdR PERFIL		
SOLUCIÓN BÁSICA POR CONTRATAR				6,075	3,014	186					1,720	1,292	1						

TOTAL PAVIMENTADO CON SOLUCIÓN BÁSICA AL 2021	12,615	5,258	292	64	920	792	469	1,720	1,292	1	-	-	Km
--	---------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	-----------

a/ Mejoramiento con Solución Básica del Tr. Huancabamba - Emp. PE-3N (Socchobamba) de la LS

F20150605
